

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
1		MODULO B- I	26 días	vie 30/08/19	mié 02/10/19		25
2		PULIDO Y BRILLADO DE PISOS EN GENERAL	9 días	vie 30/08/19	mié 11/09/19		
3		PUERTAS	4 días	mié 11/09/19	lun 16/09/19	2	
4		VENTANAS EN GENERAL	12 días	vie 30/08/19	sáb 14/09/19		
5		PLAFON EN PVC EN TECHO DE BAÑOS	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19		
6		PROTECTORES EN HIERRO EN GENERAL	9 días	sáb 14/09/19	mié 25/09/19	4	
7		TERMINACION CERAMICA EN GENERAL	6 días	vie 30/08/19	vie 06/09/19		
8		MUROS Y TOPES EN GRANITO PARA LAVAMANOS DE BAÑO	5 días	vie 30/08/19	jue 05/09/19	7CC	
9		SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS	6 días	mié 11/09/19	mié 18/09/19	2	
10		ZABALETAS EN ACERAS	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		
11		INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	7 días	vie 30/08/19	lun 09/09/19		
12		BARANDAS Y PASAMANOS EN ESCALERAS EN GENERAL	7 días	vie 30/08/19	lun 09/09/19		
13		PINTURA EN GENERAL	7 días	vie 30/08/19	lun 09/09/19		

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
14		RANURADO Y MASILLADO DE JUNTAS	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19	13CC	25
15		MURAL ALEGORICO AL PLANTEL	4 días	lun 09/09/19	vie 13/09/19	13	
16		BARANDA EN BAÑO DE DISCAPACIDAD	1 día	mié 11/09/19	jue 12/09/19	2	
17		PINTURA MANTENIMIENTO EN PROTECTORES EN HIERRO	3 días	mié 25/09/19	lun 30/09/19	6	
18		LIMPIEZA FINAL	2 días	lun 30/09/19	mié 02/10/19	3,17	
19		MODULO DE INICIAL	13 días	vie 30/08/19	lun 16/09/19		
20		CORRECCIONES MENORES DE PAÑETE	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		
21		TERMINACION COLOCACION DE PISOS Y ZOCALOS EN GENERAL	3 días	vie 30/08/19	mar 03/09/19	20CC	
22		PULIDO Y BRILLADO DE PISOS	4 días	vie 06/09/19	jue 12/09/19	21FC+3 días	
23		INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN GENERAL	2 días	jue 12/09/19	sáb 14/09/19	22	
24		INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	2 días	lun 02/09/19	mié 04/09/19	20	
25		PUERTAS	3 días	lun 02/09/19	jue 05/09/19	20	
26		PINTURA EN GENERAL	3 días	lun 02/09/19	jue 05/09/19	20	

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
27		PINTURA ALUSIVA A INICIAL	4 días	jue 05/09/19	mié 11/09/19	26	25
28		LIMPIEZA Y NIVELACION FINAL DE AREA DE JUEGOS	4 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19	20	
29		ACERA DE INTERCONEXION	3 días	lun 02/09/19	jue 05/09/19	28CC	
30		COLOCACION DE JUEGOS EN AREA DE JUEGOS	2 días	vie 06/09/19	mar 10/09/19	28	
31		LIMPIEZA FINAL	1 día	sáb 14/09/19	lun 16/09/19	27,23,26	
32		COMEDOR TIPO III	13 días	vie 30/08/19	lun 16/09/19		
33		TERMINACION DETALLES FALTANTES DE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19	20CC	
34		TERMINACION PIZOS Y ZOCALOS FALTANTES	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19	33CC	
35		PULIDO Y BRILLADO DE PISOS	4 días	jue 05/09/19	mié 11/09/19	34FC+3 días	
36		PUERTAS EN GENERAL	4 días	mié 11/09/19	lun 16/09/19	35	
37		MUROS Y FREGADEROS EN GRANTO DOBLE BOCA	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19	33CC	
38		TERMINACIO REVESTIMIENTO EN LADRILLOS EN FACHADA FRONTAL	2 días	lun 02/09/19	mié 04/09/19	33	
39		PINTURA EN GENERAL	3 días	mié 11/09/19	sáb 14/09/19	33,34,35	












Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
40		COLOCACION DE BISELADO EN ALUMINIO	2 días	lun 02/09/19	mié 04/09/19	33	25
41		CANCHA MIXTA	9 días	vie 30/08/19	mié 11/09/19		
42		LAVADO DE CANCHA CON AGUA A PRESION	1 día	vie 30/08/19	sáb 31/08/19	13CC	
43		PINTURA BASE PRIMER	1 día	sáb 31/08/19	lun 02/09/19	42	
44		PINTURA Y SEÑALIZACION EN CANCHA	3 días	mar 03/09/19	vie 06/09/19	43FC+1 día	
45		CONSTRUCCION DE CAJUELAS PARA POSTE DE VOLEYBALL	2 días	vie 06/09/19	mar 10/09/19	44	
46		INSTALACION POSTES Y MALLA VOLEYBALL	1 día	mar 10/09/19	mié 11/09/19	45	
47		PINTURA BASE EN COLUMNAS	1 día	mar 03/09/19	mié 04/09/19	44CC	
48		PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS	1 día	mié 04/09/19	jue 05/09/19	47	
49		PINTURA SEMIGLOSS EN COLUMNAS	1 día	jue 05/09/19	vie 06/09/19	48	
50		GRADAS	7 días	vie 30/08/19	lun 09/09/19		
51		CONSTRUCCION ACERA ENTRE CANCHA Y GRADAS	3 días	vie 30/08/19	mar 03/09/19		
52		NIVELACION EN PARTE POSTERIOR DE GRADAS	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19		

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	 Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
53		PINTURA EN GENERAL	3 días	mié 04/09/19	lun 09/09/19	52	25
54		CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19		
55		PISO PULIDO	1 día	vie 30/08/19	sáb 31/08/19	2CC	
56		INSTALACION BOMBA DE 2 HP	2 días	sáb 31/08/19	mar 03/09/19	55	
57		TANQUE HIDRONEUMATICO	2 días	sáb 31/08/19	mar 03/09/19	56CC	
58		PLOMERIA EN GENERAL	1 día	sáb 31/08/19	lun 02/09/19	56CC,57CC	
59		PINTURA EN GENERAL	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		
60		PINTURA MANTENIMIENTO EN PUERTA EN HIERRO Y PROTECTORES DE VENTANA	1 día	vie 30/08/19	sáb 31/08/19	59CC	
61		INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	1 día	mar 03/09/19	mié 04/09/19	56	
62		AREAS EXTERIORES EN GENERAL	25 días	vie 30/08/19	mar 01/10/19		
63	 	TERMINACION NIVELACION FINAL DE AREAS	4 días	vie 30/08/19	mié 04/09/19		
64		TERMINACION CONSTRUCCION SOLUCION PLUVIAL	8 días	vie 30/08/19	mar 10/09/19		
65		CONSTRUCCION PLAZOLETA FRONTAL AL MODULO B-1	4 días	mar 10/09/19	sáb 14/09/19	64,63	

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
66	 	TERMINACION VERJA EN MALLA CICLONICA DE AREA DE INICIAL	3 días	vie 30/08/19	mar 03/09/19		25
67		VACIADO AREAS FALTANTES PARA COMPLETAR PLAZA CIVIC	6 días	sáb 14/09/19	sáb 21/09/19	65	
68		CONSTRUCCION TARJA	4 días	sáb 21/09/19	jue 26/09/19	67	
69		JARDINERIA EN GENERAL	8 días	mar 10/09/19	jue 19/09/19	63,64	
70	 	TERMINACION INSTALACION ILUMINACION EXTERIOR EN GENERAL	3 días	vie 30/08/19	mar 03/09/19		
71	 	TERMINACION INTERCONEXION ELECTRICA CON EDENORTE	2 días	vie 30/08/19	lun 02/09/19		
72		CONSTRUCCION JARDINERAS FALTANTES	5 días	sáb 21/09/19	vie 27/09/19	65,67	
73		PINTURA EN JARDINERAS EN GENERAL	2 días	vie 27/09/19	mar 01/10/19	72	
74		VERJA PERIMETRAL	20 días	lun 16/09/19	jue 10/10/19		
75	  	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	7 días	lun 16/09/19	mar 24/09/19		
76		TERMINACIONES FALTANTES DE PAÑETE	5 días	mar 24/09/19	mar 01/10/19	75	
77		PINTURA EN GENERAL	5 días	mar 01/10/19	lun 07/10/19	75,76	
78		COLOCACION ALAMBRE TRINCHERA	3 días	lun 07/10/19	jue 10/10/19	77	




Proyecto: CALENDARIO DE ACT
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
79		TERMINACION ENTRADA PRINCIPAL SEGÚN PLANOS	7 días	mar 01/10/19	mié 09/10/19	76	25
80		CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA	5 días	mar 01/10/19	lun 07/10/19	79CC	
81		PINTURA MANTENIMIENTO EN PORTON PRINCIPAL	1 día	mié 09/10/19	jue 10/10/19	79	
82		INSTALACION PUERTA SECUNDARIA DETRAS DE CANCHA	3 días	mar 01/10/19	vie 04/10/19	80CC	
83		MISCELANEOS	14 días	sáb 14/09/19	mié 02/10/19		
84		ROTULOS Y SEÑALIZACIONES EN SINTRA Y BRONCE EN GENERAL	4 días	sáb 14/09/19	jue 19/09/19	13,27,39	
85		COLOCACION PLACA EN BRONCE	4 días	jue 26/09/19	mié 02/10/19	68	
86		REMODELACION BLOQUES EXISTENTES	12 días	vie 30/08/19	sáb 14/09/19		
87		REMODELACION BLOQUES EXISTENTE APROBADA POR MINERD EN GENERAL	12 días	vie 30/08/19	sáb 14/09/19		
88		CAMINO DE ACCESO LATERAL	16 días	lun 16/09/19	sáb 05/10/19		
89		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	6 días	lun 16/09/19	lun 23/09/19		
90		NIVELACION DE SUB-RASANTE	3 días	lun 23/09/19	jue 26/09/19	89	
91		COLOCACION DE MATERIAL DE BASE	2 días	jue 26/09/19	lun 30/09/19	90	


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
92		RIEGO DE IMPRIMACION	1 día	lun 30/09/19	mar 01/10/19	91	25
93		ASFALTADO	1 día	mar 01/10/19	mié 02/10/19	92	
94		SEÑALIZACION FINAL	3 días	mié 02/10/19	sáb 05/10/19	93	


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

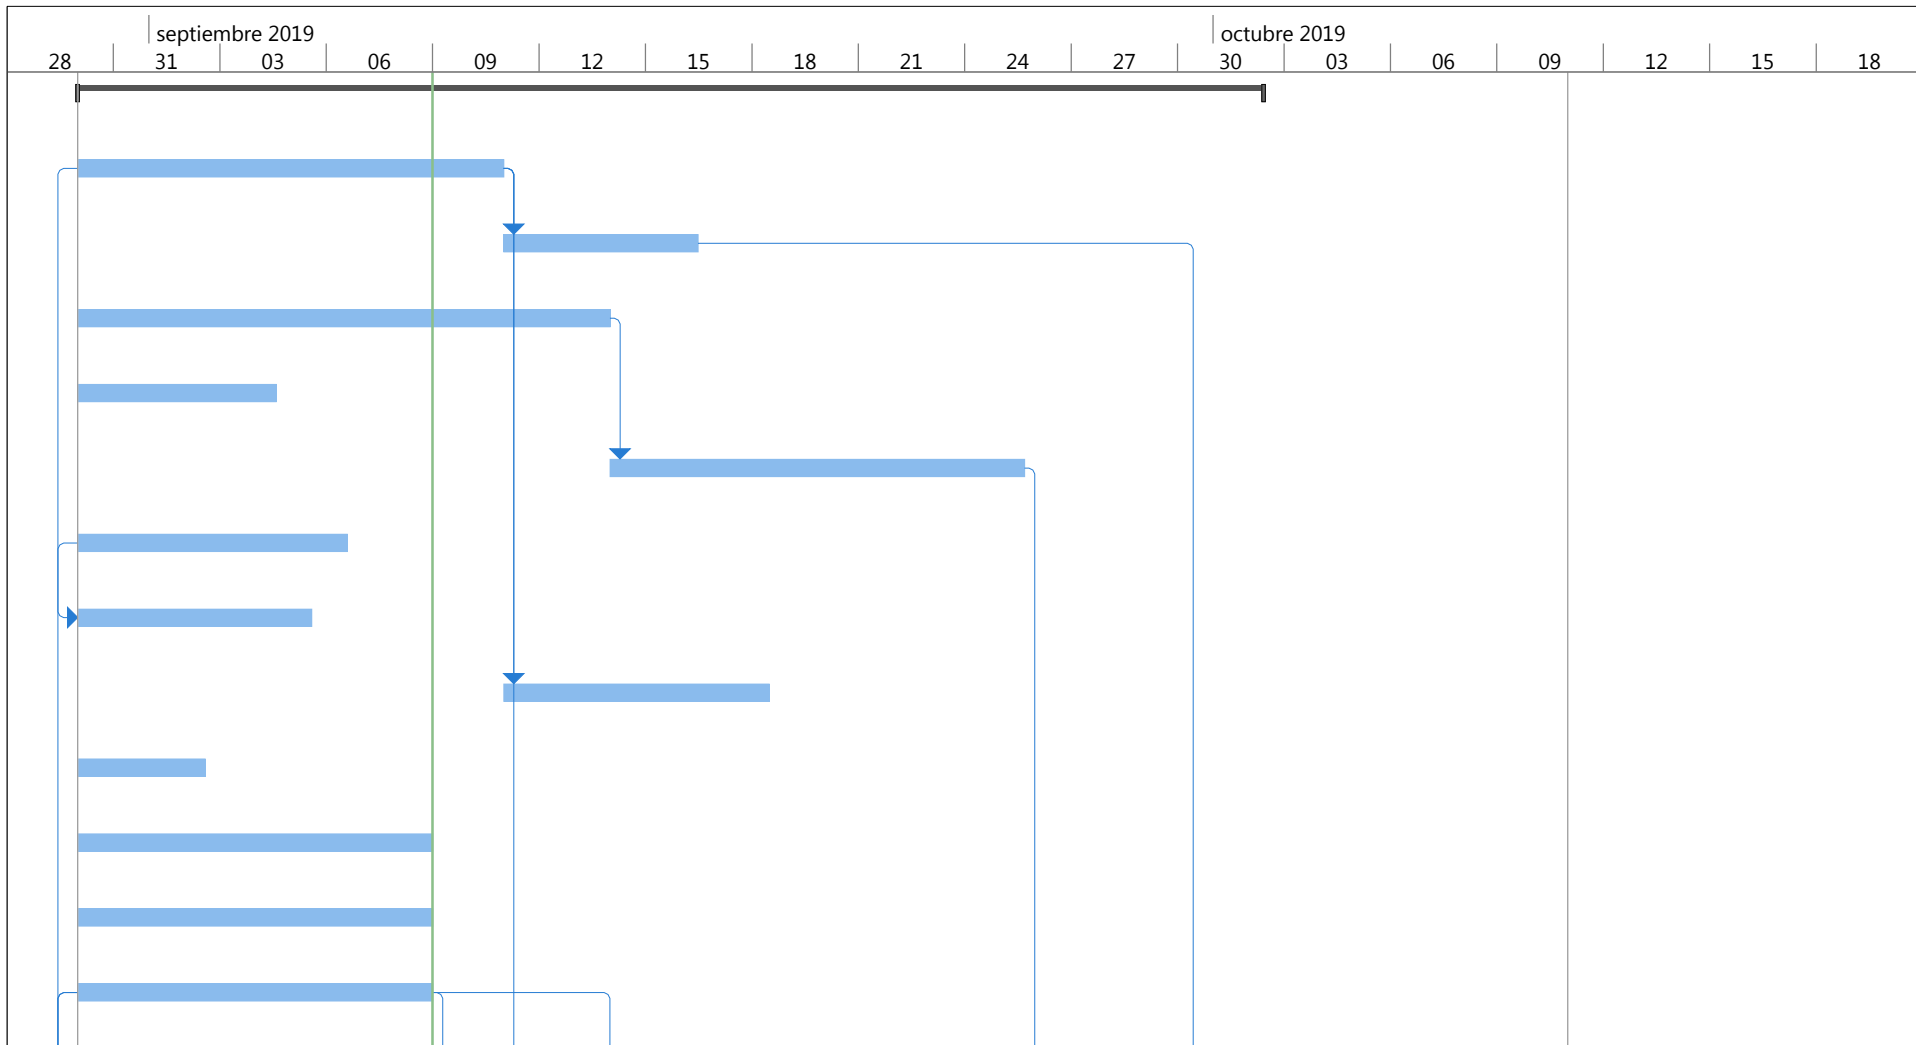


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

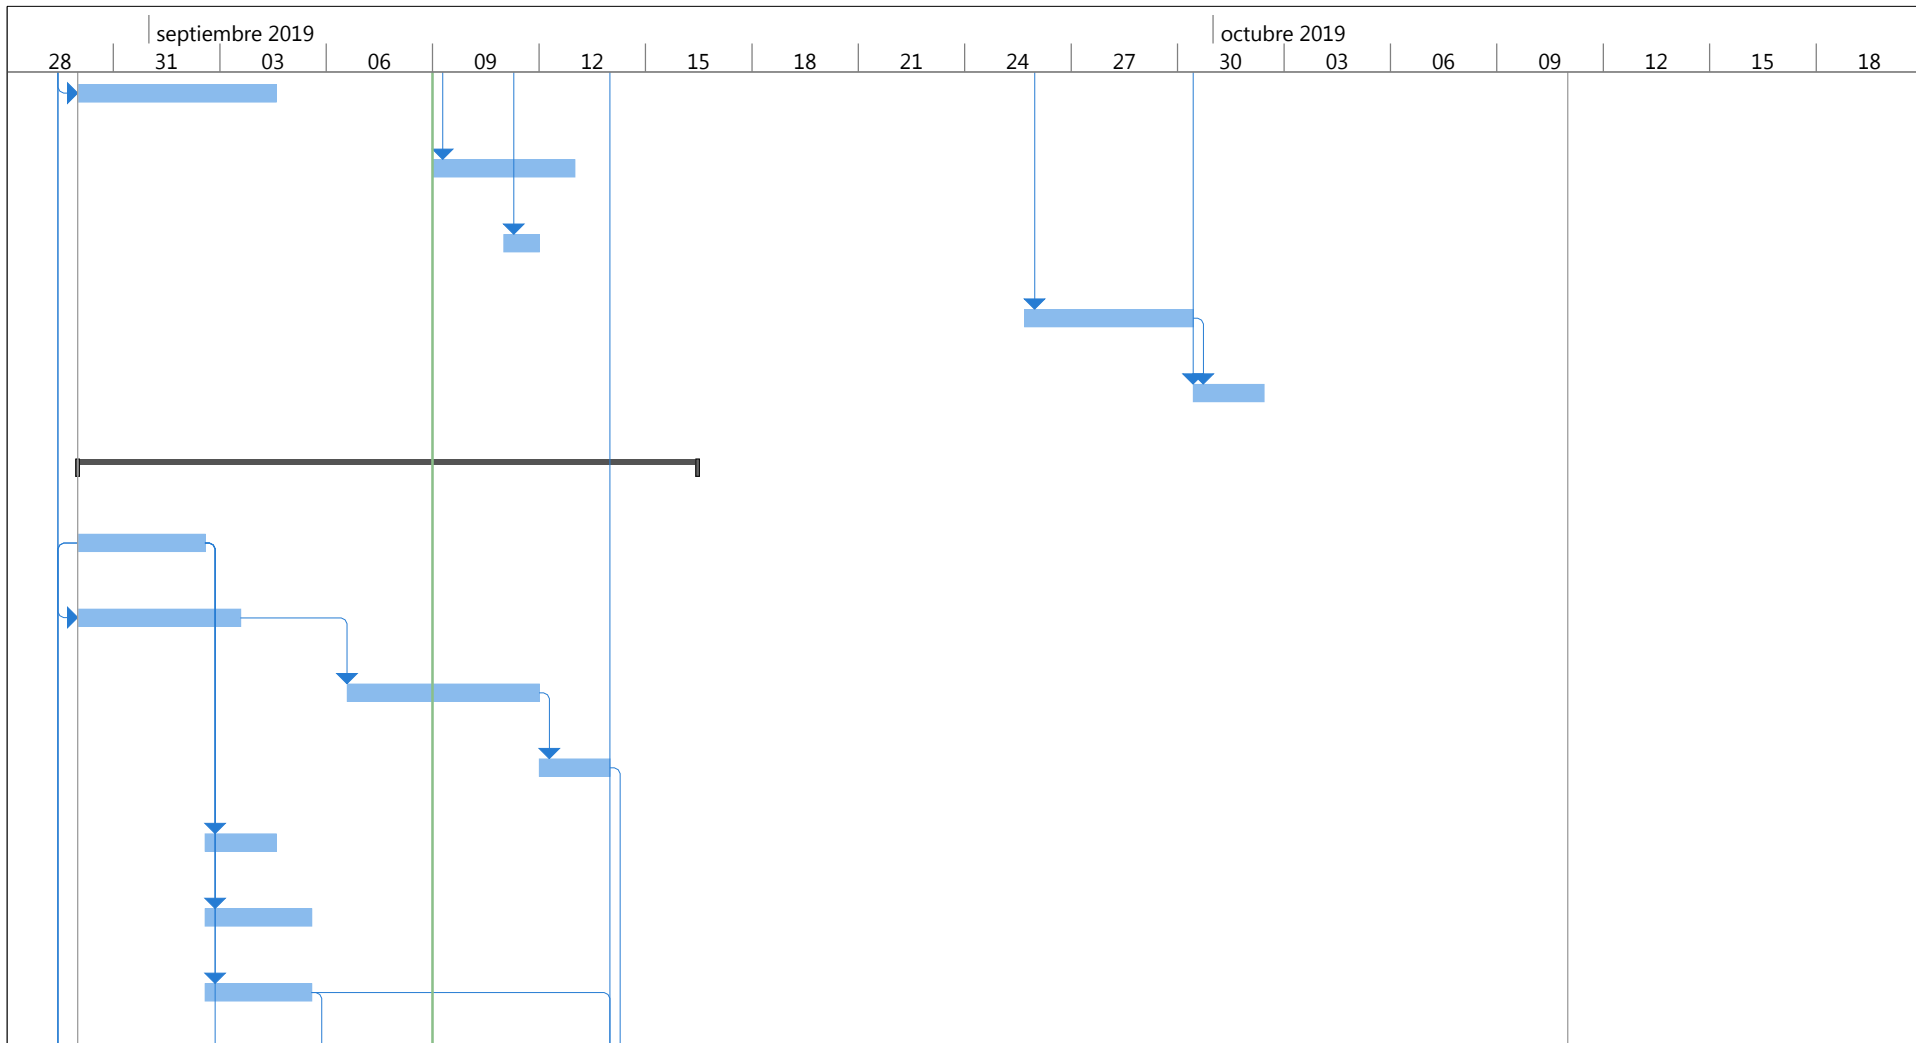


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

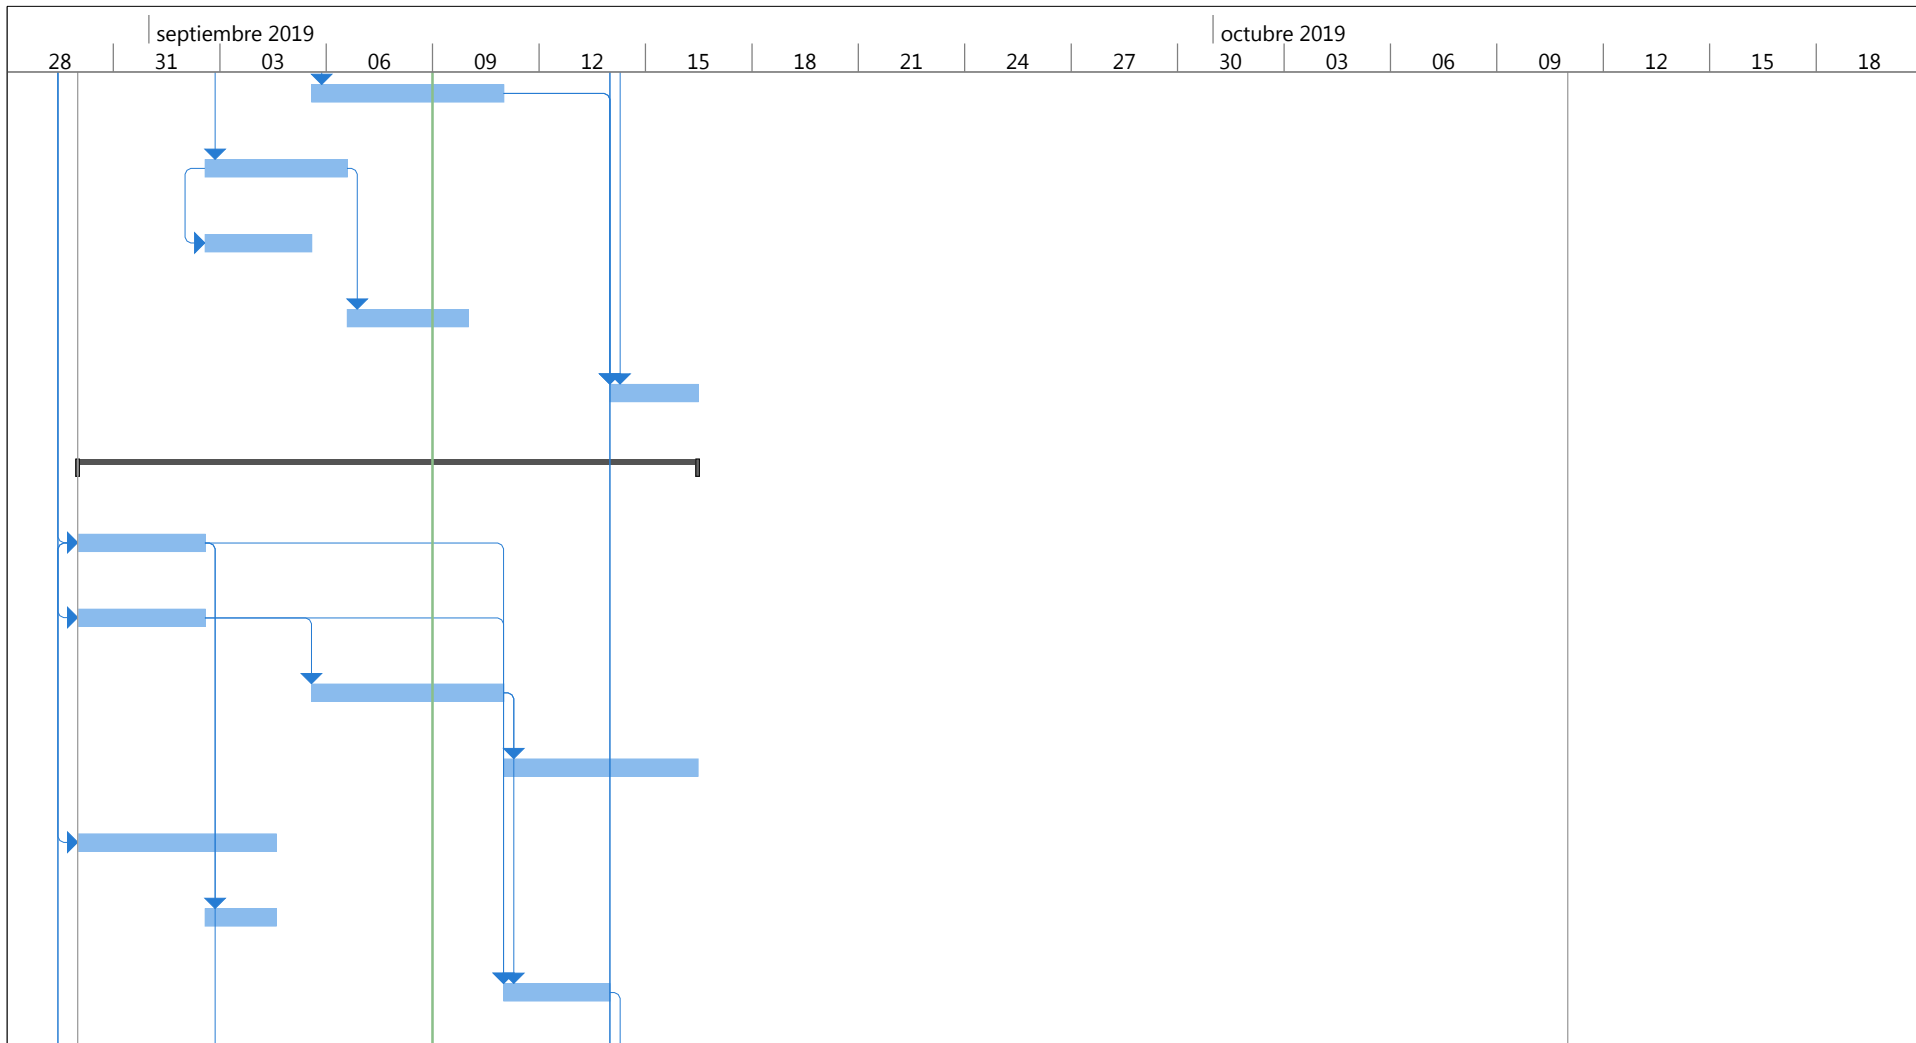


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

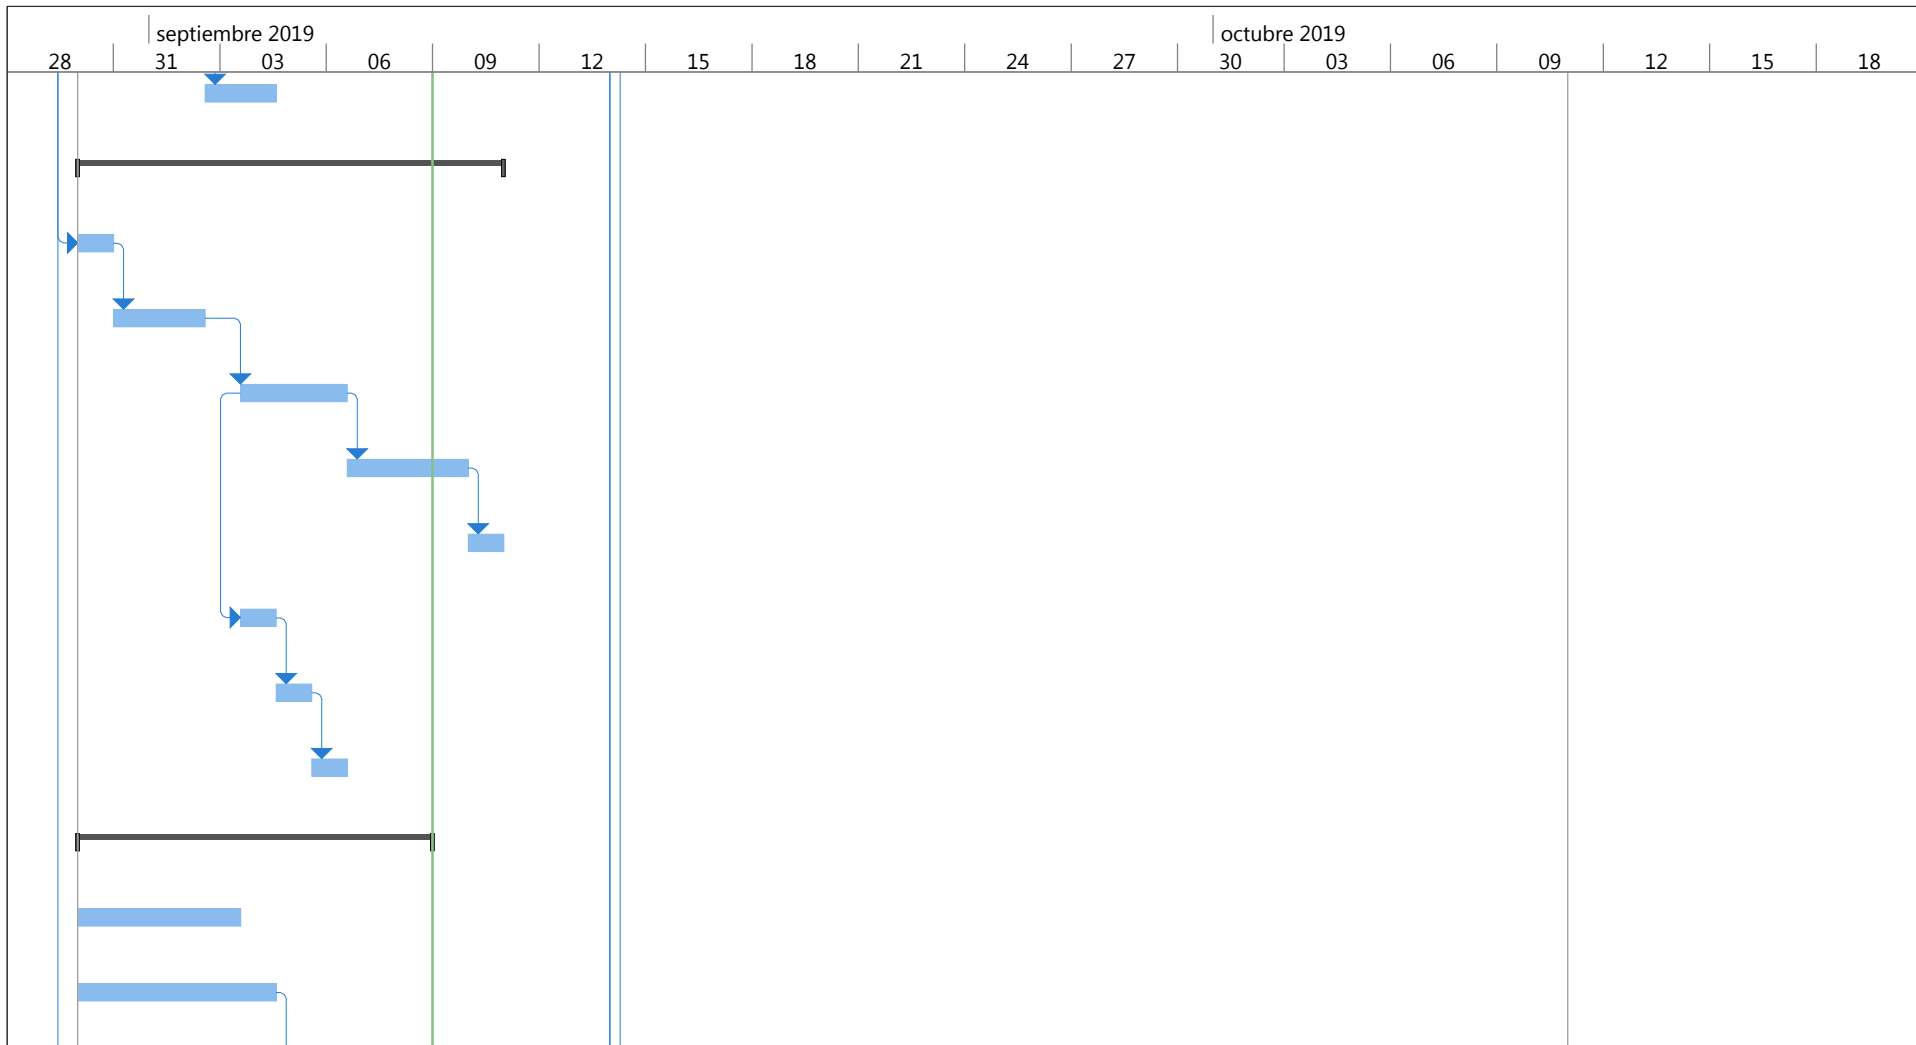


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

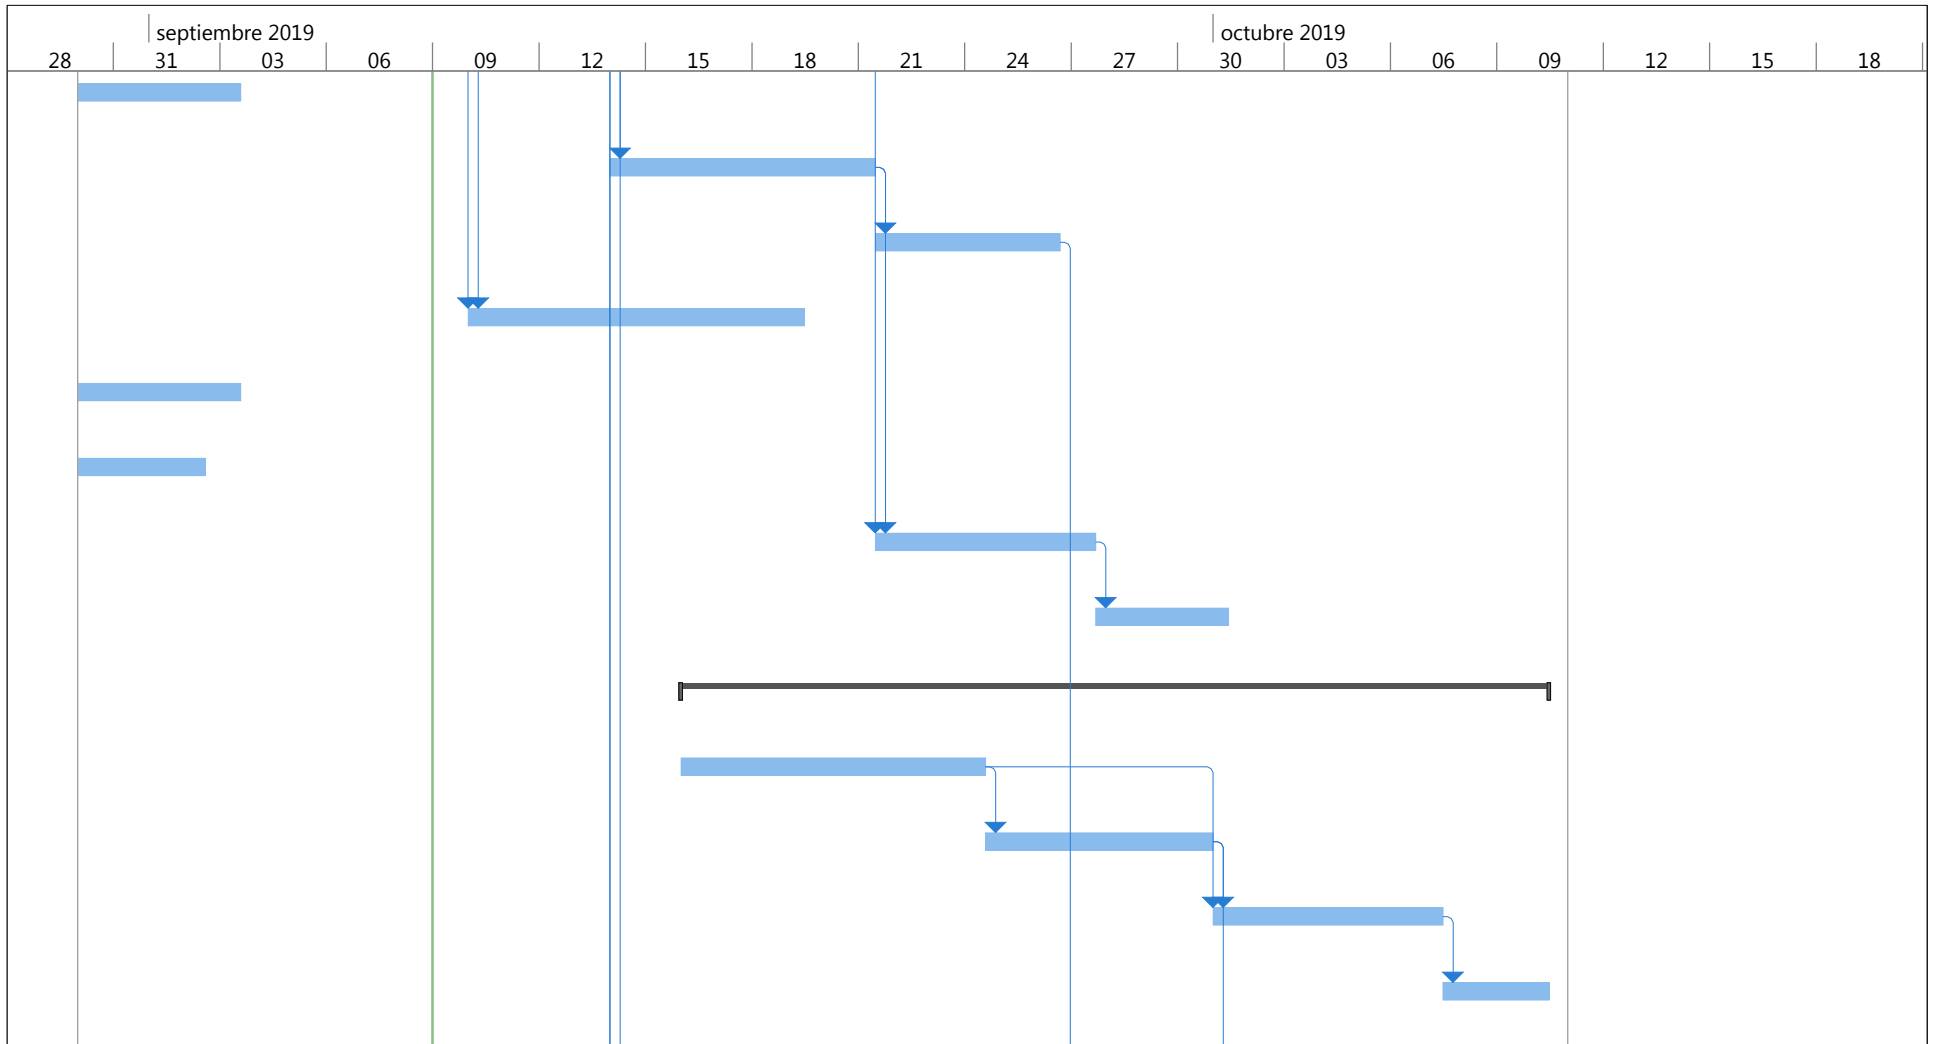


Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

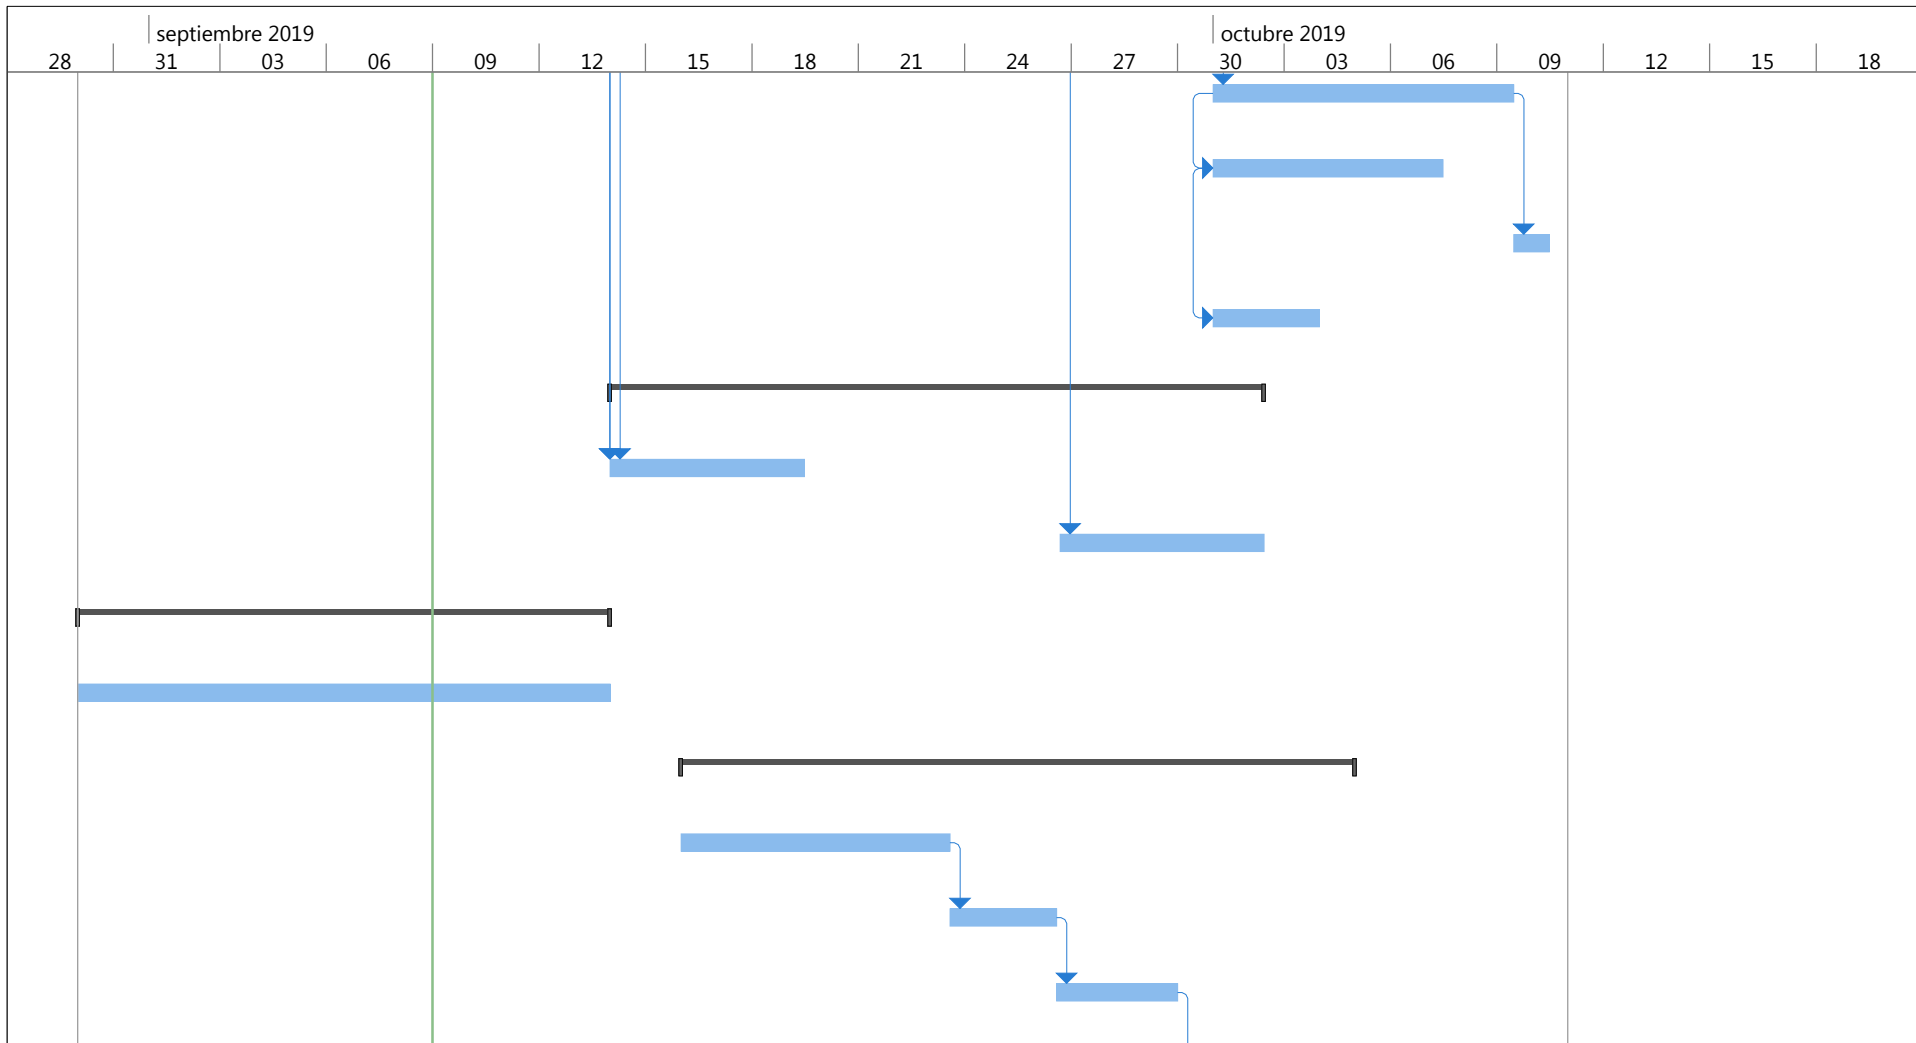

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

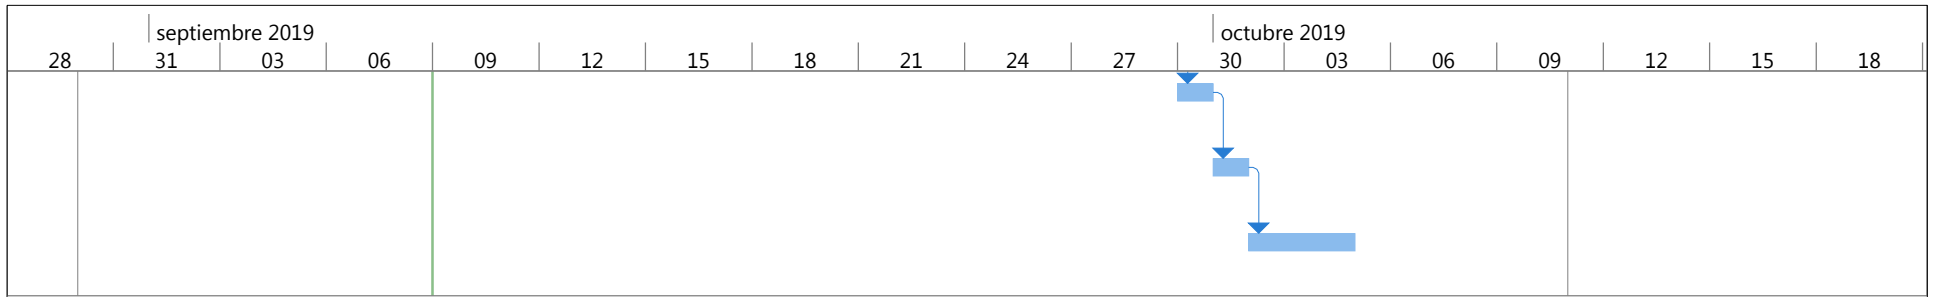

Proyecto: CALENDARIO DE ACT
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
