

CONSTRUCCIÓN ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

ACTIVIDADES MERMADAS. SE ESTA TRABAJANDO EN EL CONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA VALIDAR ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION LOS TRABAJOS EJECUTADOS. REACTIVACION EN 2DA SEMANA DE ENERO INSTALACION DE TOPES Y ADQUISICION DE APARATOS SANITARIOS PARA SU PROXIMA INSTALACION. EJECUCION ESCALINATA DEL LATERAL IZQUIERDO HACIA EL DEPOSITO DE BASURA, CONFECCION DE VERJAS INTERIORES. SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE NIVELACION AREA EXTERIOR Y TERMINACION DE CANALETA LONGITUDINAL PARA EL PASO DE LAS AGUAS PLUVIALES, PINTURA DE HERRERIA, ESCALINATADA FRONTAL DE ACCESO AL CENTRO. CONFECCION E INSTALACION DE BARANDAS EN TERRAZAS EXTERIORES Y VERJA FRONTAL, LIMPIEZA GENERAL, CABLEADO ELECTRICO INTERIOR DEL LA ESTANCIA E INTALACION DE LUMINARIAS EN AREA EXTERIOR. SE TRABAJO EN LAS OBSERVACIONES DE LA MESA MINERD SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO E INFORME SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO HIDRAHULICO. LOS TRABAJOS CONTINUAN MERMADOS DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL MISMO. LOS TRABAJOS SE ENCONTRABAN MERMADOS POR LA LLUVIAS. SE ESTABATRABAJANDO EN LAS TERRAZAS EXTERIORES. TRABAJANDO EN LA CONFECCION DE LA CAMARA SEPTICA DONDE FUE INDICADO. TERMINACION DE VERJA FRONTAL Y ADECUACION DE LA PARTE FRONTAL DEL PROYECTO EJECUCION DE ESCALINATAS Y RAMPAS, SE LE ENVIO LOS PLANOS PLUVIALES Y SANITARIOS PARA SU EJECUCION. ADQUISICION DE LAS CERAMICAS PARA SU PROXIMA COLOCACION. SE ENVIO PARA APROBACION EL REMOSAMIENTO DE LA CAÑADA AL MINERD.

AGOSTO 2015



AGOSTO 2015



MARZO 2016



OCTUBRE 2016



OCTUBRE 2016



MARZO 2017



MARZO 2019



JUNIO 2019



SEPTIEMBRE 2019



SEPTIEMBRE 2019




OCTUBRE 2019



OCTUBRE 2019




NOVIEMBRE 2019

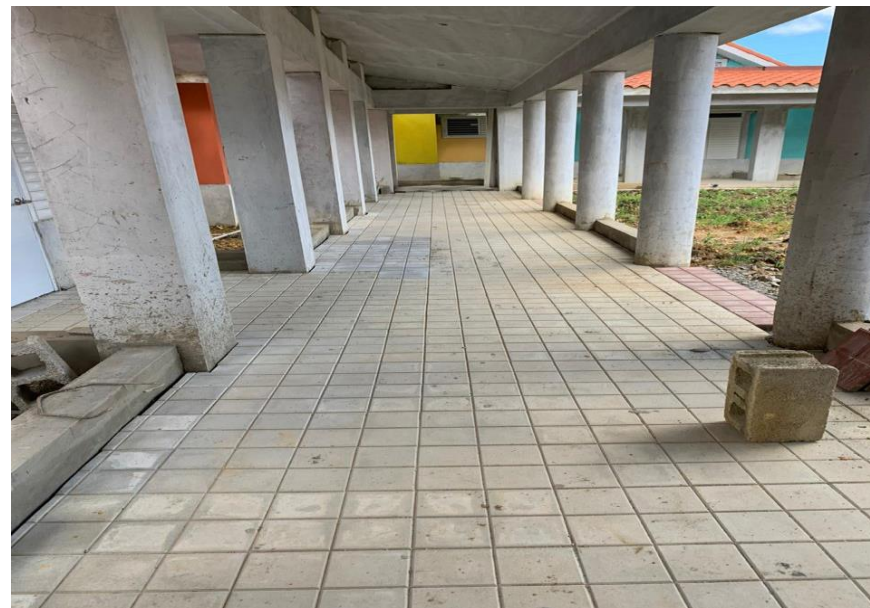

NOVIEMBRE 2019



ENERO 2020

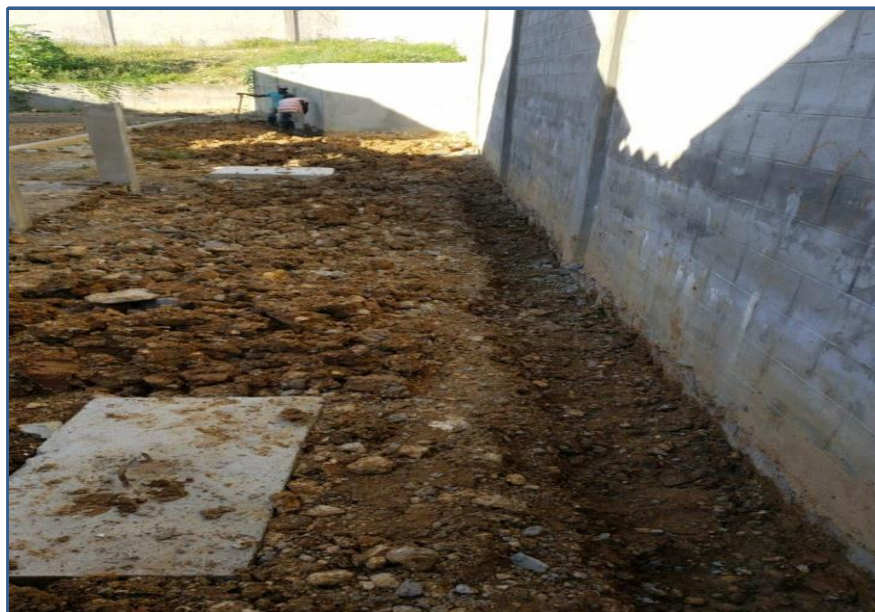

DICIEMBRE 2020

