



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

"Año de la Innovación y la Competitividad"



SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD

CALENDARIO DE EJECUCIÓN HOSPITALES

No.	PROYECTOS	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
1	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA	INAUGURADO MAYO 2019
2	HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT	INAUGURADO JUNIO 2019
3	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA	JULIO 2019
4	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTÓBAL	JULIO 2019
5	SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE	AGOSTO 2019
6	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE	AGOSTO 2019
7	HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO	SEPTIEMBRE 2019
8	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA	SEPTIEMBRE 2019
9	HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO	SEPTIEMBRE 2019
10	HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	SEPTIEMBRE 2019
11	HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN	SEPTIEMBRE 2019
12	HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE 2019
13	HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO	SEPTIEMBRE 2019
14	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE	SEPTIEMBRE 2019
15	HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROV. ELIAS PIÑA	SEPTIEMBRE 2019
16	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	NOVIEMBRE 2019
17	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEYBA, PROV. BAHORUCO	NOVIEMBRE 2019




HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTÓBAL

ABRIL 2019

APLICACIÓN PINTURA, ADMINISTRACIÓN,
SEG.NIVEL.



RAPILLADO EN MURO. ÁREA ADMINISTRACIÓN.
2DO.NIVEL

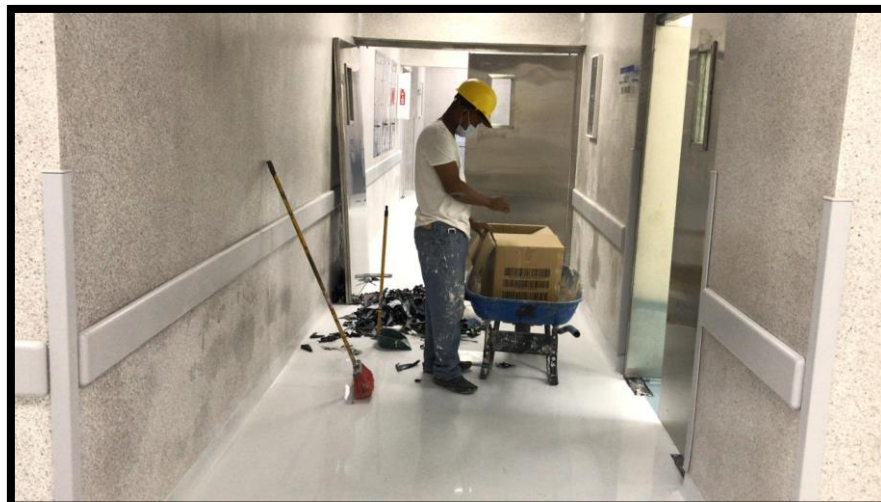

LIMPIEZA, MATERNIDAD 3ER NIVEL




INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO. MATERNIDAD
3ER PISO



MAYO 2019

LIMPIEZA PASILLO, MATERNIDAD 3ER NIVEL

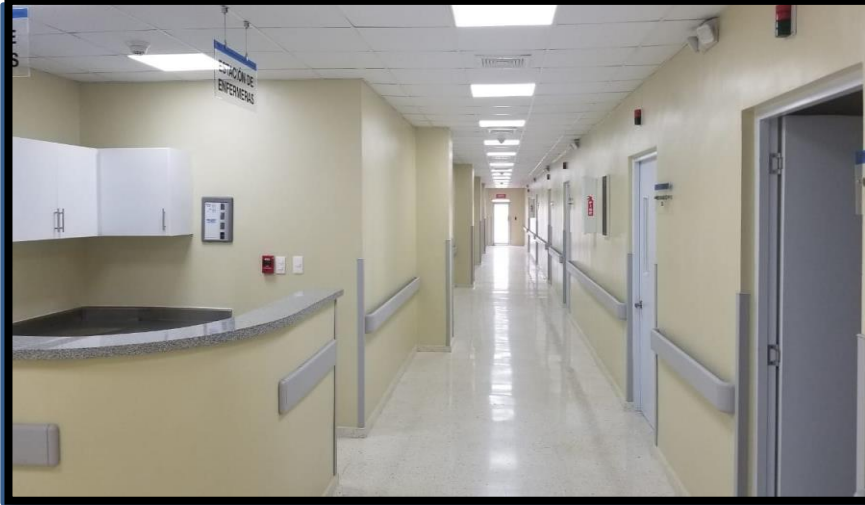

APLICACIÓN DE URETANO ÁREA DE QUIRÓFANOS



LIMPIEZA EN ÁREA DEL COMEDOR DE COCINA




LIMPIEZA ÁREA INTERNAMIENTO EN CARDIOLOGÍA

JUNIO 2019


QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA

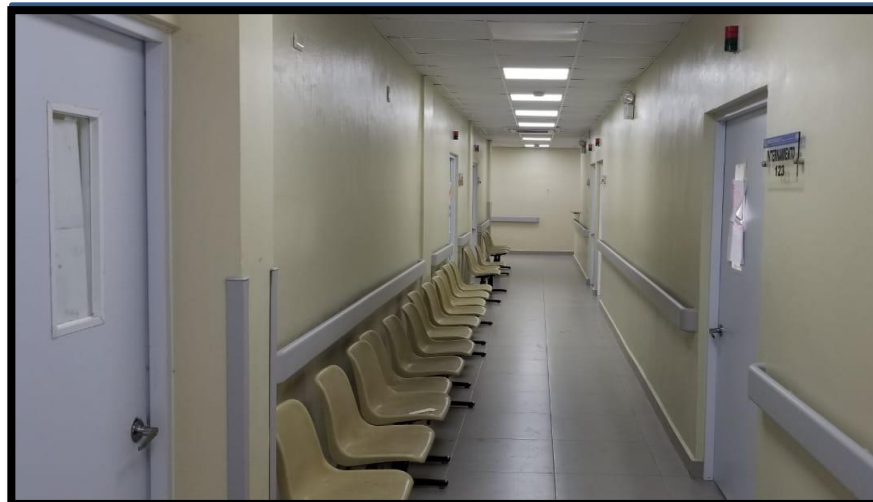

PINTURA EXTERIOR EDIFICIO CONSULTA EXTERNA

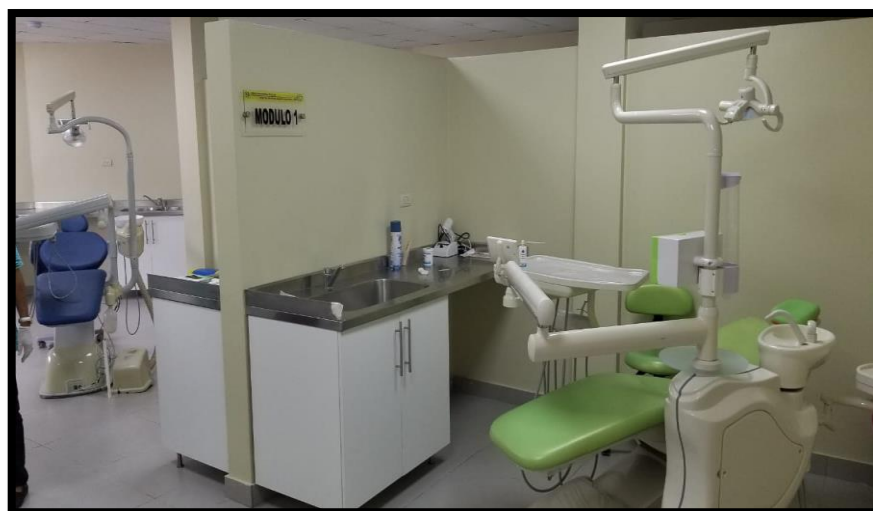

ODONTOLOGÍA



HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROV. BAHORUCO.

ABRIL 2019

COLOCACIÓN DE BLOQUES



COLOCACIÓN DE BLOQUES



COLOCACIÓN DE BLOQUES



VARILLADO Y COLOCACIÓN DE BLOQUES

VARILLADO EN ÁREA DE LAVANDERÍA



VARILLADO EN ÁREA DE LAVANDERÍA



VARILLADO EN ÁREA DE CONSULTA



ENCOFRADO Y VARILLADO EN LAVANDERÍA

JUNIO 2019

ENCOFRADO Y VARILLADO EN LAVANDERÍA



VARILLADO CONSULTA



VARILLADO CONSULTA



VARILLADO EMERGENCIA



HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROV. ELIAS PIÑA

ABRIL 2019

CASETA ELÉCTRICA



VISTA FRONTAL



COLOCACIÓN DE BLOCK CASETA ELÉCTRICA



EXCAVACIÓN VERJA POSTERIOR

MAYO 2019

COLOCACIÓN DE ACERO ZAPATA VERJA POSTERIOR



INTERIOR HOSPITAL



EXTERIOR DEL HOSPITAL



COLOCACIÓN DE BLOCK VERJA PERIMETRAL

JUNIO 2019

COLOCACIÓN DE BLOQUES CASETA DE DESECHOS



COLOCACIÓN BLOQUES VERJA LATERAL DERECHA



COLOCACIÓN DE BLOQUES



COLOCACIÓN DE BLOQUES CASETA ELÉCTRICA



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS


ENTREGA ÁREA DE FISIATRÍA



ENTREGA ÁREA DE INTERNAMIENTO



RETOQUES DE PINTURA ÁREA MORGUE

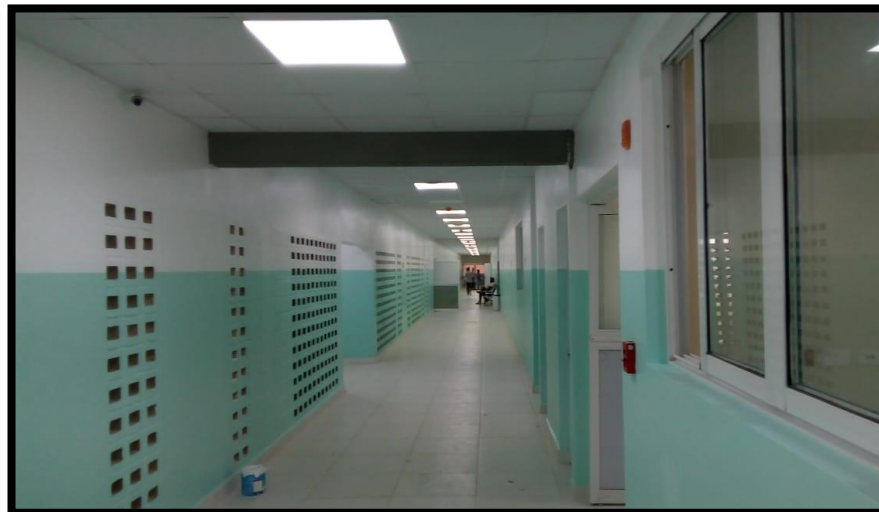

TERMINACIÓN DE DINTEL EN PASILLOS

MAYO 2019

DESMONTE DE VENTANAS



DEMOLICIÓN DE PISOS



COLOCACIÓN MUROS DE BLOCK



DESMONTE DE PLAFONES

JUNIO 2019

LIMPIEZA ÁREA EXTERIOR MORGUE



APLICACIÓN DE PRIMER EN ÁREA DE MORGUE



TERMINACIÓN DE PINTURA



LIMPIEZA ÁREA MORGUE



HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROV. EL SEIBO

ABRIL 2019

PAÑETE EN MORGUE



CONFECCIÓN DE REGISTRO SANITARIO



COLOCACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS



REVESTIMIENTO DE PAREDES EN BAÑOS

MAYO 2019

DETUBERÍAS DE SERVICIO DE GAS PROPANO



REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN DE CISTERNA



CONFECCIÓN TAPAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO



REPARACIÓN DE PISOS EN BAÑOS DE INTERNAMIENTO

JUNIO 2019

CASETA DE DESECHOS



COUNTER DE ENFERMERAS



PASILLOS



INTERNAMIENTO



HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO

ABRIL 2019

ÁREA DE CONSULTA



HEMOFILIA



INTERNAMIENTO LACTANTE



RESIDENCIA MEDICA 2

SONOGRAFÍA



VISTA FRONTAL




ANEXO AUTOCLAVE




INTERNAMIENTO QUIRÚRGICO

BANOS BANCO DE SANGRE

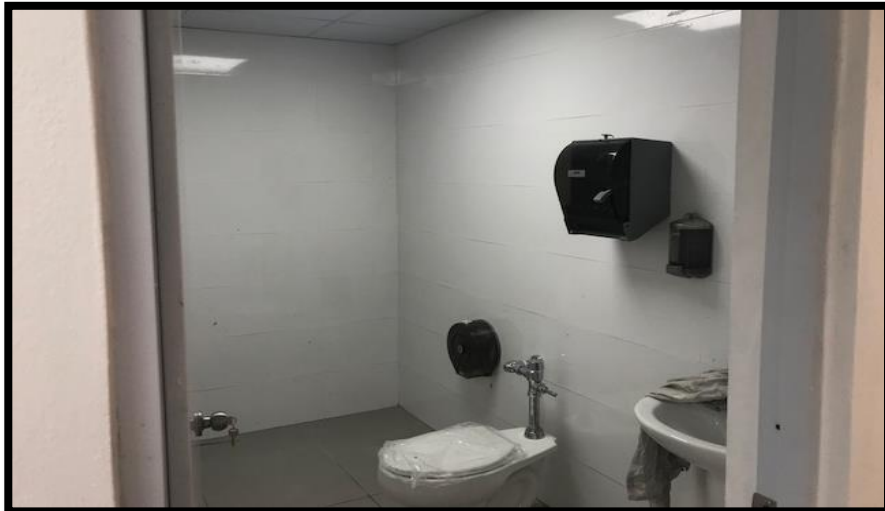

PASILLO BANCO DE SANGRE

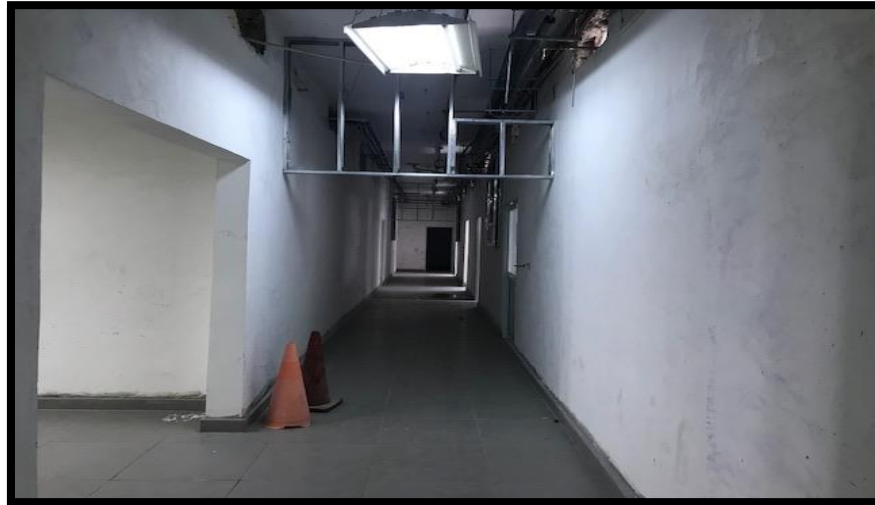

RESIDENCIA MEDICA



PASILLO BANCO DE SANGRE



HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

ABRIL 2019

VISTA FRONTAL



ARCHIVO COLOCACIÓN TOPE DE GRANITO



AISLAMIENTO (INTERNAMIENTO) COLOCACIÓN DE BLOKAID




CASETA DESECHOS

EMERGENCIA COLOCACION ESQUINEROS



COLOCACIÓN DE PUERTAS

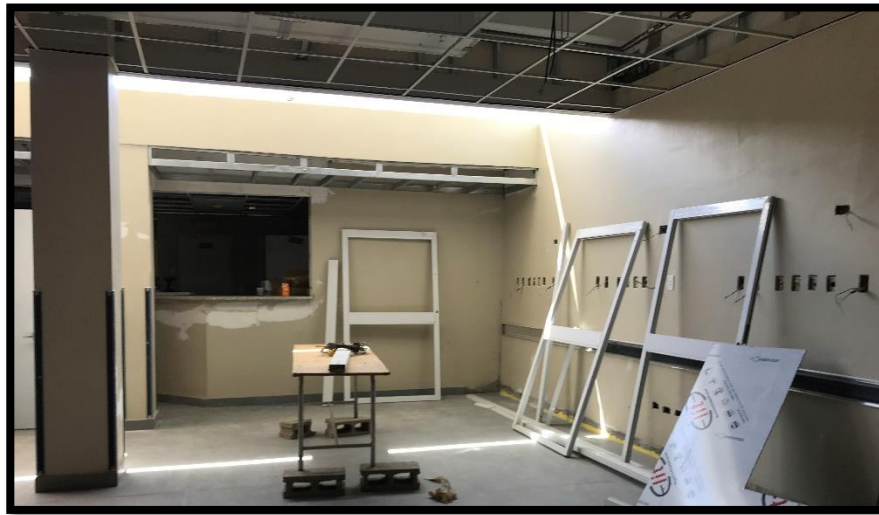

TOPE DE GRANITO ESTACIÓN DE ENFERMERÍA



FACHADA FRONTAL BAÑO SONOGRAFÍA

JUNIO 2019

VISTA FRONTAL



FACHADA FRONTAL



QUIRÓFANO PASILLO



EMERGENCIA ENTRADA PEATONAL



HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA

ABRIL 2019


ESCALERA



ÁREA DE LAVANDERÍA



ATENCIÓN AL USUARIO

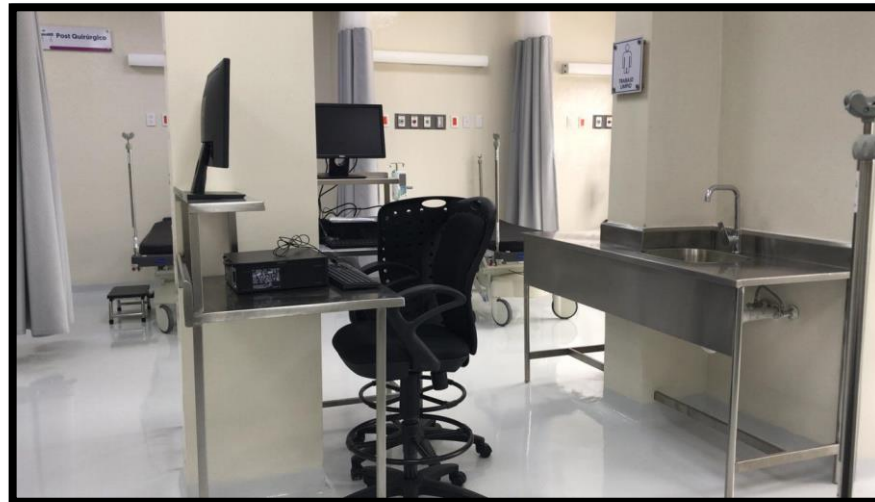


MUEBLES Y MESETA EN LABORATORIO

MAYO 2019

FACHADA



ÁREA POST QUIRÚRGICA

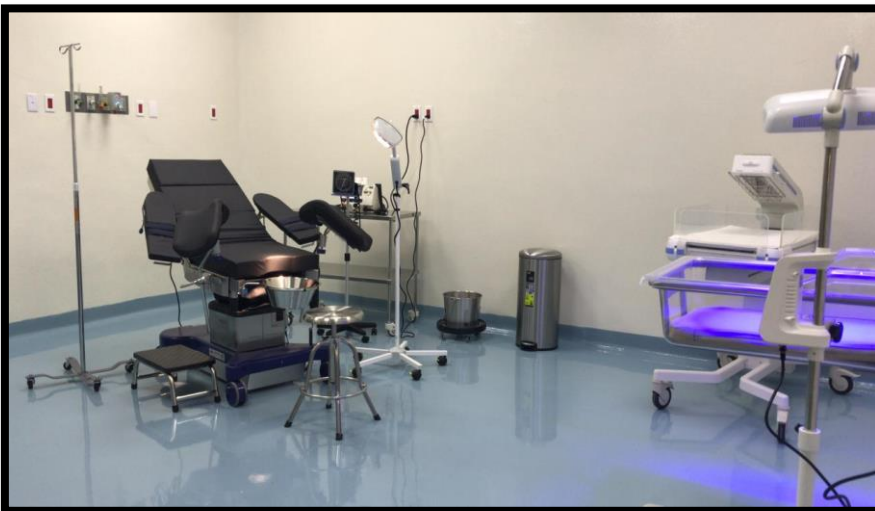

SALA DE PARTO




HOSPITALIZACIÓN



HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA

ABRIL 2019

ALAMBRADO LLAMADA A ENFERMERÍA

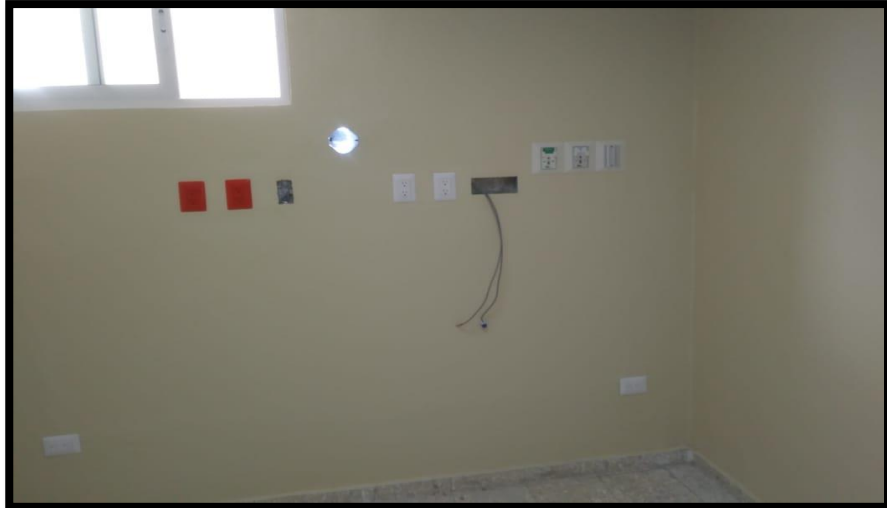

DUCTERÍAS A/A

COLOCACIÓN PANELES ELÉCTRICOS



MAYO 2019

PINTURA ÁREA DE VACUNA



ALARMA SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS



TRABAJOS ELÉCTRICOS



ALAMBRADO

JUNIO 2019

CASETA PROVINCIONAL PLANTA



REJILLA SALIDA AIRES



TRABAJOS CLIMATIZACIÓN



HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT

ABRIL 2019


ALMACÉN DE FARMACIA CLIMATIZACIÓN



EQUIPAMIENTO ÁREA DE CIRUGÍA GENERAL



CIRUGÍA GENERAL EQUIPAMIENTO DE ÁREA

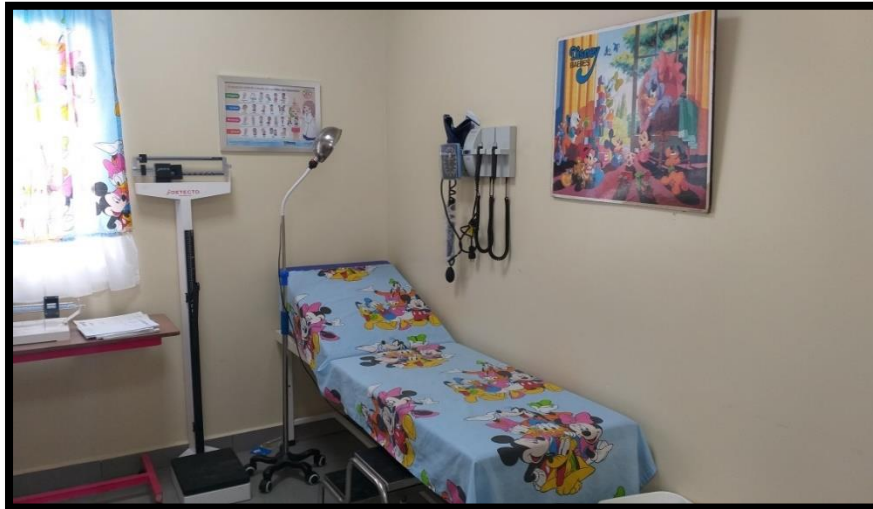

EQUIPAMIENTO ÁREA DE PEDIATRÍA




MAYO 2019


ATENCION AL RECIEN NACIDO



CIRUGIA MATERNIDAD

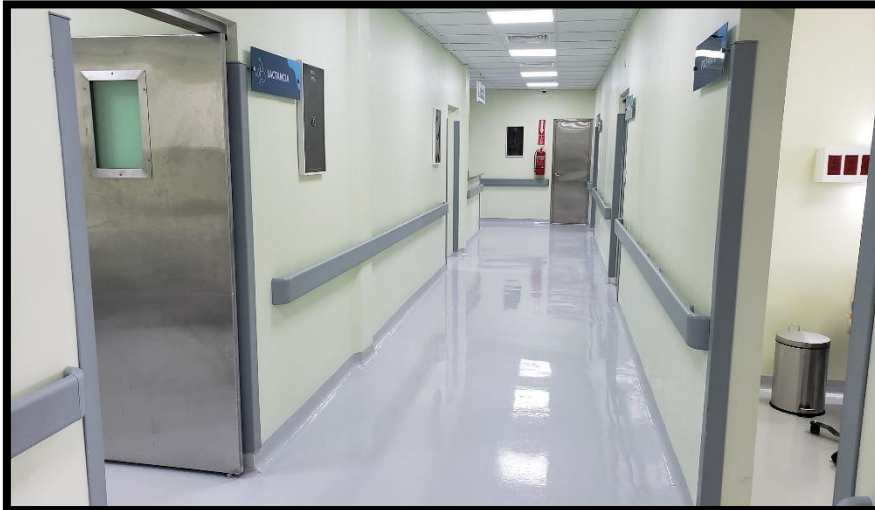


PASILLOS DE CONSULTA

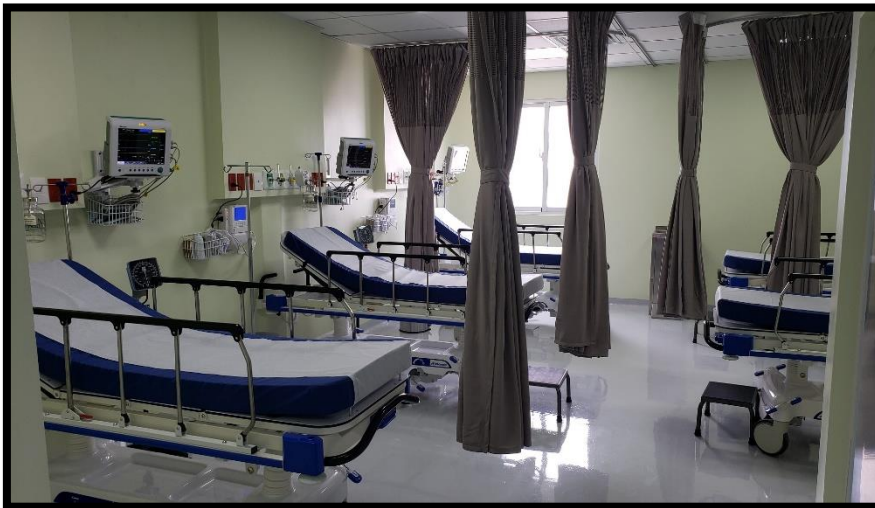

POST PARTO

JUNIO 2019

PRE PARTO

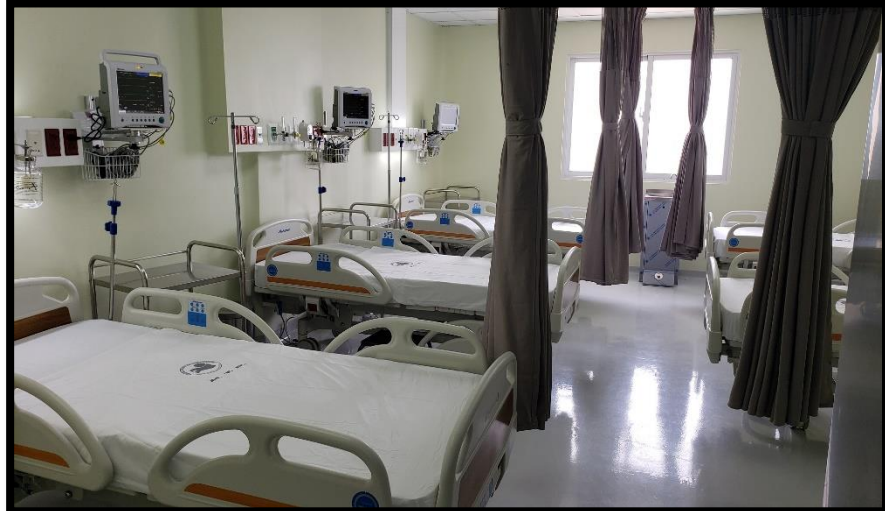

UCI



QUIRÓFANO MATERNIDAD



QUIRÓFANO



JUNIO 2019

FACHADA FRONTAL



FACHADA TB



PRIMER NIVEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS



TERCER NIVEL INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PLAFÓN



HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO

ABRIL 2019

COLOCACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA EN PARQUEO



COLOCACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA EN PARQUEO



COUNTER DE ENFERMERÍA



DEMOLICIÓN HUECO DE PUERTAS

MAYO 2019

VACIADO PLATEA



HUECOS PARA INSTALACIONES DE GASES



EMERGENCIA MARQUESINA

RELLENO AREA DE INTERNAMIENTO

JUNIO 2019

ANEXO ALMACÉN CIRUGÍA



ANEXO LABORATORIO



CASETA DE PLANTA



CASETA DESECHOS SOLIDOS



HOSPITAL MUNICIPAL DR. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA

ABRIL 2019

ENCOFRADO DE VIGAS ANEXO EMERGENCIAS



ENCOFRADO DE VIGAS ANEXO EMERGENCIAS



EXCAVACIÓN ZAPATA CASETA PLANTA ELÉCTRICA



INSTALACIÓN DE AIRE

MAYO 2019

VACIADO DE HORMIGÓN ENCASETA ELÉCTRICA



ENCOFRADO Y VACIADO DE HORMIGÓN DE VIGAS



COLOCACIÓN DE BLOQUE ENTB



HORMIGÓN DE COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL

JUNIO 2019

HORMIGÓN DE VIGAS CASITA DE PLANTA ELÉCTRICA VACIADO DEL HORMIGÓN DE LOSA DE PISO ENTB



CANTOS Y COLUMNAS DE VERJA PERIMETRAL



HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN

ABRIL 2019

PREPARACIÓN PARA VACIADO EN MODULO A



ARMADO DE LOSA EN MODULO A



VACIADO DE LOSA EN MODULO A



VACIADO DE LOSA EN MODULO A

MAYO 2019

INICIO DE ENCOFRADO MODULO B



INICIO DE ENCOFRADO MODULO B



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



INICIO ENCOFRADO LOSA MODULO B (FONDOS DE VIGAS)

JUNIO 2019

ENCOFRADO LOSA DE TECHO DEL BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO DEL BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A




VACIADO DE LOSA



HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL

ARMADO DE CEPOS PARA COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL

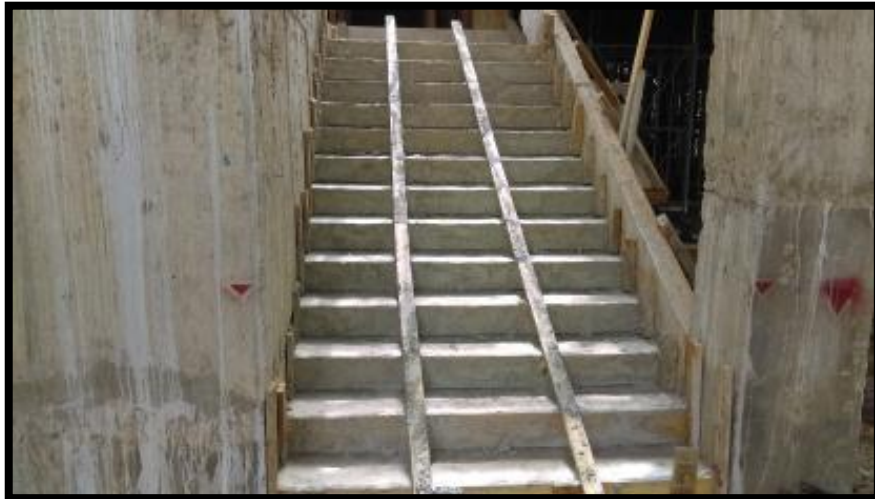

ENCOFRADO DE VIGAS DE ENTRPISO



ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO EN MUROS

MAYO 2019

VACIADO DE ZAPATA EN MUROS



VACIADO DE LOSA ENTREPISO PRIMER NIVEL



COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MUROS LATERALES



ARMADO LOSA DETECHO

JUNIO 2019

COLOCACIÓN DE BLOCK EN CASETA DE PLANTA



VACIADO DE LOSA



ARMADO ACERO DE MUROS DE LOS ASCENSORES



**VACIADO DE LOS TECHO Y APLICACIÓN DE PAÑETE
(GARITA DE GUARDIA)**

JUNIO 2019

DESENCOFRADO DE LOSA DE ENTREPISO



ENCOFRADO DEL 1ER. MURO DE ASCENSOR



ARMADO DE ACERO DE MUROS DE LOS ASCENSORES



VACIADO DE MUROS DE ASCENSORES



HOSPITAL SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE

ABRIL 2019

PAÑETE DE COLUMNA CONSULTORIOS POLIVALENTES



COLOCACIÓN DE PUNTOS PARA EL VACIADO



COLOCACIÓN DE TOPES DE GRANITO




LIJADO DE PARED EXTERIOR EN LAVANDERÍA

MAYO 2019

LIJADO DE PARED EXTERIOR EN LAVANDERÍA



LIMPIEZA EN HABITACIONES DE INTERNAMIENTO

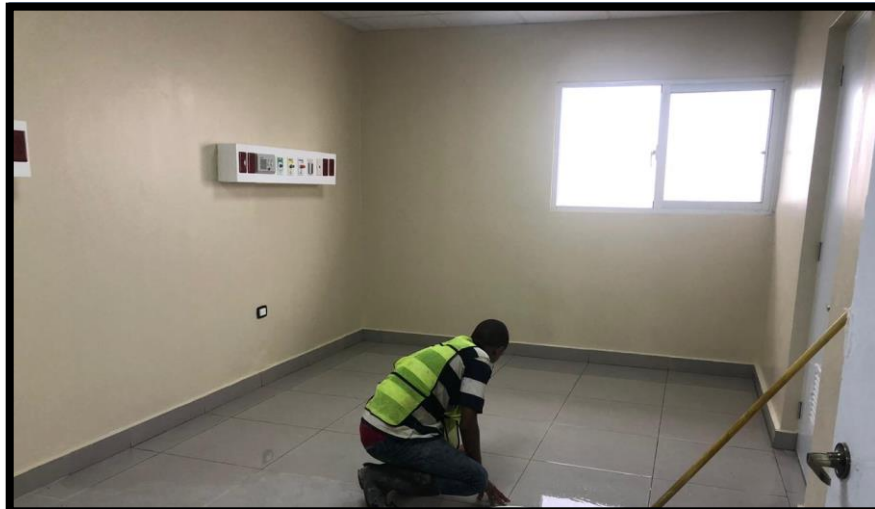

LIMPIEZA EN HABITACIONES DE INTERNAMIENTO



COLOCACIÓN DE GABINETE EN MELANINA

JUNIO 2019

MALLA ELECTRO SOLDADA Y VACIADO EN PATIO



CONFECCIÓN DE DUCTERÍAS



TUBERÍA PPR EN ZANJA CONSULTORIOS POLIVALENTES

DEMOLICIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE SANITARIO



HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, PROV. SANTO DOMINGO OESTE

ABRIL 2019

CHAPOTE EN BAÑOS DE INTERNAMIENTO



INSTALACIONES GASES MÉDICOS



INSTALACIONES GASES MÉDICOS



TRABAJOS ELÉCTRICOS - BLOQUE QUIRÚRGICO 3ER NIVEL

MAYO 2019

COLOCACIÓN PRIMERA CAPA DE PISO ASÉPTICO



CANTOS Y MOCHETAS



TRABAJOS ELÉCTRICOS INTERNAMIENTO



TRABAJOS ELÉCTRICOS - INTERNAMIENTO 2DO NIVEL

JUNIO 2019

CLIMATIZACIÓN, BLOQUE QUIRÚRGICA, 3ER NIVEL



TRABAJOS ELÉCTRICOS, INTERNAMIENTO, 1ER NIVEL



PAÑETE MUROS, INTERNAMIENTO, 2DO NIVEL,
BLOQUE D (3)



PINTURA SEMIGLOSS, BLOQUE QUIRÚRGICO, 3ER
NIVEL



HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, MUNICIPIO DE GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE

ABRIL 2019

ARMADO DE MURO EN PLANTA DE TRATAMIENTO



EXCAVACIÓN DE ZAPATA EN ANEXO DE EMERGENCIA



COLOCACIÓN DE BLOCK CASETA DE BASURA



LIMPIEZA HABITACIONES

MAYO 2019

DEMOLICIÓN DE PISOS



MURO DE CHIRROTRABAJO SUCIO Y LIMPIO



LIMPIEZA EN HABITACIÓN



JUNIO 2019

ENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE ENTUBERCULOSIS COLOCACIÓN DE BLOCK CASETA DE BASURA



RELLENO DE REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO



ENCOFRADO DE COLUMNA EN MORGUE
