



*Presidencia de la República Dominicana*  
**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
(OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO**

**MEMORIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**GESTIÓN ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ**

**2017**

**Santo Domingo, D.N.**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

	<b>PÁGINA</b>
<b>I. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>5</b>
<b>II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>9</b>
A- MISIÓN	
B- VISIÓN	
C- BASE LEGAL INFORMÁTICA	
D-PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	
<b>III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO</b>	<b>13</b>
A. METAS INSTITUCIONALES	
B. INDICADORES DE LA GESTIÓN	
1. METAS PRESIDENCIALES	
2. SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)	
<b>C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>38</b>
1 ÍNDICE DE TRASPARENCIA	<b>40</b>
2 NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI)	
3 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)	<b>50</b>
<b>D. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS</b>	<b>67</b>
<b>IV. GESTIÓN INTERNA</b>	

A. DESEMPEÑO FINANCIERO	
1. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO	<b>84</b>
2. AVANCES EN EL PNPSP Y EN LA END	
3. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017	<b>85</b>
4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 2017	<b>88</b>
5. SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS	<b>113</b>
6. INFORME DE SITUACIÓN EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS EN EJECUCIÓN E INAUGURADAS	<b>115</b>
	<b>129</b>
7. CUADRO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	<b>146</b>
8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN: INGRESOS Y RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS	<b>172</b>
RESUMEN DE DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR AL 31/12/17	
9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO .POBREZA EXTREMA Y HAMBRE	<b>174</b>
.ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL	
.IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	
.MORTALIDAD INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	
.SALUD MATERNA	
.VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES	

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

B-CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES	177
1 .RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES 2016	
2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBRO - COMPRAS MENORES	
<b>VI. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>205</b>
1. INFORME DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
2. LOGROS DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN	
3. RESUMEN SOLICITUDES TRAMITADAS Y RESULTADOS	
4. SOLICITUDES ATENDIDAS POR CONDICIÓN	
5. SOLICITUDES ATENDIDAS POR GENERO	
6. INFORME FINAL DE SOLICITUDES AÑO 2017	
C. PROYECTOS TERMINADOS E INAUGURADOS	212
<b>VII. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO</b>	<b>216</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>220</b>

**I. RESUMEN EJECUTIVO**  
**MEMORIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**2017**

**Santo Domingo, D.N.**

El presente informe muestra el desglose técnico-financiero de las ejecutorias durante el año 2017 por parte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

La OISOE es un instrumento importante en el cumplimiento de las metas propuestas por la gestión del Gobierno central, al asumir la supervisión y construcción de diferentes infraestructuras. Como ente estatal, tenemos el compromiso de contribuir con los objetivos del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez de encaminar la nación

La inversión total por concepto de proyectos ejecutados durante el año 2017 provenientes del Tesoro de la Nación, asciende a la suma de **RD\$5,875,455,994.37** (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS).

La distribución de estos fondos destinados a la inversión de los proyectos que ejecuta esta oficina, se detallan en el presente informe según su línea de acción:

CANTIDAD DE PROYECTOS	LÍNEA DE ACCIÓN	MONTO INVERTIDO 2017 (RD\$)
2	Proyectos Habitacionales	42,785,843.96
36	Proyectos Viales	714,582,848.01
11	Proyectos Acción Comunitaria	6,785,366.71
1	Proyectos de Educación Superior	0.00
88	Proyectos de Salud	5,087,046,481.49
2	Proyectos Culturales	22,726,315.64
10	Proyectos Religiosos	1,032,312.65
1	Infraestructura Deportiva	496,825.91
4	Restauración de Monumentos	0.00
4	Proyectos Informáticos	0.00
158 Proyectos Ejecutados con una Inversión en RD\$		5,875,455,994.37

CANTIDAD DE PROYECTOS	ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
203	Escuelas
24	Estancias Infantiles
227	PROYECTOS ESCOLARES

Durante el citado período, han sido entregados a la ciudadanía proyectos de gran trascendencia nacional, contribuyendo al aumento de la inversión en servicios

sociales y fortaleciendo las capacidades y oportunidades de la población más necesitada, logrando avances relevantes, especialmente en los sectores de mayor impacto social tales como: salud, educación, vivienda y obras viales, mejorando la calidad de vida de manera directa a 6,768,564 habitantes de la República Dominicana. La inversión en los proyectos inaugurados por esta oficina, asciende a la suma de RD\$2,671,420,451.94.

Las ejecutorias de OISOE están alineadas de manera prioritaria con el Segundo Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cumpliendo con una de las principales metas propuestas por la gestión actual de Gobierno que consiste en continuar el cambio hacia **“una vida digna y saludable para toda la población”**. La institución con el objetivo de contribuir en el cumplimiento de las Metas de la Nación, está involucrada en la supervisión de 203 proyectos escolares, 24 estancias infantiles; así como la construcción de 36 Centros de Diagnósticos y Atención Primaria (CDAP) y 52 hospitales y emergencias en todo el territorio nacional, brindando atención integral con calidad a los diversos grupos poblacionales. Estas y otras obras, son de gran importancia para la población dominicana; conformando el compendio de proyectos en los que se invirtieron los fondos destinados, garantizando instalaciones óptimas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y acercando a nuestra nación al modelo de desarrollo propuesto.



## **II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL**

### **A-Misión:**

Coordinar, ejecutar y supervisar la construcción de obras de infraestructuras gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

### **B-Visión:**

Ser la institución que promueva la ejecución y fiscalización de proyectos de infraestructuras en el sector público, prioritarios para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.

### **C-Base Legal Informática:**

El Decreto 1261-86-484 del 15 de diciembre del 1986, designa al Ing. Rafael VitelioBisonó como encargado de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo, la cual surge con el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el Gobierno Dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República Dominicana, y motivada por el Proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América.

Decreto 590-87, del 25 de noviembre del 1987 designa al Ing. Bienvenido Martínez Brea, como encargado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

Luego el Decreto No. 446-00 del 16 de agosto del 2000 unifica la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado actualmente está siendo dirigida por el **Ingeniero Francisco Pagan**, Director General de la institución.

#### **D-Principales Funcionarios de la OISOE:**

<b>FUNCIONARIOS Y/O ENCARGADOS DE ÁREAS</b>	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	ING. VÍCTOR MATÍAS ENCARNACIÓN
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>	ARQ. FÁTIMA ORTIZ PÉREZ
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b>	LIC. LINA DE LA CRUZ
<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI)</b>	LIC. ELIANNY CABA
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	LIC. FELIPE ARIAS
<b>SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA</b>	LIC. WILFREDO RAMÍREZ
<b>SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	LIC. NATALIA MELO SOTO
<b>DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	ING. RAFAEL TAVÁREZ UREÑA

<b>DIRECCIÓN DE LICITACIONES</b>	ING. AQUILES CHRISTOPHER SÁNCHEZ
<b>DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS</b>	ING. JUVENAL BRENES BOBEA
<b>DIRECCIÓN DE SUPERV. DE EDIF. ESCOLARES</b>	ING. ING. LEÓNIDAS VALDEZ
<b>DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD</b>	ING. SONIA BETSAIDA DOMÍNGUEZ BÁEZ
<b>SUB-DIRECCIÓN D.N. Y PROV. S.D. Y REGIÓN SUR</b>	ING. LUIS RUIZ
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIÓN NORTE Y NORDESTE</b>	ARQ. RAFAEL ANTONIO CRUZ TAVÁREZ
<b>SUB-DIRECCIÓN REGIONAL ESTE</b>	ING. MIGUEL ARTURO BALAGUER
<b>SUB-DIRECCIÓN REG. SUR</b>	ING. LUIS CONRADO RUIZ V.
<b>SUB-DIRECCIÓN ELÉCTRICA</b>	ING. JOSÉ MONTERO
<b>SUB-DIRECCIÓN DISEÑO</b>	ARQ. INGRID MERCEDES GARCÍA
<b>SUB-DIRECCIÓN PRESUPUESTO</b>	ING. JOSÉ ALEJANDRO ARIAS REYES
<b>SUB-DIRECCIÓN CUBICACIONES</b>	ING. WILFREDO GONZÁLEZ CASTILLO
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES</b>	LIC. GILBERT GUZMÁN
<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	ING. ABEL HERIBERTO HERRERA

### **III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO**

#### **A. Metas Institucionales**

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructura, podemos identificar que según la naturaleza de las actividades que realiza la misma, sus aportes se sitúan dentro del

Segundo y Tercer Eje de la ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que procura:

“Una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda digna y Servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la Pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible , que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## **B. INDICADORES DE GESTIÓN**

**Fortalecer y Supervisar** los procesos de contrataciones de Obras del Estado.

**Desarrollar** los procesos de contratación pública mediante la mejora e innovación de los mecanismos de contratación y el reconocimiento y asimilación de las normativas interinstitucionales reguladoras.

**Incrementar** la ejecución de proyectos que promuevan el avance y el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras a nivel nacional.

**Ejecutar** obras de construcción, remodelación, reparaciones, infraestructuras y equipamiento de proyectos.

**Optimizar** la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos de la OISOE, para contribuir a la eficiencia operativa.

**Supervisar, monitorear y fiscalizar** las Obras ejecutadas por las partes contratadas.

**Consolidar** las unidades de Asesoría o Staff, unidades de Apoyo y Áreas Operativas que conforman la estructura organizativa, a través de la capacitación del capital humano e innovar el clima organizacional, renovando estratégicamente la Imagen Institucional.

## 1. METAS PRESIDENCIALES

METAS PRESIDENCIALES	LOGROS ACUMULADOS ENERO-DICIEMBRE	RESTRICCIONES QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE AVANCE RESPECTO DE LO PLANEADO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS.	Construcción de Proyectos Habitacionales	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	REPARACIÓN TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN EL POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA
			CONSTRUCCIÓN PROYECTO HABITACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	IMPERMEABILIZANTE EN EL HOSPITAL DE BAITOA, HOSPITAL HATO DEL YAQUE, HOSPITAL CIEN FUEGO, HOSPITAL BELLA VISTA Y EL ENSANCHE ESPAILLAT, ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ARTURO GRULLÓN, IMPERMEABILIZANTE HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, SANTIAGO. GOBERNACIÓN DE SANTIAGO, REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS PROV. SANTIAGO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO



			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVÁREZ JUSTO, LOS SALADOS
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA

			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HATO MAYOR
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAÑO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.
			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO

			CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN IGNACIO DE SABANETA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL DE JÁNICO
			HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO
			MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y PARTOS H. U. JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
			HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN
			MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE
			HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA
			HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO
			HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS
			LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRÓN) EN EL INSTITUTO ONCOLÓGICO ROSA EMILIA TAVÁREZ, DISTRITO NACIONAL, R.D.

			CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRÓN EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE
			SUBCENTRO DE ENGOMBE
			CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO
			HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO
			HOSPITAL DR. JAIME MOTA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL
			HOSPITAL DE MANZANILLO
			HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO
			HOSPITAL DE BARSEQUILLO
			EMERGENCIA 911, HOSPITAL JACINTO MAÑÓN
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA
			UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA

		Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING
			HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES
			HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL SIGIFRIDO ALBA DOMÍNGUEZ, FANTINO, COTUÍ
			HOSPITAL VILLA LA MATA
			HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUÍ
			HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ
			HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL DE CASTILLO
			HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO
			HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL
			HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN
			HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMA O AL NORTE
			HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAU X, SÁNCHEZ
			HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ
			HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA
			HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS
			HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA
			HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN
			HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT
			HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción Centros de Atención Primaria	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR
			HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE
			HOSPITAL ROSA DUARTE
			HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA

			EMERGENCIA MÓVIL HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Terminación, readecuación y supervisión de Centros Educativos en el D.N. y Prov. Sto. Dgo.	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN DE 81 ESCUELAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Centros Educativos Región Este		CONSTRUCCIÓN DE 73 ESCUELAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Centros Educativos Región Norte		CONSTRUCCIÓN DE 12 ESCUELAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Centros Educativos Región Nordeste		CONSTRUCCIÓN DE 24 ESCUELAS
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Terminación, readecuación y supervisión de Estancias Infantiles en el D.N. y Prov. Sto. Dgo.	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Estancias Infantiles Región Este		CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTANCIAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Estancias Infantiles Región Norte		CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS
	Terminación, readecuación y supervisión de Estancias Infantiles Región Nordeste		CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS



CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción y Reconstrucción de Obras de Educación Superior	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Calles, Aceras y Contenes	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO
			CONSTRUCCIÓN ISLETAS CENTRALES Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA S CALLES 26 DE ENERO Y EDUARDO BRITO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO
			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO
			CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción	Falta De Organización Técnica De Las	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO

	De Calles, Aceras y Contenes	Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	<p>CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, RESPALDO OZAMA, FERNANDO DE NAVARRETE ( LOS MINAS), HORACIO ORTIZ ALVAREZ, CALLE GREGORIO GARCÍA CASTRO ( SECTOR KATANGA), Y LOS SECTORES : LA ENFERMERÍA, ETC.</p> <p>RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCÍA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE</p> <p>CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.</p>
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Calles, Aceras y Contenes	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones,	CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACIÓN, PROV. S.D.E., BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL

		La Omisión Del Riesgo	<p>FLORES, LOS UREÑAS, PROV. STO . DGO.</p> <p>CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO</p> <p>RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO(CALLES DE VALLE DEL ESTE).</p>
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Calles, Aceras y Contenes	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones,	CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D.

		La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN ESCALINATA PICA SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE
			TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
			RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL BARRIO JUAN BOSCH, LA HERRADURA
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Caminos Vecinales	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA REVENTÓN ( TRAMO I ) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA, R. D.
			REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA- REVENTÓN (TRAMO II), EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO
			RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PROVINCIA SAN JUAN
			RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES
ECONOMÍA INCLUSIVA Y	Construcción Y Reconstrucción	Falta De Organización Técnica De Las	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMA II

DESARROLLO PRODUCTIVO	De Caminos Vecinales	Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ.
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Carreteras y Autopista	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	<p>REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN - LA DESCUBIERTA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA BAHORUCO</p> <p>SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLÓN - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLÓN, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA</p>

			CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO-LOS MOTONCITOS-LOS FRÍOS-TRAMO I-IV (DESDE ESTA. 0+00 HASTA ESTA. 12+430) Y SEÑALIZACIÓN GENERAL.,
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Carreteras y Autopista	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO III (DESDE ESTA. 9+187 HASTA ESTA. 10+8.10)
			RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN VÍCTOR-AMACEYES
			RECONSTRUCCIÓN CARRETERA AMACEYES-CARLOS DÍAZ
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Carreteras y Autopista	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MAGUACA - EL LIMÓN- LOMA GALLINA, LA CUEVA-ZAMBRANA-EL COROZO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, R.D.
			RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL PERÚ
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Carreteras y Autopista	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones,	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO
			REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO JUNCALITO

		La Omisión Del Riesgo	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINALLA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA
ECONOMÍA INCLUSIVA Y DESARROLLO PRODUCTIVO	Construcción Y Reconstrucción De Carreteras y Autopista	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VUELTA AL LAGO (BARAHONA-CABRAL-DUVERGÉ-JIMANÍ-LA DESCUBIERTA-PORTER RIO-VILLA JARAGUA, NEYBA, HASTA CRUCE DEL ABANICO)
			CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS
Una Institucionalidad pública participativa para el bienestar social. Mediante el fortalecimiento de la Institucionalidad para la vida en democracia. Más y mejor Defensa Nacional	Intervención de Edificios Gubernamentales	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Licitaciones Y Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
			OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO
			CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

			IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción de Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.
			TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO
			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA
			CONST. DEL EDIF. CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROV. BARAHONA
			CTC YERBA BUENA, JARABACOA



			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTUÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción de Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE
			CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE
			TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
			EQUIPAMIENTO Y ASFALTADO CALLES DEL MULTIUSO DE SAJOMA
			TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) IMBERT
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción y Reconstrucción de Obras para la Recreación y Cultura	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE
			TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROV. SANTA CRUZ DEL SEYBO

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Preservación del patrimonio Cultural	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO, PROYECTO LA NUEVA BARQUITA. (SE EJECUTA POR CONCEPTO DE ORDEN DE CAMBIO)
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMÉRICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACIÓN
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL, D.N.
			RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL

CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción y Reconstrucción de Obras Deportivas	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción y Reconstrucción de Centros Religiosos	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERinstitución PARA LA PARTE ELÉCTRICO EXTERIOR Y ADECUACIÓN PARA EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALÓN PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO
			CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO

			CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN PARROQUIAL EL BUEN PASTOR, ENSANCHE EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL
CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS	Construcción y Reconstrucción de Centros Religiosos	Falta De Organización Técnica De Las Instituciones, Prolongación Del Procedimiento De Contrataciones, La Omisión Del Riesgo	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA TERMINACIÓN CONST. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA, SABANA PERDIDA, PROV. SANTO DOMINGO
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN CASA DE ORACIONES
			CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN.
			IMPERMEABILIZACIÓN TECHO RESIDENCIA PARROQUIAL, TECHO DE ESCALERA Y CÚPULA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL

## 2. SISTEMA DE MONITOREO DE LA MINISTRACIÓN

### PUBLICA

#### CUADRO DEL PROMEDIO GENERAL Y PORCENTAJE ACTUAL

#### DE LA OISOE SEGÚN CRITERIO DEL SISMAP



MINISTERIO DE  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



#### INDICADORES POR INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

CRITERIO

● =0, ● =1, ● =0, ● =0

NO	NOMBRE	SIGLA	STATUS
<b>DETALLE DE INDICADORES (OISOE)</b>			
CLASF. BAROMETRO	NO	NOMBRE DE INDICADOR	STATUS EVIDENCIA
PLANIFICACION	1	Planificación de RRHH	<span style="color: green;">●</span>
ORGANIZACION DEL TRABAJO	2	Estructura de Cargos y Manual de Cargos	<span style="color: green;">●</span>
	3	Organigrama (Estructura Organizativa)	<span style="color: green;">●</span>
	4	Manual de Funciones	<span style="color: green;">●</span>
	5	Mapa de Procesos	<span style="color: red;">●</span>
	6	Base Legal	<span style="color: green;">●</span>
GESTION DEL EMPLEO	7	Historia	<span style="color: green;">●</span>
	8	Pruebas Técnicas	<span style="color: gray;">●</span>
	9	SASP	<span style="color: green;">●</span> 1252
	10	Absentismo	<span style="color: green;">●</span>
	11	Rotación del Personal	<span style="color: green;">●</span>
	12	Concursos Públicos	<span style="color: red;">●</span>
GESTION DEL RENDIMIENTO	13	Taller Reclutamiento y Selección	<span style="color: green;">●</span>
	14	Empleados Reconocidos con Medalla al Merito	<span style="color: green;">●</span>
	15	Evaluación del Desempeño	<span style="color: green;">●</span>
	16	Taller Evaluación del Desempeño	<span style="color: green;">●</span>
GESTION DE LA COMPENSACION	17	Escala Salarial	<span style="color: orange;">●</span>
GESTION DEL DESARROLLO	18	No. Incorporados	<span style="color: green;">●</span> 118
	19	No. Incorporados por Concurso	<span style="color: red;">●</span> 0
	20	No. Incorporados por Evaluación	<span style="color: green;">●</span> 118
	21	No. de Empleados Incorporables	<span style="color: green;">●</span>
	22	Diplomados, Cursos y Talleres	<span style="color: green;">●</span>
	23	Post Grados en Gestión	<span style="color: green;">●</span>
GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	24	Representante Designado de Comisión de Personal	<span style="color: green;">●</span>
	25	Pago de Beneficios Laborales	<span style="color: green;">●</span> 428
	26	Asociación de Empleados	<span style="color: red;">●</span> 0
	27	Taller Relaciones Laborales	<span style="color: green;">●</span>
	28	Salud Ocupacional y Riesgos Laborales	<span style="color: orange;">●</span>
ORGANIZACION DE LA FUNCION DE RR HH	29	Auditoría de Oficina de RR HH	<span style="color: green;">●</span>
	30	Talleres de Función Pública	<span style="color: green;">●</span>
GESTION DE LA CALIDAD	31	Autoevaluación CAF	<span style="color: red;">●</span>
	32	Cartas Compromiso	<span style="color: red;">●</span>
	33	Talleres Metodología CAF	<span style="color: green;">●</span>
	34	Comités de Calidad	<span style="color: green;">●</span>

## C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN

### 1. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA



**Dirección General de Ética  
e Integridad Gubernamental**

**Reporte Monitoreo 1er Trimestre 2017**

*Actualizado al 27/04/2017 sistema mensual de monitoreo*

No.	Institución	Enero	Febrero	Marzo
1	Administradora de Riesgos Laborales (ARLSS)	100	100	100
2	Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	69.86	100	100
3	Cámara de Cuentas (CC)	100	100	100
4	Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)	100	100	100
5	Contraloría General de la República Dominicana (CGR)	100	100	100
6	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	90.19	100	100
7	Departamento Aeroportuario (DA)	100	100	100
8	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	96.73	100	100
9	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	100	100	100
10	Dirección General de Pasaportes (DGP)	100	100	100
11	Hospital Pediátrico Hugo Mendoza	100	100	100
12	Hospital Trumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch (HTQJB)	100	100	100
13	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)	100	100	100
14	Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)	52.14	100	100
15	Jardín Botánico Nacional (JBN)	99.64	100	100
16	Junta de Aviación (JAC)	100	100	100
17	Ministerio de la Juventud (MJ)	100	100	100
18	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	100	100	100
19	Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)	100	100	100
20	Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC)	100	100	100
21	Progresando Con Solidaridad (ProSoli)	100	100	100
22	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	100	100	100
23	Superintendencia de Seguros (SUPERSEGUROS)	100	100	100
24	Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	100	100	100
25	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)	100	100	100
26	Superintendencia de Valores (SIV)	96.73	100	100
27	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	100	100	100
28	Acuario Nacional (AN)	99.29	99	100
29	Consejo Nacional de Competitividad (CNC)	100	99	100
30	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	36.15	99	100



## Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental



### Reporte Monitoreo Portales de Transparencia Julio-Septiembre 2017

*Actualizado al 27/10/2017 sistema mensual de monitoreo, incluye algunos ayuntamientos, hospitales entre otras entidades descentralizadas y autónomas*

### Calificaciones por institución periodo Julio-Septiembre 2017

Institución	Julio	Agosto	Septiembre
Ministerio de Trabajo (MT)	100	100	100
Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS)	99	99	100
Junta de Aviación (JAC)	100	100	100
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	97	100	100
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	100	97	100
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)	99	99	100
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA)	100	100	100
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	100	100	100
Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE)	100	100	100
Oficina de la Defensa Civil (ODC)	100	100	100
Instituto de Auxilios y viviendas (INAVI)	100	100	100
Dirección General de Aduanas (DGA)	99	100	100
Servicio Nacional de salud (SNS)	100	100	100
Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom (CEI-RD)	100	100	100
Dirección General de Catastro Nacional (DGCN)	96	100	100
Dirección General de Comunicación (DICOM)	99	93	100
Despacho de la Primera Dama	97	97	100
Archivo General de la Nación (AGN)	86	93	100
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	97	100	100
Ministerio de Administración Pública (MAP)	93	100	100
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y desarrollo del turismo (CORPHOTELS)	100	97	100
Consejo Nacional VIH-SIDA (CONAVISIDA)	100	100	100
Acuario Nacional (AN)	99	99	99
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	95	100	99
Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP)	99	99	99
Instituto Dominicano de Aviación civil (IDAC)	97	99	99
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)	93	99	99
Ministerio de Interior y Policía (MIP)	99	100	99
Procuraduría General de la República (PGR)	100	97	99
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)	100	99	99
Dirección General de la Policía Nacional (PN)	95	89	99
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR)	99	99	99
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	99	99	99
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)	99	99	99
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)	96	96	99
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)	99	100	99
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	99	99	99
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	89	96	99
Tesorería Nacional (TN)	81	80	98
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	100	85	97
Comedores Económicos del Estado Dominicano (COMEDORES ECONÓMICOS)	100	99	97
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	100	100	97
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros (ASC)	93	97	97

## 2. NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI)

  <p style="text-align: center;"><b>Presidencia de la República Dominicana</b> <i>Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo</i></p>					
<b>PROCESOS TÉCNICOS</b>					
No.	Nombre del Proceso	Subprocesos / Micro proceso	Objetivo del Proceso	Responsable (Dueño del proceso)	Descripción del Proceso



<b>1</b>	<b>Levantamiento</b>	1.1 Levantamiento de Campo	Definir partidas y volúmenes que conformarán el presupuesto del proyecto a ejecutarse por solicitud de la Dirección General o la Dirección Técnica.	Ingeniero Evaluador	A través de mediciones, fotografías y evaluaciones en los terrenos y el área donde se ejecutará el proyecto para ser entregado en la elaboración del presupuesto.
		1.2 Estudio de Factibilidad	Evaluar la viabilidad y/o factibilidad de los proyectos propuestos para establecer las necesidades requeridas.	Supervisor	Luego de las visitas al proyecto, se elaboran y formulan las partidas a ser ejecutadas.
		1.3 Remisión de Levantamiento a la Subdirección de Diseño	Establecer el Diseño definitivo, para ser aplicado al proyecto en cuestión.	Asistente Técnico	Remitir a la Subdirección de Diseño los datos obtenidos en levantamiento de campo y el estudio de factibilidad para la elaboración del diseño a realizar.
		1.4 Remisión de Volúmenes	Remitir los volúmenes y partidas a la Subdirección de Presupuestos.	Asistente Técnico/ Coordinador	Luego de digitado el levantamiento se remite a la subdirección de presupuestos vía Dirección Técnica.

2	<b>Supervisión y Fiscalización de Obras</b>	2.1 Puesta en Posesión del Contratista	Marcar el inicio de manera formal de los trabajos contratados y dar a conocer a la comunidad los responsables de los mismos.	Supervisor/ Coordinador	Se contacta al contratista, comunidad en cuestión, representantes y líderes de la zona al lugar donde se llevará a cabo la obra, previo coordinación.
		2.2 Reporte de Ejecución	Cuantificar los volúmenes ejecutados con el objetivo de generar una cubicación.		El supervisor en campo hace un levantamiento de lo ejecutado en un período determinado de tiempo para remitirlo a la subdirección.
		2.3 Seguimiento a Obras	Validar, evaluar, revisar y dar cumplimiento a los trabajos en todas sus etapas.		Dar Seguimiento Directo a cada proyecto y Velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos.
		2.4 Fiscalización (En caso de existir supervisión privada)	Garantizar la calidad de los trabajos de construcción de las obras públicas aplicando procedimientos de control y administración adecuados	Coordinador y/o Ingeniero Revisor	Representar la institución y cuidar sus intereses, Dirigir, vigilar y controlar el desarrollo de las obra en todas sus etapas

<b>3</b>	<b>Cubicaciones</b>	3.1 Captación de Volúmenes	Preparar los certificados de Medición del proyecto en cuestión.	Ingeniero Revisor	Realizar y revisar cada volumen de partida a ser cubicado, haciendo uso de la documentación de apoyo y tecnología necesaria para garantizar que no contenga errores.
		3.2 Elaboración de la Cubicación	Introducir los volúmenes ejecutados en el formato de cubicación.	Ingeniero Revisor	Procesar los volúmenes a ser cubicados, para tramitarlo a la Subdirección de Cubicación vía Dirección Técnica.
		3.3 Análisis de Partidas Adicionales y No Ejecutables	Elaborar los presupuestos que contemplen los trabajos adicionales para ser tramitados a Dirección Técnica	Asistente Técnico	Preparar los certificados con las partidas por aumento de cantidad y/o nuevas para presupuestar.
<b>4</b>	<b>Recepción y Cierre de Proyecto</b>	4.1 Informe de Pre-Recepción	Tramitar el Informe que dará inicio al proceso de Pre-Cierre del proyecto	Asistente Técnico/ Subdirector	Hacer la solicitud y dar lugar a la Sub-Dirección de Evaluación de Obras tanto para el inicio del proceso de Cierre como para su aceptación.

		4.2 Elaboración de Certificación de Inspección y Recepción Provisional	Elaborar la Certificación de Inspección y Recepción Provisional	Supervisor/ Coordinador	Elaborar la Certificación de Inspección y Recepción Provisional para remitir a la Subdirección, la misma debe estar firmada por el Contratista, Coordinador y Supervisor de Campo.
		4.3 Remisión de Certificación de Inspección y Recepción Provisional	Presentar al Depto. De Evaluación de Obras y certificar la conclusión de los trabajos	Asistente Técnico/ Subdirector	Tramitar la certificación de Inspección conclusión de los trabajos en función de lo contratado y lo ejecutado para fines de la carta de Conclusión Provisional.
		4.4 Procesamiento de Volúmenes para Elaboración de la Cubicación de Cierre.	Elaborar la cubicación de Cierre del proyecto	Supervisor/ Coordinador/ Ing. Revisor	Elaborar la cubicación recogiendo todos los volúmenes ejecutados para el cierre final de la obra.
		4.5 Remisión de la Cubicación de Cierre	Remitir la Cubicación de Cierre del proyecto a la Subdirección de Cubicaciones	Asistente Técnico/ Subdirector	Se remite en formato de cubicación a la Subdirección de Cubicaciones, vía Dirección Técnica, las volumetrías enviadas por el Ingeniero Supervisor.

		4.6 Elaboración de la Cubicación Final	Dar por concluido el proceso de Cierre del Proyecto, para dar paso a la liberación del retenido por la Subdirección de Cubicaciones	Ingeniero Revisor/Subdirector	Remitir la Cubicación Final junto al dossier enviado por la subdirección de evaluación de obras para la liberación del retenido vía Dirección Técnica.
		4.7 Remisión de Certificación de Inspección y Recepción Final	Emitir la Certificación Final de los trabajos	Asistente Técnico/ Subdirector	Se emite la certificación en la cual se hace constar haber recibido en conformidad los trabajos realizados conforme a las obligaciones legales incurridas.
<b>5</b>	<b>Recepción y Tramitación de Expedientes</b>	5.1. Elaboración de oficios de tramitación y evaluación	Responder a las solicitudes provenientes tanto de los diferentes departamentos de la institución como de instituciones externas.	Sub-Director / Secretaria Ejecutiva /	Elaboración de Oficios a las diferentes Sub-Direcciones, vía Dirección Técnica Adjunto a Gráficos, Medidas, Facturas Cartas Externas, Etc.

		5.2. Recepción y registro de documentos, comunicaciones y expedientes.	Llevar un control de toda la documentación recibida en la Sub-Dirección: comunicaciones, oficios, expedientes, cartas, etc.	Recepcionista	Cuando se recibe una documentación en la Sub-Dirección, de cualquier naturaleza, la recepcionista debe registrarlo en un libro. Los datos a registrar son: el destinatario, asunto y fecha. Si la documentación se trata de un oficio, también debe registrar el número del mismo.
		5.3. Salida de documentos, comunicaciones y expedientes.	Llevar un control de toda la documentación que se despacha en la Sub-Dirección: comunicaciones, oficios, expedientes, cartas, etc. Y asegurar que dicha documentación llegue al lugar donde se dirige.	Recepcionista / Mensajero interno	Cuando se despacha un documento en la Sub-Dirección, de cualquier naturaleza, la recepcionista debe registrarlo en un libro. Los datos a registrar son: el destinatario, asunto y fecha. Si la documentación se trata de un oficio, también debe registrar el número del mismo. Luego, el mensajero interno, debe llevar el documento a su destino final.



6	<b>Archivo de Documentos y Expedientes</b>	6.1. Archivo de los diversos documentos y expedientes de la Sub-Dirección	Archivar los distintos documentos de la Sub-Dirección.	Secretarias auxiliares	Archivar en los lugares correspondientes los diferentes documentos que pertenezcan a la Sub-Dirección, asegurando que haya orden dentro del departamento y los archivos.
7	<b>Elaboración de Dietas y Viáticos</b>	7.1 Tramitación de Dietas y Viáticos	Realizar el reembolso de los gastos incurridos por el Sub-Director, los Coordinadores y los Supervisores en planta durante viajes para la realización de levantamientos, trabajos en campo y puestas en posesión.	Sub-Director / Secretaria Ejecutiva	El personal de la subdirección le suministra a la Secretaria Ejecutiva los datos, facturas y fotos de los viajes realizados, ésta se encarga de llenar el Formulario de Dieta y Viáticos Adjuntando al mismo las Fotos y/o Facturas que avalen lo Solicitado, elaborando un oficio con el cual será tramitada la dieta.
8	<b>Administración de Material Gastable</b>	8.1. Solicitud del material gastable del departamento.	Garantizar que el departamento tenga siempre material gastable disponible.	Secretaria Ejecutiva	La secretaria ejecutiva se encarga de realizar un inventario de los materiales faltantes en el departamento, llena un Formulario Correspondiente y lo Entrega al Departamento Correspondiente Para la

					Entrega de los Materiales solicitados.
9	<b>Tramitación de Vacaciones, Licencias y Permisos</b>	9.1. Solicitud de las vacaciones del personal de la Sub-Dirección.	Tramitar y autorizar las vacaciones del personal de la Sub-Dirección	Sub-Director / Secretaria Ejecutiva	El personal expresa sus intenciones de tomar sus vacaciones y pide la autorización del Sub-Director. Una vez autorizada, la Secretaria Ejecutiva debe llenar el formulario correspondiente, el cual debe ser firmado por el Sub-Director y remitido a Recursos Humanos.



		9.2. Trámite de Licencias Médicas del Personal de la Sub-Dirección	Tramitar las licencias médicas del personal.	Sub-Director / Secretaria Ejecutiva	El empleado en cuestión entrega a la Sub-Dirección un certificado médico en el cual se establece que necesita una licencia médica. La Sub-Dirección se encarga de remitir dicho certificado al Departamento de Recursos Humanos.
		9.3. Trámite de Permisos del Personal de la Sub-Dirección	Tramitar y autorizar los permisos del personal.	Sub-Director / Secretaria Ejecutiva	El personal acude al Sub-Director buscando autorización para un permiso especial. Una vez autorizado, la Secretaria Ejecutiva debe llenar el formulario correspondiente, el cual debe ser firmado por el Sub-Director y remitido a Recursos Humanos.

### 3. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

 <p><b>Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS</b> <small>Transparencia e Igualdad de Oportunidades</small></p>		<b>PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b> <b>AÑO</b>				
SNCC.F.069			Capítulo		0201	
Version: 1.0.0			Sub Capítulo		05	
			Unidad Ejecutora		0001	
Cantidad Procesos Registrados	0		Unidad de Compra		Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	
Monto Estimado Total	RD\$ -		Código de la Unidad de Compra		000140	
			Año Fiscal		2017	
			Fecha Aprobación			
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>		<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
ALIMENTOS Y BEBIDAS	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESTA INSTITUCION	Bienes	Comparacion de Precios		No	

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	13-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50202301	Agua	Unidad	1645	RD\$ 45.00	RD\$ 74,025.00
50193002	Bebidas para infantes	Unidad	602	RD\$ 23.00	RD\$ 13,846.00
90101603	Servicios de cáterin	Unidad	18500	RD\$ 180.00	RD\$ 3,330,000.00
50201714	Cremas no lácteas	Unidad	3	RD\$ 200.00	RD\$ 600.00
50201711	Té instantáneo	Libra	4	RD\$ 300.00	RD\$ 1,200.00
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Libra	45	RD\$ 20.00	RD\$ 900.00
51142610	Cafeína	Paquete	19	RD\$ 19.00	RD\$ 361.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 3,420,932.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
ARTICULO DE LIMPIEZA Y COCINA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COCINA PARA ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD AD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional

	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47121701	Bolsas de basura	Unidad	2000	RD\$ 7.00	RD\$ 14,000.00
47131619	Cabezas de traperos	Unidad	100	RD\$ 175.00	RD\$ 17,500.00
48101909	Teteras o cafeteras para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 1,475.00	RD\$ 1,475.00
52152104	Copas para uso doméstico	Docena	2	RD\$ 3,600.00	RD\$ 7,200.00
41121813	Cubetas	Docena	6	RD\$ 2,265.00	RD\$ 13,590.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	160	RD\$ 120.00	RD\$ 19,200.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 700.00	RD\$ 1,400.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 94.40	RD\$ 1,888.00
47131603	Espojas	Unidad	2100	RD\$ 27.00	RD\$ 56,700.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	1500	RD\$ 6.00	RD\$ 9,000.00
52141502	Hornos microondas para uso doméstico	Unidad	1	RD\$ 7,800.00	RD\$ 7,800.00
53131608	Jabones	Galón	80	RD\$ 188.00	RD\$ 15,040.00
14111704	Papel higiénico	Unidad	82	RD\$ 850.00	RD\$ 69,700.00
47131811	Productos de lavandería	Unidad	2	RD\$ 1,085.00	RD\$ 2,170.00
48101919	Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,800.00	RD\$ 3,800.00

52121703	Paños para lavar	Unidad	100	RD\$ 75.00	RD\$ 7,500.00
14111705	Servilletas de papel	Unidad	23	RD\$ 150.00	RD\$ 3,450.00
47131812	Refrescador de aire	Unidad	8	RD\$ 150.00	RD\$ 1,200.00
10191509	Insecticidas	Unidad	3	RD\$ 200.00	RD\$ 600.00
14111703	Toallas de papel	Unidad	26	RD\$ 300.00	RD\$ 7,800.00
47101605	Químicos de remoción bacteriana	Unidad	7	RD\$ 170.00	RD\$ 1,190.00
53131626	Desinfectante de manos	Unidad	12	RD\$ 200.00	RD\$ 2,400.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 264,603.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
ARTICULOS DEL HOGAR	COMPRA DE ARTICULOS DEL HOGAR PARA ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-02- 2017	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-02- 2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
52141502	Hornos microondas para uso doméstico	Unidad	1	RD\$ 7,800.00	RD\$ 7,800.00
53131608	Jabones	Unidad	10	RD\$ 26.00	RD\$ 260.00

52121701	Toallas de baño	Unidad	3	RD\$ 900.00	RD\$ 2,700.00
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00
52152101	Tazas de café o té para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 75.00	RD\$ 225.00
52141526	Cafeteras para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 750.00	RD\$ 2,250.00
52141802	Calentadores de espacios para uso doméstico	Unidad	4	RD\$ 1,800.00	RD\$ 7,200.00
48101915	Bandejas para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 350.00	RD\$ 350.00
52152104	Copas para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 90.00	RD\$ 270.00
52152103	Tazones ("mugs") para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 450.00	RD\$ 1,350.00
41121813	Cubetas	Unidad	3	RD\$ 300.00	RD\$ 900.00
52152002	Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico	Unidad	3	RD\$ 318.00	RD\$ 954.00
52152004	Platos para uso doméstico	Unidad	2	RD\$ 700.00	RD\$ 1,400.00
48101710	Fuentes o contenedores de burbujeo de bebidas	Unidad	1	RD\$ 11,000.00	RD\$ 11,000.00
52152008	Teteras o cafeteras para uso doméstico	Unidad	1	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
48101902	Cubertería para servicio de comidas	Unidad	1	RD\$ 3,700.00	RD\$ 3,700.00
52151709	Set de cubiertos	Unidad	6	RD\$ 300.00	RD\$ 1,800.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	25	RD\$ 850.00	RD\$ 21,250.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	1	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00
52152202	Escurreidor de platos	Unidad	1	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00
52121604	Manteles	Unidad	2	RD\$ 250.00	RD\$ 500.00

52151606	Tablas para cortar para uso doméstico	Unidad	1	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,000.00
52121704	Toallas de manos	Unidad	2	RD\$ 290.00	RD\$ 580.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 70,749.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMPRA DE TICKETS PREPAGADOS DE COMBUSTIBLE	Bienes	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-02-2017	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
15101505	Combustible diesel	Unidad	7827	RD\$ 118.00	RD\$ 923,586.00
15101506	Gasolina	Unidad	4746	RD\$ 800.00	RD\$ 3,796,800.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 4,720,386.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
COMPONENTES DE VEHICULOS	COMPRA BATERIAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	Sí	

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	22-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	10	RD\$ 5,900.00	RD\$ 59,000.00
25171901	Rines o ruedas para automóviles	Unidad	4	RD\$ 4,484.00	RD\$ 17,936.00
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	45	RD\$ 7,000.00	RD\$ 315,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 391,936.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS O REMODELACIONES	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	13-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO



72101903	Carpintería o chapistería de acabados	Unidad	1	RD\$ 200,000.00	RD\$ 200,000.00
30111601	Cemento	Unidad	85	RD\$ 300.00	RD\$ 25,500.00
80111613	Trabajadores manuales temporales	Unidad	1	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00
31162307	Placas de montaje	Unidad	1	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00
78141501	Servicios de expedidores de fletes	Unidad	1	RD\$ 7,000.00	RD\$ 7,000.00
71101502	Sondeos de exploración o extracción de testigos	Unidad	1	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00
81151604	Agrimensura	Unidad	1	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00
30102403	Varillas de hierro	Unidad	8	RD\$ 2,891.00	RD\$ 23,128.00
41111616	Ruedas medidoras para distancias	Unidad	8	RD\$ 2,000.00	RD\$ 16,000.00
41114201	Cintas medidoras	Unidad	8	RD\$ 450.00	RD\$ 3,600.00
46181507	Chalecos de seguridad	Unidad	21	RD\$ 500.00	RD\$ 10,500.00
46181701	Cascos	Unidad	19	RD\$ 450.00	RD\$ 8,550.00
41111613	Metros de distancia	Unidad	3	RD\$ 3,500.00	RD\$ 10,500.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	1	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 494,778.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
<b>FERRETERIA Y PINTURA</b>	<b>COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUMPLIR NECESIDADES</b>	Bienes	Compras Menores	No	

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-03-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06-03-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26121520	Alambre de cobre-acero	Libra	50	RD\$ 58.00	RD\$ 2,900.00
31152001	Alambre de navaja	Unidad	3	RD\$ 1,000.00	RD\$ 3,000.00
26121523	Alambre forrado pero no aislado	Pie	300	RD\$ 11.00	RD\$ 3,300.00
31231105	Cobre en barra labrada	Unidad	2	RD\$ 320.00	RD\$ 640.00
40141914	Conductos o red de conductos de plástico	Unidad	50	RD\$ 8.00	RD\$ 400.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	25	RD\$ 9.00	RD\$ 225.00
41121813	Cubetas	Unidad	16	RD\$ 5,000.00	RD\$ 80,000.00
31211803	Diluyentes para pinturas y barnices	Galón	6	RD\$ 335.00	RD\$ 2,010.00
31211508	Pinturas acrílicas	Galón	7	RD\$ 500.00	RD\$ 3,500.00
39121009	Reguladores eléctricos o de potencia	Unidad	1	RD\$ 483.00	RD\$ 483.00
39121520	Relés de sobrecarga	Unidad	20	RD\$ 850.00	RD\$ 17,000.00
78141501	Servicios de expedidores de fletes	Unidad	2	RD\$ 40,000.00	RD\$ 80,000.00
23153501	Sistemas de aplicación de pintura	Unidad	2	RD\$ 166.00	RD\$ 332.00
24141701	Tubos o núcleos de papel	Unidad	55	RD\$ 375.00	RD\$ 20,625.00

31161725	Tuercas abrazaderas	Unidad	15	RD\$ 13.00	RD\$ 195.00
27113201	Conjuntos generales de herramientas	Unidad	1	RD\$ 240.00	RD\$ 240.00
41113601	Amperímetros	Unidad	1	RD\$ 14,000.00	RD\$ 14,000.00
30151703	Canaletas	Unidad	6	RD\$ 177.00	RD\$ 1,062.00
40151607	Compresores refrigerantes	Unidad	2	RD\$ 20,000.00	RD\$ 40,000.00
39121529	Contactores	Unidad	30	RD\$ 324.00	RD\$ 9,720.00
30181506	Orinales	Unidad	4	RD\$ 10,000.00	RD\$ 40,000.00
30181511	Inodoros o excusados	Unidad	1	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00
27111701	Destornilladores	Unidad	1	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00
40151721	Partes de repuesto para bombas de agua	Unidad	2	RD\$ 400.00	RD\$ 800.00
39101610	Lámparas de filamento	Unidad	2	RD\$ 500.00	RD\$ 1,000.00
30181504	Lavamanos	Unidad	1	RD\$ 1,800.00	RD\$ 1,800.00
40141638	Válvulas alternadoras	Unidad	2	RD\$ 100.00	RD\$ 200.00
31161606	Cerrojos de puerta	Unidad	1	RD\$ 590.00	RD\$ 590.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	2	RD\$ 377.00	RD\$ 754.00
46181701	Cascos	Unidad	6	RD\$ 500.00	RD\$ 3,000.00
39111810	Interruptor de lámpara	Unidad	8	RD\$ 100.00	RD\$ 800.00
13101709	Fluorosilicona fvmq	Unidad	10	RD\$ 375.00	RD\$ 3,750.00
47101523	Tanques de recolección	Unidad	1	RD\$ 17,000.00	RD\$ 17,000.00

24111810	Tanques de almacenamiento de agua	Unidad	1	RD\$ 7,000.00	RD\$ 7,000.00
13111016	Polietileno	Unidad	24	RD\$ 13.00	RD\$ 312.00
31161503	Clavo-tornillo	Unidad	100	RD\$ 1.00	RD\$ 100.00
39121001	Transformadores de distribución de potencia	Unidad	50	RD\$ 900.00	RD\$ 45,000.00
30102401	Varillas de aleación ferrosa	Unidad	5	RD\$ 30.00	RD\$ 150.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 413,888.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
<b>IMPRESA Y PUBLICACIONES</b>	<b>SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL</b>	Servicios	Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	Sí	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	08-02-2017	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	<b>Región</b>	<b>OZAMA O METROPOLITANA</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	1		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	10-02-2017		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	1		<b>Distrito Municipal</b>	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
55101519	Publicaciones periódicas	Día	9	RD\$ 40,000.00	RD\$ 360,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
INFORMATICA	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA LA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26111701	Baterías recargables	Unidad	29	RD\$ 2,700.00	RD\$ 78,300.00
45121504	Cámaras digitales	Unidad	4	RD\$ 6,300.00	RD\$ 25,200.00
44101501	Fotocopiadoras	Unidad	8	RD\$ 10,000.00	RD\$ 80,000.00
39121011	Fuentes ininterrumpibles de potencia	Unidad	6	RD\$ 1,800.00	RD\$ 10,800.00
44101503	Máquinas multifuncionales	Unidad	1	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00
43211509	Computadores de tableta	Unidad	1	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	260	RD\$ 1,500.00	RD\$ 390,000.00
39121409	Conectores de cables eléctricos	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
43211508	Computadores personales	Unidad	2	RD\$ 50,000.00	RD\$ 100,000.00
39121402	Enchufes eléctricos	Unidad	20	RD\$ 85.00	RD\$ 1,700.00
26121609	Cable de redes	Unidad	20	RD\$ 280.00	RD\$ 5,600.00

				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 792,600.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	Servicios	Excepción - Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180102	Reparación de Transmisión	Unidad	22	RD\$ 4,000.00	RD\$ 88,000.00
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Unidad	24	RD\$ 3,500.00	RD\$ 84,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	47	RD\$ 13,000.00	RD\$ 611,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 783,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
QUIMICO/GASES	SERVICIO DE EXTERMINACION DE PLAGAS	Servicios	Compras por debajo del Umbral	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-02-2017	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA

	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>03-02-2017</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Distrito Municipal</b>	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	1	RD\$ 68,400.00	RD\$ 68,400.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 68,400.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>	<b>DESTINADO A MIPYMES</b>	<b>CÓDIGO SNIP</b>
SUMINISTRO DE OFICINA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	No	
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	<b>06-02-2017</b>	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>	<b>Región</b>	<b>OZAMA O METROPOLITANA</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Provincia</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN</b>	<b>09-02-2017</b>		<b>Municipio</b>	<b>Distrito Nacional</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>		<b>Distrito Municipal</b>	
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	<b>ARTÍCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL ESTIMADA</b>	<b>PRECIO UNITARIO ESTIMADO</b>	<b>MONTO TOTAL ESTIMADO</b>
44103504	Alambres o espirales de encuadernación	Unidad	800	RD\$ 10.00	RD\$ 8,000.00
44122011	Folders	Unidad	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
44103101	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras	Unidad	1	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00

44122104	Clips para papel	Unidad	700	RD\$ 35.00	RD\$ 24,500.00
43201809	Disco compacto cd de lectura y escritura	Unidad	150	RD\$ 41.00	RD\$ 6,150.00
43201811	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura	Unidad	200	RD\$ 55.00	RD\$ 11,000.00
44122101	Cauchos	Unidad	100	RD\$ 31.00	RD\$ 3,100.00
44121615	Grapadoras	Unidad	75	RD\$ 280.00	RD\$ 21,000.00
44121622	Humidificadores	Unidad	50	RD\$ 66.00	RD\$ 3,300.00
14111531	Papel libros o cuadernos para bitácoras	Unidad	100	RD\$ 295.00	RD\$ 29,500.00
14111530	Papel de notas autoadhesivas	Unidad	450	RD\$ 50.00	RD\$ 22,500.00
14111511	Papel de escritura	Resma	700	RD\$ 177.00	RD\$ 123,900.00
44122026	Garras para papel	Unidad	50	RD\$ 37.00	RD\$ 1,850.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	22	RD\$ 2,500.00	RD\$ 55,000.00
14111805	Cheques o chequeras	Unidad	130	RD\$ 100.00	RD\$ 13,000.00
14111511	Papel de escritura	Unidad	100	RD\$ 500.00	RD\$ 50,000.00
44121506	Sobres estándar	Unidad	2500	RD\$ 10.00	RD\$ 25,000.00
44122015	Respaldos para archivos	Unidad	200	RD\$ 340.00	RD\$ 68,000.00
44122114	Postes roscados	Unidad	400	RD\$ 30.00	RD\$ 12,000.00
44111516	Organizadores personales	Unidad	300	RD\$ 300.00	RD\$ 90,000.00
47131706	Dispensadores de ambientadores	Unidad	10	RD\$ 600.00	RD\$ 6,000.00
14111514	Blocs o cuadernos de papel	Unidad	407	RD\$ 200.00	RD\$ 81,400.00



44101801	Calculadoras o accesorios	Unidad	8	RD\$ 3,000.00	RD\$ 24,000.00
31201505	Cinta doble faz	Unidad	3	RD\$ 800.00	RD\$ 2,400.00
39111507	Artefactos de escritorio	Unidad	1	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00
44121701	Bolígrafos	Unidad	5	RD\$ 900.00	RD\$ 4,500.00
45121619	Billeteras para "picture card"	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
26111702	Pilas alcalinas	Unidad	5	RD\$ 600.00	RD\$ 3,000.00
44122023	Tabletas gráficas para arquitectura	Unidad	1	RD\$ 300.00	RD\$ 300.00
44121619	Tajalápices manuales	Unidad	6	RD\$ 18.00	RD\$ 108.00
44111521	Sujetadores de copias	Unidad	7	RD\$ 2,000.00	RD\$ 14,000.00
44121507	Sobres de catálogos o de gancho	Unidad	1	RD\$ 350.00	RD\$ 350.00
44121506	Sobres estándar	Unidad	3	RD\$ 1,700.00	RD\$ 5,100.00
14111514	Blocs o cuadernos de papel	Unidad	1000	RD\$ 7.00	RD\$ 7,000.00
14111604	Tarjetas de presentación	Unidad	1000	RD\$ 6.00	RD\$ 6,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 801,458.00
<b>NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN</b>	<b>FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN</b>	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>		<b>DESTINADO A MIPYMES</b>
<b>AUDIOVISUALES</b>	<b>SERVICIO RENTA DE SONIDO, LUCES Y PLANTA ELECTRICA</b>	<b>Servicios</b>	<b>Compras Menores</b>		<b>No</b>
<b>FECHA DE NECESIDAD</b>	<b>FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA</b>	<b>13-02-2017</b>	<b>LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA</b>		<b>Región</b>
	<b>TRIMESTRE</b>	<b>1</b>			<b>Provincia</b>
					<b>OZAMA O METROPOLITANA</b>
					<b>Distrito Nacional</b>

	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-02-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141902	Reuniones y eventos	Unidad	1	RD\$ 35,000.00	RD\$ 35,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 35,000.00

## **D. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS**

A solicitud de los contratistas, relacionados a proyectos detallados a continuación, se realizó un levantamiento de las obras asignadas por la Dirección General. En dichas evaluaciones, se confirma, en campo conjuntamente con el contratista los volúmenes ejecutados. En relación con el monto pagado al contratista se establece la nueva situación financiera.

Concluyendo con el cuadro de RELACIÓN DE PROYECTOS EVALUADOS 2017, se realiza una proyección financiera de la situación del contratista con la OISOE y viceversa. En dicho cuadro se evidencia a través de los levantamientos mencionados el ahorro a favor de la OISOE de un monto total de **RD\$ 3, 865,539,333.45**, dejando un monto adeudado por los contratistas de **RD\$2,183,079,077.45**



## RELACIÓN PROYECTOS EVALUADOS EN EL 2017

DESCRIPCIÓN PROYECTO	MONTO CONTRATO (RD\$)	MONTO TOTAL PAGADO (RD\$)	SITUACIÓN CONTRATISTA PRE-EVALUACIÓN (RD\$)	REALIDAD FINANCIERA EN CAMPO DESPUÉS DE EVALUACIÓN (RD\$)	DIFERENCIA ENTRE PRE-EVALUACIÓN Y REALIDAD EN CAMPO POST EVALUACIÓN (RD\$)	SITUACIÓN CONTRATISTA ACTUALIZADA (RD\$)	ESTATUS LEVANTAMIENTO
Segunda etapa de terminación para la construcción Comprensivo del Cáncer Dr. Heriberto Pieter / Rosa Emilia Tavarez, D.N.	1,213,147,047.89	1,168,059,958.43	36,860,854.50	731,525,128.11	473,395,684.82	-436,534,830.32	T
Terminación construcción Centro de Comprensión del Cáncer Dr. Heriberto Pieter / Rosa Emilia	849,746,786.64	843,542,004.17	0	643,554,208.55	199,987,795.62	-199,987,795.62	

Tavarez, (UASD – Sede Central), Distrito Nacional.							
Remodelación del Palacio de Bellas Artes, Distrito Nacional .	1,121,431,320.95	724,877,553.01	32,273,894.47	720,559,832.20	36,591,615.28	-4,317,720.81	T - C
Colocación de pisos de granito importados negro absolut en el Auditorium Biblioteca del CURO UASD, San Juan de la Maguana.	10,064,250.32	8,021,423.45	0	7,204,056.40	-817,367.05	-817,367.05	T
Colocación de pisos de granito importados negro absolut en el Auditorium Bellas Artes, Prov. San Juan.	3,072,335.69	2,723,020.21	143,316.85	2,807,551.75	58,785.31	84,531.54	

Terminación planta física, Módulo D, Hospital Regional de la Diabetes y Nutrición, San Juan de la Maguana.	33,705,473.54	27,442,438.94	3,904,063.98	16,151,274.83	15,195,228.09	-11,291,164.11	T
Terminación 2da. Etapa para la puesta en marcha del CURSO – UASD, Barahona.	48,757,381.50	43,320,407.30	2,280,021.44	40,869,366.27	4,731,062.47	-2,451,041.03	T
Terminación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.	60,840,045.89	49,847,843.15	-16,036,973.76	32,150,129.14	1,660,740.25	-17,697,714.01	T - C
Reparación del Club Coanca, Sector del Cacique, Club y Parque del Sector Brisas del Mar, Distrito Nacional.	23,342,429.80	22,743,991.25	0	0	0	0	T

Revestimiento, climatización e instalación de gases, Hospital Regional de la Diabetes y Nutrición, San Juan de la Maguana.	35,753,264.52	33,686,072.71	1,684,303.64	4,913,575.70	28,772,497.01	-27,088,193.37	T
Terminación Planta Física Módulo C del Hospital Regional de la Diabetes y Nutrición, Prov. San Juan de la Maguana.	16,890,887.07	15,202,989.11	800,157.33	13,364,416.96	2,638,729.48	-1,838,572.15	T
Reforzamiento estructural, Remodelación y Equipamiento del Hospital Regional Universitario José María Cabral y	2,505,630,698.93	1,872,148,340.84	91,136,272.28	1,502,667,677.47	460,616,935.65	-369,480,663.37	T - C



Bález, Santiago							
Construcción de las Calles Poblado de la Barranca, Noria Vieja, Los Fundos de Barranca y Los Rincones, Prov. San Juan de la Maguana, Rep. Dom.	40,975,160.67	28,746,926.12	23,937,658.77	38,202,253.72	894,254.90	9,455,327.60	T - C
Construcción Centro Comprensivo de Cáncer Dr. Heriberto Pieter/ Rosa Emilia Tavarez, (UASD – SEDE CENTRAL), Santo Domingo, D.N.	1,728,731,475.39	901,497,334.63	-216,217,771.11	680,711,451.80	4,568,111.72	-220,785,882.83	T - C

Construcción de Obras Exteriores, Calles, Aceras y Contenes del Barrio Los Platanitos, Prov. Santiago, R.D.	84,380,295.92	36,500,000.00	43,559,360.13	66,658,454.00	13,400,906.13	30,158,454.00	T - C
Construcción del Edificio de Laboratorio y Aulas Virtuales Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO-UASD), Barahona.	242,772,568.54	132,412,385.64	8,485,814.41	140,898,200.05	0.00	8,485,814.41	T - C
Construcción Módulo Biblioteca Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO-UASD), Barahona	125,768,479.29	85,689,993.87	4,509,999.68	90,199,993.55	0.00	4,509,999.68	

Construcción Áreas Administrativas Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO-UASD), Barahona	55,891,287.23	34,429,592.16	8,419,989.65	42,849,581.81	0.00	8,419,989.65	
Terminación de los servicios urbanización y puente mercado Santo Domingo (Sistema de agua Pluvial, Agua potable, aguas negras, sistema de baldeo, desarenador, digestor de cámara séptica y electrificación) Urb. Mercado	2,681,588,660.54	1,803,345,101.75	725,222,640.02	1,756,302,536.90	772,265,204.87	-47,042,564.85	T

Santo Domingo.							
Construcción Carretera Gregorio Luperón, Costa Norte, Provincia Puerto Plata	1,039,153,434.74	0	134,682,844.37	30,145,878.98	104,536,965.39	30,145,878.98	T
Construcción del Comedor Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Sede Central, D.N.	917,668,395.62	763,933,743.70	0	528,562,367.13	235,371,376.57	-235,371,376.57	T - C
Construcción de Campo de Polo I Hipódromo Las Américas, Santo	50,685,128.88	47,286,314.93	2,246,070.61	40,254,911.71	9,277,473.83	-7,031,403.22	T

Domingo, R.D.							
Terminación de la construcción de la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).	1,021,410,785.05	892,159,078.58	46,924,162.03	786,757,115.62	152,326,124.99	-105,401,962.96	T - C
Terminación de Electrificación Exterior e Iluminación Interior, Infraestructura Tecnológica.	516,031,121.25	420,294,488.77	95,517,712.75	449,086,734.57	66,725,466.95	28,792,245.80	T - C
Remodelación Diseño interior de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D.	45,877,050.29	14,175,410.05	-10,613,459.86	3,561,950.19	0.00	-10,613,459.86	T

<p>Construcción y Reconstrucción De Calles, Aceras y Contenes De Los Barrios : Bayacanes, Los Cayucos, Las Flores, Los Altagracianos y El Centro Urbano De Pedernales, Prov. Pedernales, R. D.</p>	408,045,646.27	139,047,276.01	268,989,880.51	301,403,911.20	106,633,245.32	162,356,635.19	T
<p>Construcción del Edificio de Parqueos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Sede Central, D.N.</p>	970,173,157.46	692,583,501.50	4,092,787.56	521,898,369.03	174,777,920.03	-170,685,132.47	T

Rehabilitación de Camino La Ceiba – Reventón (Tramo II), en el Municipio Santo Domingo Norte, Prov. Santo Domingo.	68,292,505.56	62,136,331.61	307,352.22	22,242,953.00	40,200,730.83	-39,893,378.61	T
Rehabilitación de Camino La Ceiba – Reventón (Tramo II), en el Municipio Santo Domingo Norte, Prov. Santo Domingo.	55,912,985.92	0	54,205,719.17	27,515,317.65	26,690,401.52	27,515,317.65	
Terminación Revest, Climatización e Instalación de Gases, 2da. Etapa Terminación	20,922,182.12	13,975,615.17	5,307,142.24	15,878,624.05	3,404,133.36	1,903,008.88	T

Planta Física Módulo "C" del Regional de la Diabetes y Nutrición, Prov. San Juan de la Maguana.							
Suministro y Equipamiento o Hospital de la Diabetes, Provincia San Juan de la Maguana.	160,488,367.28	97,397,672.91	58,990,054.81	60,836,702.19	95,551,025.53	-36,560,970.72	T
Remodelación, Adecuación de Espacios y Equipamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, Santo Domingo Este, Provincia	1,699,654,043.76	1,610,616,447.92	84,769,286.73	1,565,573,330.02	129,812,404.63	-45,043,117.90	T



Santo Domingo							
Reparación de distintas instalaciones Publicas en la Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional.	54,147,665.76	49,454,764.26	14,420,379.72	28,669,291.13	23,388,355.46	-20,785,473.13	T
Remozamiento y Mantenimiento de las Áreas Interiores y Exteriores de los Edificios del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), Instituto Postal Dominicano (IMPOSDO)	54,893,957.33	54,830,425.40	760,836.90	34,417,675.51	20,412,749.89	-19,651,912.99	T

M), Ministerio de Relaciones Exteriores y el Hospital de la Mujer Dominicana, R.D.							
Sistema de Residuos, Tratamiento de Agua Potable, Sistema de Caldera, Señalización Interior y Exterior, Bumpers, Revestimien to de Área de Imágenes	140,426,583.75	133,101,710.29	7,005,353.17	96,192,773.71	43,914,289.75	-36,908,936.58	T
Instalaciones sanitarias e Instalación Eléctrica, Tratamiento Térmico, Adecuación y Equipamien to del Comedor de	256,937,981.50	253,190,181.92	0	180,001,141.75	73,189,040.17	-73,189,040.17	T

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, SEDE CENTRAL,							
Ejecutar Trabajos de el Bunkers, en la Construcción del Centro Compresivo del Cáncer, Dr. Heriberto Pieter	131,373,398.66	122,545,732.70	197,296.71	98,287.05	122,644,742.36	-122,447,445.65	T
Revestimiento de Plomo en la Construcción del Centro Compresivo del Cáncer, Dr. Heriberto Pieter	426,772,802.82	398,736,633.31	0	112,512,761.87	286,223,871.44	-286,223,871.44	T
Suministro y colocación de Puertas Especiales Revestimiento	39,692,078.90	35,417,141.17	1,864,060.06	35,254,327.22	2,026,874.01	-162,813.95	T

to Aséptico Quirófano en el Centro Comprensivo del Cáncer							
Terminación Edificio Comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD – CEDE – CENTRAL) Distrito Nacional	298,882,636.61	277,241,917.36	14,591,679.86	197,421,200.57	94,412,396.65	79,820,716.79	T
Reconstrucción y Remodelación de las Instalaciones Estructurales de la base Naval Las Calderas, Marina de Guerra.	161,768,416.43	113,967,401.89	14,636,368.34	88,544,210.01	40,059,560.22	-25,423,191.88	T
<b>TOTAL</b>	<b>19,421,700,176.28</b>	<b>14,026,329,166.19</b>	<b>1,549,859,130.18</b>	<b>11,658,419,523.37</b>	<b>3,865,539,333.45</b>	<b>-2,183,079,077.45</b>	

## **V. GESTIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN**

## **A. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN**

### **PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)**

#### **1- Avances en el PNPSP y en la END:**

La OISOE como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría, de infraestructura, podemos identificar que según la naturaleza de las actividades que realiza la misma, sus aportes se orientan dentro del Segundo y Tercer Eje de la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030, que procura “una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda digna y Servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la Pobreza y la desigualdad social y territorial” y “una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

## 2- Análisis del Cumplimiento de la END

<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>	<b>PRODUCTO</b>		<b>CANTIDAD OBRAS</b>
<b>END</b>	<b>PROGRAMA</b>		
3.3.6	11	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	16
3.3.6	12	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	13
3.3.6	20	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	6
2.2.1	15	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD	88
3.3.3	16	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1
2.6.1		PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	4
2.6.1	17	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS RELIGIOSOS	10
2.7.1		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1
2.6.1	19	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA RECREACIÓN Y CULTURA	2
2.3.2		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCIÓN COMUNITARIA	11
2.5.1	21	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	2
1.1.1	22	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS INSTITUCIONES	4

**3. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA  
ENERO-DICIEMBRE 2017**



## COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2017

PRODUCCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2016	PRODUCCIÓN PLANEADA 2017	PRODUCCIÓN GENERADA ENE-DIC 2017	% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN - LA DESCUBIERTA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA BAHORUCO	Km	RD\$ -	0.00	100,000,000.00	—
RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMA II	Km	RD\$ -	0.00	2,978,476.59	—
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO-LOS MOTONCITOS-LOS FRÍOS-TRAMO I-IV (DESDE EST. 0+00 HASTA EST. 12+430) Y SEÑALIZACIÓN GENERAL.,	Km	RD\$ -	0.00	8,917,003.43	—
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO-LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	Km	RD\$ -	0.00	34,521,119.89	—

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS	Km	RD\$ -	0.00	162,464,861.08	—
SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY-LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLÓN, CARRETERA LAS CHARCAS-LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN DE LA MAGUANA	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MAGUACA - EL LIMÓN-LOMA GALLINA, LA CUEVA-ZAMBRANA-EL COROZO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, R.D.	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN VÍCTOR- AMACEYES	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA AMACEYES- CARLOS DÍAZ	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL PERÚ	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO	Km	RD\$ -	0.00	0.00	—
REPARACIÓN PLAY, BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA DE BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	M2	RD\$ -	0.00	496,825.91	—
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO-JUNCALITO	Km	RD\$ 42,724,559.07		90,649,493.68	—
RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL BARRIO JUAN BOSCH, LA HERRADURA	Km	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO	Km	RD\$ -		153,102,586.10	—

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	Km	RD\$ -	0.00	10,000,000.00	—
CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VUELTA AL LAGO (BARAHONA-CABRAL-DUVERGÉ-JIMANÍ-LA DESCUBIERTA-PORTER RIO-VILLA JARAGUA, NEYBA, HASTA CRUCE DEL ABANICO)	Km	RD\$ 116,330,852.49	0.00	53,278,529.35	—
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ.	Km	RD\$ 197,884,820.53	0.00		—
RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN	Km	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—

LA PROV. PROVINCIA SAN JUAN					
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.	Mt	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO	Mt	RD\$ 3,593,088.91	0.00	3,254,652.96	—
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA	Mt²	RD\$ -	0.00	1,399,299.08	—
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
ASFALTADO DE CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CTC YERBA BUENA, JARABACOA	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 1,305,323.58	—
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE	Mt²		0.00	RD\$ 914,655.40	—

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE	Mt²	RD\$ 674,962.84	0.00	RD\$ 140,589.81	—
EQUIPAMIENTO Y ASFALTADO CALLES DEL MULTIUSO DE SAJOMA	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) IMBERT	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 2,399,790.57	—
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTE LLANO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 625,708.27	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PARTE ELÉCTRICO EXTERIOR Y ADECUACIÓN PARA EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 1,032,312.65	—
HABITACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA	Mt²	RD\$ 48,542,535.15	0.00	42,785,843.96	—

REPARACIÓN TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN EL POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA	Mt²	RD\$ 8,229,780.39	0.00	RD\$ -	—
IMPERMEABILIZANTE EN EL HOSPITAL DE BAITOA, HOSPITAL HATO DEL YAQUE, HOSPITAL CIEN FUEGO, HOSPITAL BELLA VISTA Y EL ENSANCHE ESPAILLAT, ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ARTURO GRULLÓN, IMPERMEABILIZANTE HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, SANTIAGO. GOBERNACIÓN DE SANTIAGO, REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS PROV. SANTIAGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	KM	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO, PROYECTO LA NUEVA BARQUITA.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—



REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA REVENTÓN ( TRAMO I ) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA, R. D.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN ISLETAS CENTRALES Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA S CALLES 26 DE ENERO Y EDUARDO BRITO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, RESPALDO OZAMA, FERNANDO DE NAVARRETE ( LOS MINAS), HORACIO ORTIZ ALVAREZ, CALLE GREGORIO GARCÍA CASTRO ( SECTOR KATANGA), Y LOS SECTORES : LA ENFERMERÍA, ETC.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALÓN PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—

MUSEOGRAFÍA DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL, D.N.					
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMÉRICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACIÓN	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN PARROQUIAL EL BUEN PASTOR, ENSANCHE EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA TERMINACIÓN CONST. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA, SABANA PERDIDA, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—

RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN CASA DE ORACIONES	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN.	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—

IMPERMEABILIZACIÓN TECHO RESIDENCIA PARROQUIAL, TECHO DE ESCALERA Y CÚPULA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE	Mt²	RD\$ 37,661,962.62		19,471,662.68	—
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—
IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -		RD\$ -	—

RECONTÓ. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCÍA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACIÓN, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—

CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO(CALLES DE VALLE DEL ESTE).	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTÓN (TRAMO II), EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN GUANERAS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D.	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CONSTRUCCIÓN ESCALINATA PICA SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO	Mt²	RD\$ 15,393,969.00	15,560,000.00	RD\$ 5,448,879.05	35.02%
SUBCENTRO DE ENGOMBE	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 30,066,126.74	3006.61%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO	Mt²	RD\$ 13,393,969.00	15,560,000.00	RD\$ 23,317,524.61	149.86%



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	Km	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ 3,837,350.67	24.66%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVÁREZ JUSTO, LOS SALADOS	Km	RD\$ 12,000,000.00	15,560,000.00	RD\$ 7,682,009.79	49.37%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	Km	RD\$ 14,353,356.19	15,560,000.00	RD\$ -	—
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	Km	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ -	—
HOSPITAL DE JÁNICO	Km	RD\$ 29,064,000.00	36,111,112.00	RD\$ 36,998,342.40	102.46%
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO	Km	RD\$ 745,204,234.95	210,571,623.00	RD\$ 10,528,581.00	5.00%
MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y PARTOS H. U. JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ -	—
HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ -	—
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 39,338,234.21	3933.82%

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	Mt²	RD\$ 8,126,568.04	15,560,000.00	RD\$ 21,197,905.54	136.23%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA	Mt²	RD\$ 15,022,026.87	15,560,000.00	RD\$ 835,757.91	5.37%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND	Mt²	RD\$ 14,725,837.97	15,560,000.00	RD\$ 414,756.61	2.67%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	Mt131	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ -	—
MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA	Mt²	RD\$ 42,032,123.00	22,076,024.00	RD\$ 203,664,270.44	922.56%
HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 48,709,197.90	4870.92%
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	Mt²	RD\$ 48,035,088.00	16,959,064.00	RD\$ 217,060,254.52	1279.91%
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	Mt²	RD\$ 10,000,000.00	11,111,112.00	RD\$ 342,749,610.11	3084.75%
HOSPITAL DR. VINICIO CALVEN TI, LOS ALCARRIZOS	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 75,924,473.58	7592.45%
HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	Mt²	RD\$ -	260,000,000.00	RD\$ 189,244,350.64	72.79%

CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO	Mt²	RD\$ 1,877,074,156.52	2,500,000,000.00	RD\$ 500,000,000.00	2—
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRÓN EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 179,396,635.74	—
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRÓN EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	Mt²	RD\$ -	0.00	RD\$ 103,098,409.68	—
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO	Mt²	RD\$ 23,659,960.66	15,560,000.00	RD\$ 17,555,766.25	112.83%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ	Mt²	RD\$ 12,307,611.08	15,560,000.00	RD\$ -	—
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 65,976,705.89	1263.38%
HOSPITAL DR. JAIME MOTA	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 56,486,778.15	1081.66%

HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 22,188,094.60	424.88%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	Mt²	RD\$ 23,195,073.39	15,560,000.00	RD\$ -	—
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO	Mt²	RD\$ 23,859,235.23	15,560,000.00	RD\$ 8,617,883.70	55.38%
HOSPITAL DE MANZANILLO	Mt²	RD\$ -	98,000,000.00	RD\$ 121,537,459.39	124.02%
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 84,421,648.06	1616.58%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA	Mt²	RD\$ 15,560,000.00	15,560,000.00	RD\$ 18,311,905.54	117.69%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA	Mt²	RD\$ 19,780,720.00	15,560,000.00	RD\$ 6,771,793.40	43.52%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN	Mt²	RD\$ 19,809,983.91	15,560,000.00	RD\$ 2,137,878.44	13.74%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	Mt²	RD\$ 4,000,000.00	15,560,000.00	RD\$ 386,101.93	2.48%
HOSPITAL DE BARSEQUILLO	Mt²	RD\$ 24,794,770.00	14,467,836.00	RD\$ 46,392,023.09	320.66%
EMERGENCIA 911, HOSPITAL JACINTO MAÑÓN	Mt²	RD\$ -	14,035,087.72	RD\$ -	—

HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 30,849,897.14	16,111,112.00	RD\$ 128,753,420.54	799.16%
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	16,111,112.00	RD\$ 75,783,100.90	470.38%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 13,393,969.00	15,560,000.00	RD\$ 10,501,153.99	67.49%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	23,600,000.00	RD\$ 16,572,826.78	70.22%
HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	1,226,588.00	RD\$ 358,393,153.84	29218.71%
HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	3,916,666.00	RD\$ 117,995,530.42	3012.65%
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	3,916,666.00	RD\$ 731,954.62	18.69%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO	Mt <sup>2</sup>	RD\$ 20,627,511.22	15,560,000.00	RD\$ 5,850,255.72	37.60%
HOSPITAL SIGFRIDO ALBA DOMÍNGUEZ, FANTINO, COTUÍ	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 101,367,626.34	1941.08%
HOSPITAL VILLA LA MATA	Mt <sup>2</sup>	RD\$ -	2,532,164.00	RD\$ 90,139,755.80	3559.79%

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUÍ	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 93,992,054.79	1799.85%
HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 99,344,851.72	9934.49%
HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA	Mt²	RD\$ 33,698,036.46	13,536,608.00	RD\$ 88,785,748.40	655.89%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS	Mt²	RD\$ 12,099,960.65	15,560,000.00	7,946,007.63	51.07%
HOSPITAL DE CASTILLO	Mt²	RD\$ 36,000,000.00	36,111,112.00	RD\$ 78,431,541.39	217.20%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	Mt²	RD\$ 20,185,917.01	15,560,000.00	RD\$ 16,503,973.81	106.07%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	Mt²	RD\$ 14,690,121.24	15,560,000.00	RD\$ 1,601,342.00	10.29%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	Mt²	RD\$ 19,582,660.28	15,560,000.00	RD\$ 1,923,546.00	12.36%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN	Mt²	RD\$ 23,560,000.00	15,560,000.00	RD\$ 8,695,821.00	55.89%
HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO	Mt²	RD\$ 34,035,088.00	4,994,152.00	RD\$ 58,892,798.99	1179.24%
HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL	Mt²	RD\$ 37,035,088.00	36,111,112.00	RD\$ 5,871,444.11	16.26%

HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	Mt131	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 37,095,888.51	3709.59%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA	Mt²	RD\$ 23,359,545.39	15,560,000.00	RD\$ -	—
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	Mt²	RD\$ -	5,143,274.00	RD\$ 95,830,279.36	1863.22%
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMAO AL NORTE	Mt²	RD\$ -	7,833,334.00	RD\$ 24,691,851.51	315.22%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI	Mt²	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ 6,631,813.89	42.62%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ	Mt²	RD\$ 18,504,365.23	15,560,000.00	RD\$ 10,334,182.99	66.42%
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	Mt²	RD\$ -	7,833,334.00	RD\$ 83,179,281.87	1061.86%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HATO MAYOR	Mt²	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ 20,627,146.00	132.57%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	Mt²	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ 10,046,882.30	64.57%
HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	Mt²	RD\$ -	24,504,289.00	RD\$ 43,804,679.00	178.76%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAÓ	Mt²	RD\$ -	15,560,000.00	RD\$ -	—

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY	Mt²	RD\$ 16,073,013.93	15,560,000.00	RD\$ 5,849,537.72	37.59%
HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA	Mt²	RD\$ -	5,222,222.00	RD\$ 48,709,197.90	932.73%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	Mt²	RD\$ 17,276,427.23	15,560,000.00	RD\$ -	—
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	Mt²	RD\$ 36,000,000.00	31,111,112.00	RD\$ 163,881,770.30	526.76%
HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 100,115,438.94	10011.54%
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 48,200,697.94	4820.07%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 14,590,405.41	1459.04%
HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT	Mt²	RD\$ 14,000,000.00	31,111,111.00	RD\$ 136,987,835.07	440.32%
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN IGNACIO DE SABANETA	Mt²	RD\$ -		RD\$ 4,344,005.00	—
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	Mt²	RD\$ -	15,666,666.00	RD\$ 49,489,900.42	315.89%
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR	Mt²	RD\$ 46,021,597.76	45,000,000.00	RD\$ 77,116,810.61	171.37%



HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	Mt²	RD\$ -	31,111,112.00	RD\$ 64,768,465.47	208.18%
HOSPITAL ROSA DUARTE	Mt²	RD\$ -	1,000,000.00	RD\$ 91,970,122.68	9197.01%
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	Mt²	RD\$ 14,000,000.00	18,532,125.00	RD\$ 70,773,939.77	381.90%
EMERGENCIA MÓVIL HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	Mt²	RD\$ -	-	RD\$ 19,631,730.46	—

**4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO  
ENERO - DICIEMBRE 2017**

<b>INVERSIÓN POR PROVINCIAS EN RD\$</b>	
SANTO DOMINGO	<b>1,931,833,412.09</b>
MONTE PLATA	<b>0.00</b>
SAN PEDRO	<b>90,405,670.23</b>
HATO MAYOR	<b>20,627,146.00</b>
SEYBO	<b>57,106,214.26</b>
LA ALTAGRACIA	<b>54,558,735.62</b>
SANTIAGO	<b>179,494,493.85</b>
MONTECRISTI	<b>214,576,991.15</b>
LA VEGA	<b>546,980,463.61</b>
SAN JOSÉ DE LAS MATAS	<b>0.00</b>
SÁNCHEZ RAMÍREZ	<b>291,349,692.65</b>
DUARTE	<b>87,432,794.23</b>
HERMANAS MIRABAL	<b>16,503,973.81</b>
ESPAILLAT	<b>120,522,130.87</b>
SAMANÁ	<b>93,513,464.86</b>
MONSEÑOR NOUEL	<b>0.00</b>
PUERTO PLATA	<b>354,561,640.23</b>
VALVERDE	<b>304,680,826.58</b>
SANTIAGO RODRÍGUEZ	<b>53,833,905.42</b>
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	<b>77,116,810.61</b>
BARAHONA	<b>163,606,643.97</b>
SAN CRISTÓBAL	<b>281,514,700.43</b>
INDEPENDENCIA	<b>188,130,600.12</b>
AZUA	<b>1,601,342.00</b>
SAN JUAN	<b>157,222,945.51</b>
PERAVIA	<b>7,128,639.80</b>
SAN JOSÉ DE OCOA	<b>10,000,000.00</b>
BAHORUCO	<b>100,000,000.00</b>
ELÍAS PIÑA	<b>156,738,588.15</b>
MULTIPROVINCIAL	<b>314,414,168.32</b>
<b>TOTAL INVERTIDO POR PROVINCIAS</b>	<b>RD\$5,875,455,994.37</b>

## **5. SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 2017**

## SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS OBRAS

SANTO DOMINGO		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	57,073,240.07	21,197,905.54
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA	49,276,299.76	835,757.91
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND		414,756.61
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH	9,447,743.23	0.00
MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA	352,787,460.60	203,664,270.44
HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE	55,083,909.59	48,709,197.90
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	162,706,263.61	217,060,254.52
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	489,154,293.57	342,749,610.11
HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	101,473,303.89	75,924,473.58
LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRÓN) EN EL INSTITUTO ONCOLÓGICO ROSA EMILIA TAVÁREZ, DISTRITO NACIONAL, R.D.	178,623,436.40	179,396,635.74
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRÓN EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	172,632,189.42	103,098,409.68
HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	213,486,452.22	189,244,350.64
SUBCENTRO DE ENGOMBE	30,066,126.74	30,066,126.74
CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO	8,274,905,558.65	500,000,000.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA REVENTÓN ( TRAMO I ) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA, R. D.	41,927,680.03	0.00

CONSTRUCCIÓN ISLETAS CENTRALES Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA S CALLES 26 DE ENERO Y EDUARDO BRITO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	<b>52,168,825.26</b>	<b>0.00</b>
TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	<b>33,810,869.39</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	<b>396,567,276.05</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, RESPALDO OZAMA, FERNANDO DE NAVARRETE ( LOS MINAS), HORACIO ORTIZ ALVAREZ, CALLE GREGORIO GARCÍA CASTRO ( SECTOR KATANGA), Y LOS SECTORES : LA ENFERMERÍA, ETC.	<b>12,682,123.00</b>	<b>0.00</b>
RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCÍA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	<b>12,129,112.43</b>	<b>0.00</b>
CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACIÓN, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	<b>70,272,478.29</b>	<b>0.00</b>

CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.	<b>129,678,517.42</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	<b>36,692,421.18</b>	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN ANA TERESA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO(CALLES DE VALLE DEL ESTE).	<b>24,368,207.80</b>	<b>0.00</b>
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTÓN (TRAMO II), EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	<b>54,205,719.17</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN ESCALINATA PICA SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	<b>16,415,362.90</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO, PROYECTO LA NUEVA BARQUITA.		<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALÓN PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	<b>17,150,304.09</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	<b>85,866,399.07</b>	<b>0.00</b>

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMÉRICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACIÓN	<b>42,647,111.78</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL, D.N.	<b>50,450,147.71</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	<b>17,703,563.12</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN PARROQUIAL EL BUEN PASTOR, ENSANCHE EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA TERMINACIÓN CONST. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA, SABANA PERDIDA, PROV. SANTO DOMINGO	<b>12,078,152.58</b>	<b>0.00</b>
TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	<b>3,271,325.91</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN CASA DE ORACIONES	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	<b>9,704,180.18</b>	<b>0.00</b>
RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	<b>17,574,503.74</b>	<b>0.00</b>



IMPERMEABILIZACIÓN TECHO RESIDENCIA PARROQUIAL, TECHO DE ESCALERA Y CÚPULA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL		0.00
TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE	42,290,158.05	19,471,662.68
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.		0.00
IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL		0.00
<b>REGIÓN ESTE</b>		
<b><u>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</u></b>	<b><u>MONTO GENERAL PAGADO</u></b>	<b><u>MONTO INVERTIDO 2017</u></b>
<b><u>MONTE PLATA</u></b>		
REPARACIÓN TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN EL POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA	18,817,383.96	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.		0.00
<b><u>SAN PEDRO</u></b>		
HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	23,069,974.11	70,773,939.77
EMERGENCIA MÓVIL HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	23,069,974.10	19,631,730.46
<b><u>HATO MAYOR</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HATO MAYOR	59,212,026.53	20,627,146.00

<b><u>SEIBO</u></b>		
TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROV. SANTA CRUZ DEL SEYBO	<b>11,935,170.24</b>	<b>3,254,652.96</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO.	<b>22,599,248.97</b>	<b>10,046,882.30</b>
HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ	<b>46,280,153.63</b>	<b>43,804,679.00</b>
<b><u>LA ALTAGRACIA</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY		<b>5,849,537.72</b>
HOSPITAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA	<b>156,119,796.85</b>	<b>48,709,197.90</b>
<b>REGIÓN NORTE</b>		
<b><u>SANTIAGO</u></b>		
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PARTE ELÉCTRICO EXTERIOR Y ADECUACIÓN PARA EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO	<b>9,727,992.95</b>	<b>1,032,312.65</b>
IMPERMEABILIZANTE EN EL HOSPITAL DE BAITOA, HOSPITAL HATO DEL YAQUE, HOSPITAL CIEN FUEGO, HOSPITAL BELLA VISTA Y EL ENSANCHE ESPAILLAT, ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ARTURO GRULLÓN, IMPERMEABILIZANTE HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, SANTIAGO. GOBERNACIÓN DE SANTIAGO, REPARACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS PROV. SANTIAGO	<b>15,816,110.52</b>	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO	<b>60,666,481.35</b>	<b>5,448,879.05</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO	<b>61,406,076.44</b>	<b>23,317,524.61</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	<b>49,171,701.45</b>	<b>3,837,350.67</b>

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVÁREZ JUSTO, LOS SALADOS	44,604,643.38	7,682,009.79
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	46,565,729.85	0.00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	19,361,002.14	0.00
HOSPITAL DE JÁNICO	76,295,245.58	36,998,342.40
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO	2,279,587,345.45	10,528,581.00
MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y PARTOS H. U. JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ	211,935,126.71	0.00
HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN	–	0.00
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO JUNCALITO	544,543,409.55	90,649,493.68
RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES	39,392,320.85	0.00
RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL BARRIO JUAN BOSCH, LA HERRADURA	35,500,977.03	0.00
CAMINO VECINALES EN AMACEYES Y CARLOS DÍAZ (GUAYABILLO, CRUCE DE JOSÉ GARCÍA)	8,868,674.77	0.00
<b><u>MONTECRISTI</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO	57,622,037.07	8,617,883.70
HOSPITAL DE MANZANILLO	117,912,098.10	121,537,459.39
HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	91,020,454.13	84,421,648.06
<b><u>LA VEGA</u></b>		
HABITACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA	98,200,859.06	42,785,843.96
CTC YERBA BUENA, JARABACOA	41,280,992.82	0.00

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	39,860,925.49	10,501,153.99
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA	39,216,573.18	16,572,826.78
HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	240,995,152.18	358,393,153.84
HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES	163,299,252.50	117,995,530.42
HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	28,861,106.98	731,954.62
<b><u>SÁNCHEZ RAMÍREZ</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO	56,463,588.47	5,850,255.72
HOSPITAL SIGFREDO ALBA DOMÍNGUEZ, FANTINO, COTUÍ	178,479,270.79	101,367,626.34
HOSPITAL VILLA LA MATA	149,258,617.30	90,139,755.80
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUÍ	124,628,929.98	93,992,054.79
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTUÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ	8,325,568.20	0.00
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE MAGUACA - EL LIMÓN-LOMA GALLINA, LA CUEVA-ZAMBRANA-EL COROZO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, R.D.	0.00	0.00
<b><u>DUARTE</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS	48,287,830.05	7,946,007.63
HOSPITAL DE CASTILLO	111,894,031.14	78,431,541.39
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE	8,214,387.31	914,655.40
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE	10,184,852.33	140,589.81

<b><u>HERMANAS MIRABAL</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	<b>61,188,212.93</b>	<b>16,503,973.81</b>
<b><u>ESPAILLAT</u></b>		
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN VÍCTOR-AMACEYES	<b>228,357,914.04</b>	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA AMACEYES-CARLOS DÍAZ	<b>54,331,779.35</b>	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL PERÚ	<b>90,277,167.93</b>	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO	<b>20,535,442.64</b>	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA	<b>50,165,401.53</b>	<b>0.00</b>
HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME	<b>164,649,866.19</b>	<b>95,830,279.36</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAMA O AL NORTE	<b>55,597,914.12</b>	<b>24,691,851.51</b>
<b><u>SAN JOSÉ DE LAS MATAS</u></b>		
EQUIPAMIENTO Y ASFALTADO CALLES DEL MULTIUSO DE SAJOMA	<b>6,011,447.72</b>	<b>0.00</b>
<b><u>SAMANÁ</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ	<b>57,543,177.41</b>	<b>10,334,182.99</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, SÁNCHEZ	<b>89,738,051.54</b>	<b>83,179,281.87</b>
<b><u>MONSEÑOR NOUEL</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONA O	<b>25,624,930.58</b>	<b>0.00</b>
<b><u>PUERTO PLATA</u></b>		
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) IMBERT	<b>899,921.59</b>	<b>2,399,790.57</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PUERTO PLATA.	<b>58,116,701.05</b>	<b>0.00</b>
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO	<b>221,861,647.39</b>	<b>163,881,770.30</b>

HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS	87,866,223.19	100,115,438.94
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA	89,587,527.71	48,200,697.94
HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN	39,338,234.21	39,338,234.21
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO	8,121,849.80	625,708.27
<b><u>VALVERDE</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO	42,700,551.46	14,590,405.41
HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT	195,953,616.02	136,987,835.07
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO	153,102,586.10	153,102,586.10
<b><u>SANTIAGO RODRÍGUEZ</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN IGNACIO DE SABANETA	59,566,848.74	4,344,005.00
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ	92,770,891.11	49,489,900.42
<b><u>MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ</u></b>		
HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR	73,050,644.86	77,116,810.61
<b>REGIÓN SUR</b>		
<b><u>BARAHONA</u></b>		
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA	9,369,699.40	1,399,299.08
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	12,278,419.43	0.00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO	64,160,615.44	17,555,766.25
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ	42,290,095.40	0.00
HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	120,522,298.77	65,976,705.89

HOSPITAL DR. JAIME MOTA	--	56,486,778.15
HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	64,821,653.02	22,188,094.60
<b><u>BAHORUCO</u></b>		
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN - LA DESCUBIERTA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA BAHORUCO	457,256,523.54	100,000,000.00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	457,256,523.54	0.00
<b><u>SAN CRISTÓBAL</u></b>		
RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMA II	36,959,112.97	2,978,476.59
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA	43,195,237.56	18,311,905.54
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA	38,152,230.29	6,771,793.40
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN	51,700,317.06	2,137,878.44
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	36,244,618.78	386,101.93
HOSPITAL DE BARSEQUILLO	106,522,544.19	46,392,023.09
EMERGENCIA 911, HOSPITAL JACINTO MAÑÓN	32,973,534.80	0.00
HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	269,550,789.74	128,753,420.54
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	103,588,587.95	75,783,100.90
<b><u>INDEPENDENCIA</u></b>		
HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ	109,775,308.81	99,344,851.72
HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA	54,434,725.97	88,785,748.40
<b><u>AZUA</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	46,036,401.79	1,601,342.00
<b><u>SAN JUAN</u></b>		

TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	<b>10,065,847.31</b>	<b>1,305,323.58</b>
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO-LOS MOTONCITOS-LOS FRÍOS-TRAMO I-IV (DESDE EST. 0+00 HASTA EST. 12+430) Y SEÑALIZACIÓN GENERAL.,	<b>24,626,207.01</b>	<b>8,917,003.43</b>
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10)	<b>63,999,382.52</b>	<b>34,521,119.89</b>
SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLÓN - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLÓN, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	<b>48,816,146.04</b>	<b>0.00</b>
RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PROVINCIA SAN JUAN	<b>9,354,384.18</b>	<b>0.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	<b>42,310,289.60</b>	<b>1,923,546.00</b>
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN	<b>43,664,584.23</b>	<b>8,695,821.00</b>
HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO	<b>87,435,653.04</b>	<b>58,892,798.99</b>
HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL	<b>62,186,804.46</b>	<b>5,871,444.11</b>
HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN	--	<b>37,095,888.51</b>
<b><u>PERAVIA</u></b>		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA RIO ARRIBA, BANI	<b>55,315,475.79</b>	<b>6,631,813.89</b>
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO	<b>3,128,522.63</b>	<b>0.00</b>



ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO	0.00	0.00
REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO	662,434.54	496,825.91
<b>SAN JOSÉ DE OCOA</b>		
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	161,831,252.59	10,000,000.00
<b>ELÍAS PIÑA</b>		
HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE	69,890,358.00	64,768,465.47
HOSPITAL ROSA DUARTE	109,288,508.69	91,970,122.68
<b>PROYECTOS MULTIPROVINCIAL</b>		
CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VUELTA AL LAGO (BARAHONA-CABRAL-DUVERGÉ-JIMANÍ-LA DESCUBIERTA-PORTER RIO-VILLA JARAGUA, NEYBA, HASTA CRUCE DEL ABANICO)	2,337,409,781.23	53,278,529.35
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ.	3,310,242,140.33	162,464,861.08
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES, CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS	3,632,748,496.03	98,670,777.89

**6. INFORME DE SITUACIÓN EDIFICACIONES  
ESCOLARES Y ESTANCIAS**

**2017**

ESCUELAS					
PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	STATUS GENERAL	% EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
BÁSICA CASTAÑUELA	NORTE	MONTE CRISTI	EJECUTADA	100%	490
BÁSICA AGUA DE LUIS	NORTE	MONTE CRISTI	EN EJECUCIÓN	55%	140
BÁSICA EL VIGIADOR	NORTE	MONTE CRISTI	EJECUTADA	100%	595
BÁSICA RANCHADERO	NORTE	MONTE CRISTI	EN EJECUCIÓN	91%	245
LICEO EL COPEY	NORTE	MONTE CRISTI	EN EJECUCIÓN	60%	210
LICEO LOS DERRAMADEROS	NORTE	MONTE CRISTI	EN EJECUCIÓN	50%	210
BÁSICA ESPEJO JOSÉ MARÍA PÉREZ	NORTE	MONTE CRISTI	EJECUTADA	100%	420
BÁSICA ANA MERCEDES CASTRO	NORTE	MONTE CRISTI	EN EJECUCIÓN	10%	735
BÁSICA ESPEJO CRISTÓBAL COLÓN	NORTE	VALVERDE	EJECUTADA	100%	840
LICEO ESPERANZA NORTE	NORTE	VALVERDE	EN EJECUCIÓN	60%	700
BÁSICA CENTRO PARA LA NIÑEZ	NORTE	VALVERDE	EJECUTADA	100%	490
BÁSICA MAO 4	NORTE	VALVERDE	EN EJECUCIÓN	75%	910
SAGRADO CORAZÓN	NORTE	VALVERDE	EN EJECUCIÓN	70%	1855
JOSÉ CASTILLO REYES	NORDESTE	DUARTE	PARALIZADA	92%	280
LA RAYA	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	80%	175
OTACILIO A. DE PEÑA PÁEZ	NORDESTE	DUARTE	PARALIZADA	80%	595
CRUCE DE LOS BASILIOS	NORDESTE	DUARTE	PARALIZADA	85%	175

RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES	NORDESTE	DUARTE	TERMINADA	99%	315
BÁSICA SAN FELIPE ARRIBA	NORDESTE	DUARTE	PARALIZADA	90%	315
LICEO LA REFORMA	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	67%	350
BÁSICA CRISTO REY	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	85%	840
BÁSICA EL CIRUELO	NORDESTE	DUARTE	PARALIZADA	80%	840
BÁSICA SUR (SAN MARTÍN)	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	70%	840
LICEO SALCEDO 2	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	EN EJECUCIÓN	80%	875
POLITÉCNICO DE VILLA TAPIA	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	EN EJECUCIÓN	70%	280
LAS CUEVAS	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	EN EJECUCIÓN	75%	350
LOS LIMONES # 1	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	EN EJECUCIÓN	85%	175
BÁSICA SABANA ANGOSTA	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	EN EJECUCIÓN	70%	350
BÁSICA ZONA SUR 4	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	TERMINADA	99%	770
BÁSICA MATANCITAS	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	TERMINADA	99%	420
BÁSICA CAÑO BLANCO	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	TERMINADA	99%	315
LICEO COPEYITO	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	EN EJECUCIÓN	70%	140
BÁSICA EL CHUCHO	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	EN EJECUCIÓN	75%	385
POLITÉCNICO BARRIO LAS CAOBAS	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	10%	840
BÁSICA RANCHO ARRIBA	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	PARALIZADA	45%	490
BÁSICA RIO SAN JUAN 1	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	PARALIZADA	75%	455

BÁSICA PEDRO MARIA BURGOS	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	PARALIZADA	75%	315
BÁSICA ZONA NORTE 1	ESTE	HATO MAYOR	EJECUTADA	100%	420
LICEO EL VALLE	ESTE	HATO MAYOR	EN EJECUCIÓN	93%	630
BÁSICA LAS CAÑITAS	ESTE	HATO MAYOR	EJECUTADA	100%	630
BÁSICA BARRIO LINDO-GUALEY	ESTE	HATO MAYOR	EN EJECUCIÓN	80%	630
LICEO YERBA BUENA	ESTE	HATO MAYOR	EN EJECUCIÓN	70%	280
LICEO LAS MALVINAS	ESTE	HATO MAYOR	EN EJECUCIÓN	55%	840
BÁSICA ESPEJO SANTA RITA	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	90%	490
BÁSICA LA MAJAGUA	ESTE	EL SEIBO	PARALIZADA	85%	980
LICEO EL CEDRO	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	75%	280
BÁSICA LOS MAMEYES	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	75%	455
LICEO VICENTILLO	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	45%	140
BÁSICA KILOMETRO 6	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	60%	315
LICEO MICHES OESTE	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	60%	490
BÁSICA MONTE PLATA	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	490
LICEO MONTE PLATA	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	700
BÁSICA JOSÉ VÁSQUEZ JIMÉNEZ	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	350
RAMÓN MOREL SANTO -LA GUÁZUMA-	ESTE	MONTE PLATA	EJECUTADA	100%	385
BÁSICA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	84%	245

LICEO BAYAGUANA 2	ESTE	MONTE PLATA	EJECUTADA	100%	910
BÁSICA DOMINICA	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	82%	490
BÁSICA RÍO ARRIBA	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	80%	700
BÁSICA SALOMÉ UREÑA	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	80%	315
LICEO JOSÉ REYES	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	420
BÁSICA JUANA AMINTA SORIANO - SIERRA DE AGUA	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	560
LICEO BATEY YABACAO	ESTE	MONTE PLATA	EJECUTADA	100%	280
BÁSICA GONZALO	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	80%	700
BÁSICA GREGORIO AYBAR CONTRERAS - LOS GUINEOS	ESTE	MONTE PLATA	TERMINADA	99%	595
BÁSICA ROSA DUARTE	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	83%	350
BÁSICA ERCILIA PEPÍN	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	82%	315
BÁSICA GUAYACANES 1	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	PARALIZADA	84%	700
LICEO GUAYACANES	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	90%	560
BÁSICA ANTONIO PAREDES MENA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	94%	945
BÁSICA ESPERANZA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	87%	840
BÁSICA BARRIO LA CARRETERA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	87%	840

BÁSICA BARRIO SAN CARLOS	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	83%	840
LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	81%	840
BÁSICA BATEY CAMPIÑA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	PARALIZADA	87%	315
BÁSICA EL GUAYABAL	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	PARALIZADA	87%	630
LICEO LA PALOMA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	90%	280
BÁSICA VILLA CESARINA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	87%	840
LICEO PORVENIR II	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	94%	840
LICEO VILLA MARANATA	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	PARALIZADA	81%	840
LICEO PIEDRA LINDA	ESTE	LA ROMANA	EJECUTADA	100%	945
BÁSICA CERCA DE RIO SALADO	ESTE	LA ROMANA	PARALIZADA	90%	840
BÁSICA LOS COCOS	ESTE	LA ROMANA	EN EJECUCIÓN	86%	315
BÁSICA BARRIO LA LECHOSA	ESTE	LA ROMANA	PARALIZADA	78%	910
BÁSICA ZONA EL ARTÍSTICO	ESTE	LA ROMANA	EJECUTADA	100%	945
LICEO VILLA ZORRILLA	ESTE	LA ROMANA	EN EJECUCIÓN	67%	840
SAN VICENTE DE PAUL	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	75%	560
INSTITUTO AGROPECUARIO DE HIGÜEY	ESTE	LA ALTAGRACIA	EJECUTADA	100%	700
BÁSICA LEONEL ROBERTO RODRÍGUEZ	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	75%	385
BÁSICA SAN RAFAEL	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	85%	910

CENTRO MODELO DE INICIAL	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	80%	210
ESCUELA BÁSICA EL MACAO	ESTE	LA ALTAGRACIA	EJECUTADA	100%	350
ESCUELA BÁSICA LA CEIVA	ESTE	LA ALTAGRACIA	EJECUTADA	100%	770
ESCUELA B. PUNTA CANA 1	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	77%	770
LICEO FRIUZA	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	75%	630
BÁSICA HATO MANA	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	80%	350
LICEO EL LLANO	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	78%	770
BÁSICA PALO BONITO	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	75%	560
BÁSICA HIGUERA, LA	ESTE	EL SEIBO	EN EJECUCIÓN	70%	140
POLITÉCNICO PERALVILLO	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	5%	280
BÁSICA EL CACIQUE	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	80%	490
BÁSICA RAMÓN MARTÍNEZ	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	82%	350
BÁSICA CHIRINO	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	80%	175
BÁSICA RÍO BOYA	ESTE	MONTE PLATA	PARALIZADA	80%	350
LICEO LA CUABA	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	80%	210
BÁSICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	70%	840
LICEO MADRE ASENCIÓN NICOL	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	82%	420



LICEO LAS CAOBAS	ESTE	LA ROMANA	EN EJECUCIÓN	52%	840
LICEO VILLA ZORRILLA	ESTE	LA ROMANA	EN EJECUCIÓN	68%	840
BÁSICA SAN VICENTE DE PAUL	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	80%	560
BÁSICA LEONEL ROBERTO RODRÍGUEZ	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	80%	385
BÁSICA SAN RAFAEL	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	85%	910
CENTRO MODELO DE INICIAL	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	80%	210
ESCUELA BÁSICA PUNTA CANA 1	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	77%	770
ESCUELA BÁSICA VILLA CERRO	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	70%	770
LICEO FRIUZA	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	75%	630
BÁSICA HATO MANA	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	80%	350
LICEO EL LLANO	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	78%	770
BÁSICA PALO BONITO	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	75%	560
BÁSICA DOS JARDAS	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	10%	770
BÁSICA LA ENEA	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	6%	315
BÁSICA ZENÓN SANTANA	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	2%	770
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	8%	630
LICEO PEDRO BRAND 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	60%	840

BÁSICA DR. JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EJECUTADA	100%	350
BÁSICA FACUNDO LAVATTA RAMÍREZ	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	70%	385
BÁSICA LA REDENCIÓN	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	70%	840
BÁSICA LANDIA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	65%	840
BÁSICA LAS MERCEDES	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	65%	840
BÁSICA MANUEL EMILIO JIMÉNEZ	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	72%	840
BÁSICA MARTHA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EJECUTADA	100%	840
BÁSICA NUEVO AMANECEER	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EJECUTADA	100%	840
BÁSICA VALLE ENCANTADO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	72%	840
LICEO PANTOJA VIEJO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	15%	840
BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	70%	840
BÁSICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ - EL BRISAL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	60%	840
BÁSICA MARINO MORENO GONZÁLEZ - EL PEDREGAL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EJECUTADA	100%	630
LICEO LAS MERCEDES	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EJECUTADA	100%	420

BÁSICA PALAMARA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	15%	175
LICEO KM 10 ½, LAS AMÉRICAS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	29%	805
LOS TRES BRAZOS-4	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	945
LICEO EL ALMIRANTE 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	875
BÁSICA EL VALIENTE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	490
BÁSICA FORMERIO RODRÍGUEZ	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	TERMINADA	99%	805
LICEO VILLA LIBERACIÓN	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	1015
BÁSICA ESPEJO MANUEL B. TRONCOSO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	945
POETA JOSÉ MARTÍ	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	55%	280
LICEO LOS TRES BRAZOS 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	945
LICEO 24 DE ABRIL ( PEDRO MIR)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	875
LICEO LOS FRAILES I	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	980
LICEO ZAFRA(NUEVA BARQUITA)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	840
BÁSICA BRISAS DE ESTE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	73%	840
BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	59%	840
BÁSICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	65%	840

BÁSICA LOS PALMEROS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	63%	840
LICEO KELVIN OBRERO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	67%	840
LICEO LOS PALMEROS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	67%	840
BÁSICA "GÉNESIS"	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	79%	840
BÁSICA MI HOGAR DEL ESTE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	840
BÁSICA MONTE REY	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	84%	840
POLITÉCNICO BRISAS DE CAUCEDO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	840
BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	59%	840
BÁSICA VALLE DE LAS AMÉRICAS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	80%	840
BÁSICA BARRIO NUEVO KILOMETRO 13	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	65%	840
POLITÉCNICO ITLA (LICEO GUARÍCANO I)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	95%	840
BÁSICA EL TORO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	80%	875
BÁSICA LOS COQUITOS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	100%	875
BÁSICA EL TAMARINDO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	875
LICEO CANCINO ADENTRO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	910
LICEO PRADOS DE LA CAÑA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	85%	910
LICEO SAN ISIDRO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	85%	910

BÁSICA AMALIA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	100%	875
BÁSICA EL ALMIRANTE (REP. DE NICARAGUA)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	85%	875
BÁSICA VICTORIANA SECCIÓN BECO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EJECUTADA	100%	875
BÁSICA LOS ALIFONSOS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	90%	210
BÁSICA HERMANAS MIRABAL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	33%	840
BÁSICA LOS TANQUESITOS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	840
LICEO LAS PALMAS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	1%	840
BÁSICA CAMBITA GARABITOS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	1%	805
BÁSICA MARANÓN I	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	50%	840
ESCUELA ESPECIAL (CRISTIANO DE EDUCACIÓN PARA SORDOS)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EJECUTADA	100%	420
BÁSICA BUENA VISTA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	75%	840
BÁSICA EL ROSARIO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	85%	1120
LICEO PALMAREJO VILLA LINDA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	40%	875
BÁSICA ZONA FRANCA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	70%	665
BÁSICA MARÍA TERESA MIRABAL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	50%	455

BÁSICA FLÉRIDA NOLASCO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	50%	770
LICEO LA PIÑA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	50%	840
BÁSICA LA GUÁYIGA 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	67%	840
BÁSICA ESPEJO CAMPAMENTO 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	5%	0
LICEO CERROS DEL NORTE (KM-14)	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	5%	840
LICEO LOS JARDINES	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	70%	665
BÁSICA EL NARANJO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	70%	875
LICEO EL TAMARINDO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	70%	910
BÁSICA PERLA ANTILLANA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	875
POLITÉCNICO PERLA ANTILLANA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	75%	875
BÁSICA LAS CASITAS	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	15%	840
LICEO LA GRÚA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	65%	840
BÁSICA CAMPECHITO NORTE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	69%	840
BÁSICA EL CHAPARRAL OESTE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	69%	840
BÁSICA CASA VIEJA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	3%	840
BÁSICA SABANA PERDIDA 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	PARALIZADA	5%	840
LICEO EL TAMARINDO-COLONIAS DE	SANTO DOMINGO	STO. DGO. NORTE	EN EJECUCIÓN	9%	840

LOS DOCTORES					
LICEO EXPERIMENTAL UASD	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL	PARALIZADA	45%	840
ESTANCIAS INFANTILES					
ESCUELA	REGIÓN	PROVINCIA	STATUS GENERAL	% EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
ESTANCIA INFANTIL EL ALMIRANTE 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	50%	222
ESTANCIA INFANTIL MENDOZA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	10%	222
ESTANCIA INFANTIL VILLA LIBERACIÓN/ EL TAMARINDO	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	PARALIZADA	8%	222
ESTANCIA INFANTIL BLOQUE DE BARRIOS LA COMPUERTA- BUENOS AIRES- CAÑADA PIEDRA	NORTE	VALVERDE	EN EJECUCIÓN	35%	222
ESTANCIA INFANTIL MONTE CRISTI	NORTE	MONTE CRISTI	PARALIZADA	60%	222
ESTANCIA INFANTIL ESPERANZA	NORTE	VALVERDE	EN EJECUCIÓN	45%	222
ESTANCIA INFANTIL HERMANAS MIRABAL	NORDESTE	DUARTE	EN EJECUCIÓN	70%	222
ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	EN EJECUCIÓN	75%	222
ESTANCIA INFANTIL NAGUA	NORDESTE	MARIA TRINIDAD	EN EJECUCIÓN	75%	222

ESTANCIA INFANTIL HATO MAYOR	ESTE	HATO MAYOR	EN EJECUCIÓN	50%	222
ESTANCIA INFANTIL MONTE PLATA	ESTE	MONTE PLATA	EN EJECUCIÓN	75%	222
ESTANCIA INFANTIL PIEDRA LINDA - VILLA HERMOSA	ESTE	LA ROMANA	EJECUTADA	100%	222
ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO GUAYMATE	ESTE	LA ROMANA	EN EJECUCIÓN	30%	222
ESTANCIA INFANTIL SAVICA - HIGÜEY	ESTE	LA ALTAGRACIA	PARALIZADA	60%	222
ESTANCIA INFANTIL VILLA CERRO	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	70%	222
ESTANCIA INFANTIL PEDRO JUSTO GRARRIÓN	ESTE	SAN PEDRO MACORÍS	EN EJECUCIÓN	45%	222
ESTANCIA INFANTIL LOS MULOS - VILLA HERMOSA	ESTE	LA ROMANA	PARALIZADA	5%	222
ESTANCIA INFANTIL VERÓN – BÁVARO 2	ESTE	LA ALTAGRACIA	EN EJECUCIÓN	15%	222
ESTANCIA INFANTIL MARIA AUXILIADORA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	30%	222
ESTANCIA INFANTIL MEJORAMIENTO SOCIAL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	30%	222
ESTANCIA INFANTIL	SANTO DOMINGO	STO. DGO. ESTE	EN EJECUCIÓN	30%	222



VILLA FRANCISCA					
ESTANCIA INFANTIL LOS ALCARRIZOS - LA SALIDA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	25%	222
ESTANCIA INFANTIL JUANA SALTITOPA - LA PIÑA	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	PARALIZADA	8%	222
ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZOS 1	SANTO DOMINGO	STO. DGO. OESTE	EN EJECUCIÓN	1%	222

## **7. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo  
 Vice-Ministerio de Planificación  
**Dirección General de Inversión Pública**  
**Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos**  
**Gestión Formuladora 2017**

**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO**

				Nombre del Proyecto				Información Geográfica	Ejecución Financiera						Indicadores Físicos	Beneficiarios	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
ID			Código		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuestado	Distribución	%	Fuentes Nacionales			Crédito Externo		(Indicador más Relevante)			
			SNIP					Geográfica	Formulación	Monto	Descripción de la fuente	pagado 2017	Monto	Organismo Financidor	Unidad de Medida			
								Municipal										
			0	REPARACIÓN TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN EL POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA			23,955,621.60	MONTE PLATA	78.55%	18,817,383.96	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				POBLADO JUAN SANCHEZ	EJECUCIÓN	
								Municipal										
			0	CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D.			3,662,297.88	MONTE PLATA	0.00%	0.00	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				MAJAGUAL	EJECUCIÓN	
								Municipal										

	LS-012-2011	No Informado	TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO			29,887,443.39	SEIBO	47.41%	14,171,120.49	FONDO GENERAL	3,254,652.96				EL SEIBO	EJECUCIÓN	
							Municipal										
	ARZOBISPADO	No Informado	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PARTE ELÉCTRICO EXTERIOR Y ADECUACIÓN PARA EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROV. SANTIAGO	2013		15,816,110.52	SANTIAGO	76.80%	12,147,238.56	FONDO GENERAL	1,032,312.65				SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	EJECUCIÓN	
							Provincial										
		0	IMPERMEABILIZ ANTE EN EL HOSPITAL DE BAITOA, HOSPITAL HATO DEL YAQUE, HOSPITAL CIEN FUEGO, HOSPITAL BELLA VISTA Y EL ENSANCHE ESPAILLAT, ÁREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ARTURO GRULLÓN, IMPERMEABILIZ ANTE HOSPITAL ENSANCHE LIBERTAD, SANTIAGO. GOBERNACIÓN DE SANTIAGO, REPARACIÓN			15,816,110.52	SANTIAGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTIAGO	EJECUCIÓN	

			HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ, EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS PROV. SANTIAGO														
							<b>Municipal</b>										
	15.00.39.005 2	13268	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO		2017	64,322,409. 91	SANTIAGO	94.32%	60,666,481.35	FONDO GENERAL	5,448,8 79.05					<b>SANTIAGO</b>	INAUGURADO
							<b>Municipal</b>										
	15.00.66.005 1	13285	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO	2013		64,076,397. 49	SANTO DOMINGO	95.83%	61,406,076.44	FONDO GENERAL	23,317, 524.61					<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	EJECUCIÓN
							<b>Municipal</b>										
	15.00.33.005 1	13245	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA	2013		50,864,207. 66	SANTIAGO	96.67%	49,171,701.45	FONDO GENERAL	3,837,3 50.67					<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	EJECUCIÓN
							<b>Provincial</b>										

	15.00.34.005 1	13265	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVÁREZ JUSTO, LOS SALADOS	2013		53,202,676. 99	SANTIAGO	93.55%	49,771,529.44	FONDO GENERAL	7,682.0 09.79				SANTIAGO	EJECUCIÓN	
							Municipal										
	15.00.35.005 3	13266	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE	2013		51,306,865. 48	SANTIAGO	94.51%	48,491,811.04	FONDO GENERAL	0.00				NAVARRETE	EJECUCIÓN	
							Municipal										
	0	0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES	2013		47,734,473. 64	SANTIAGO	40.55%	19,361,002.14	FONDO GENERAL	0.00				SANTIAGO	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.74.005 7	13519	HOSPITAL DE JÁNICO	2016	2017	88,167,234. 12	SANTIAGO	91.09%	80,310,784.81	FONDO GENERAL	36,998, 342.40				SANTIAGO	INAUGURADO	
							Provincial										
	15.00.10.005 2	12897	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO	2013		2,505,630,6 98.93	SANTIAGO	96.45%	2,416,587,068 .60	FONDO GENERAL	10,528, 581.00				SANTIAGO	EJECUCIÓN	
							Municipal										
	0	0	MÓDULOS QUIRÚRGICOS Y PARTOS H. U. JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ	2016		226,517,818 .92	SANTIAGO	93.56%	211,935,126.7 1	FONDO GENERAL	0.00				SANTIAGO	EJECUCIÓN	
							Municipal										

15.00.74.005 2	13519	HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN	2016		170,832,302.84	SANTIAGO	24.84%	42,438,305.77	FONDO GENERAL	0.00					SANTIAGO	EJECUCIÓN
						Provincial										
MP-002-2015	No Informado	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO JUNCALITO	2017		571,919,182.91	SANTIAGO	91.29%	544,543,409.55	FONDO GENERAL	90,649,493.68					SANTIAGO	TERMINADA
						Provincial										
0	0	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LOMITA, AMACEYES	2017		25,236,559.50	SANTIAGO			CAPTACION DIRECTA	0.00					SANTIAGO	TERMINADA
						Provincial										
	0	RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL BARRIO JUAN BOSCH, LA HERRADURA	2017		35,782,197.15	SANTIAGO			CAPTACION DIRECTA	0.00					SANTIAGO	TERMINADA
						Municipal										
15.00.64.005 1	13283	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN	2013		61,085,257.54	SANTO DOMINGO	93.43%	57,073,240.07	FONDO GENERAL	21,197,905.54					SANTO DOMINGO	EJECUCIÓN
						Municipal										
15.00.17.005 3	13233	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA	2013	2017	63,879,007.46	SANTO DOMINGO	81.20%	51,869,790.07	FONDO GENERAL	835,757.91					MUNICIPIO DE GUERRA	TERMINADA
						Provincial										

	15.00.38.005 3	13267	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND		2017	54,201,200. 45	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	FONDO GENERAL	414,75 6.61				SANTO DOMINGO OESTE	TERMINADA	
							Provincial										
	0	0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH			29,083,565. 04	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCIÓN	
							Municipio										
	15.00.92.005 4	13536	MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINA			392,912,149. .31	SANTO DOMINGO	93.54%	367,530,564.8 5	FONDO GENERAL	203,66 4,270.4 4				SANTO DOMINGO ESTE	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.92.005 2	13536	HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE		2017	58,832,299. 07	SANTO DOMINGO	93.63%	55,083,909.59	FONDO GENERAL	48,709, 197.90				SANTO DOMINGO ESTE	INAUGURADA	
							Provincial										
	15.00.81.005 2	13527	HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	2016		347,974,721. .06	SANTO DOMINGO	46.76%	162,706,263.6 1	FONDO GENERAL	217,06 0,254.5 2				SANTO DOMINGO	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.81.005 1	13527	HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO	2016		642,245,921. .01	SANTO DOMINGO	76.16%	489,154,293.5 7	FONDO GENERAL	342,74 9,610.1 1				SANTO DOMINGO	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.92.005 1	13536	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS	2016		223,230,059. .10	SANTO DOMINGO	45.46%	101,473,303.8 9	FONDO GENERAL	75,924, 473.58				SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCIÓN	
							Provincial										



15.00.15.005 3	12487	LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRÓN) EN EL INSTITUTO ONCOLÓGICO ROSA EMILIA TAVÁREZ, DISTRITO NACIONAL, R.D	2015		196,849,777 .72	SANTO DOMINGO	90.74%	178,623,436.4 0	FONDO GENERAL	179,39 6,635.7 4				SANTO DOMINGO	PARALIZADO	
						Provincial										
15.00.96.005 1	13843	HOSPITAL CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	2016		230,248,586 .52	SANTO DOMINGO	92.72%	213,486,452.2 2	FONDO GENERAL	189,24 4,350.6 4				SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCIÓN	
						Provincial										
15.00.92.005 7	13536	SUBCENTRO DE ENGOMBE	2016		193,141,062 .85	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	FONDO GENERAL	30,066, 126.74				SANTO DOMINGO OESTE	EJECUCIÓN	
						Provincial										
15.00.16.005 1	13302	CIUDAD SANITARIA Dr. LUIS EDUARDO AYBAR, PROV. SANTO DOMINGO			8,740,357.6 19.90	SANTO DOMINGO	94.67%	8,274,905,558 .65	CAPTACION DIRECTA	500,00 0,000.0 0	1,400,000,0 00.00	BONOS GLOBALES EXTERNOS		DISTRITO NACIONAL	EJECUCIÓN	
						Provincial										
FP-011-2015	12487	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL	2015		196,849,777 .72	SANTO DOMINGO	90.74%	178,623,436.4 0	FONDO GENERAL	103,09 8,409.6 8				DISTITO NACIONAL	PARALIZADO	
						Provincial										

	0	0	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA REVENTÓN ( TRAMO I ) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA, R. D.			47,399,493.71	SANTO DOMINGO	88.46%	41,927,680.03	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO	
							Provincial										
	0	0	CONSTRUCCIÓN ISLETAS CENTRALES Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS EN LA S CALLES 26 DE ENERO Y EDUARDO BRITO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2013		57,721,555.67	SANTO DOMINGO	96.03%	55,432,718.03	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO	
							Municipal										
		0	TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2013		60,840,045.89	SANTO DOMINGO	55.57%	33,810,869.39	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO	2013		283,720,016.65	SANTO DOMINGO	99.96%	38,385,544.25	CAPTACION DIRECTA	0.00				MUNICIPIO DE BOCA CHICA	PARALIZADO	
							Provincial										

		0	CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE	2013		849,238,484.94	SANTO DOMINGO	46.70%	396,567,276.05	CAPTACION DIRECTA	0.00			SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO	
							Provincial									
		0	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, RESPALDO OZAMA, FERNANDO DE NAVARRETE ( LOS MINAS), HORACIO ORTIZ ALVAREZ, CALLE GREGORIO GARCÍA CASTRO ( SECTOR KATANGA), Y LOS SECTORES : LA ENFERMERÍA, ETC.	2013		80,443,401.47	SANTO DOMINGO	15.77%	12,682,123.00	CAPTACION DIRECTA	0.00			SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO	

							Provincial										
		0	RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA. ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	2017		99,368,442.00	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	CONTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO , PROYECTO LA NUEVA BARQUITA. (SE EJECUTA POR CONCEPTO DE ORDEN DE CAMBIO)			61,007,429.52	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	EJECUCIÓN	
							Provincial										
		0	RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCÍA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	2013		161,882,137.39	SANTO DOMINGO	15.77%	12,682,123.00	CAPTACION DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZADO	

							<b>Provincial</b>										
	0	0	CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO.	2014		25,783,753.14	<b>SANTO DOMINGO</b>	47.04%	12,129,112.43	CAPTACION DIRECTA	0.00					<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	PARALIZADO
							<b>Municipal</b>										
	0	0	CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACIÓN, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO	2014		142,063,364.98	<b>SANTO DOMINGO</b>	49.47%	70,272,478.29	CAPTACION DIRECTA	0.00					<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	PARALIZADO
							<b>Provincial</b>										
	0	0	CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO			150,440,576.08	<b>SANTO DOMINGO</b>	86.20%	129,678,517.42	CAPTACION DIRECTA	0.00					<b>SANTO DOMINGO ESTE</b>	PARALIZADO

			CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO.														
							Provincial										
	0	0	CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCI ÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCI ÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2014		46,057,766. 15	SANTO DOMINGO	79.67%	36,692,421.18	CAPTACIO N DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZA DO	
							Provincial										
	0	0	RECONSTRUCCI ON DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN ANA TERESA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO(CALL	2014		30,518,670. 85	SANTO DOMINGO	79.85%	24,368,207.80	CAPTACIO N DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO ESTE	PARALIZA DO	

			ES DE VALLE DEL ESTE).														
							Provincial										
	0	0	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON (TRAMO II), EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	2012		68,292,505.56	SANTO DOMINGO	91.44%	62,443,683.83	CAPTACION DIRECTA	0.00					SANTO DOMINGO OESTE	PARALIZADO
							Provincial										
	0	0	CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D.	2016		5,720,581.33	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00					SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
							Provincial										
	0	0	CONSTRUCCIÓN ESCALINATA PICA SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE	2016		6,238,458.08	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACION DIRECTA	0.00					SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO
							Provincia										

	0	0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALÓN PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	2006		30,000,000.00	SANTO DOMINGO	57.17%	17,150,304.09	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincia										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL.	2007		87,301,744.50	SANTO DOMINGO	98.36%	85,866,399.07	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincia										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMÉRICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACIÓN	2007		48,993,949.57	SANTO DOMINGO	87.05%	42,647,111.78	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincia										



		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA DE LA ANTIGUA CÁRCEL REAL, D.N.	2007		55,125,000.00	SANTO DOMINGO	91.52%	50,450,147.71	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincia										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERÍA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO	2007		17,918,264.12	SANTO DOMINGO	98.80%	17,703,563.12	CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Municipal										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN PARROQUIAL EL BUEN PASTOR, ENSANCHE EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL	2007		41,559,862.80	SANTO DOMINGO			CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										

		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA TERMINACIÓN CONST. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE AMÉRICA LATINA, SABANA PERDIDA, PROV. SANTO DOMINGO	2008		48,819,545.31	SANTO DOMINGO	24.74%	12,078,152.58	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				SANTO DOMINGO NORTE	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO	2010		74,587,821.06	SANTO DOMINGO	4.39%	3,271,325.91	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	2012		2,000,000.00	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REPARACIÓN CASA DE ORACIONES	2012		4,000,000.00	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										

		0	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SEÑORA DE LA EVANGELIZACIÓN.	2012		2,500,000.00	SANTO DOMINGO	0.00%	0.00	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Provincial										
		0	OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO	2012		24,402,378.81	SANTO DOMINGO	39.77%	9,704,180.18	CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Municipal										
		0	IMPERMEABILIZACIÓN TECHO RESIDENCIA PARROQUIAL, TECHO DE ESCALERA Y CÚPULA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL				SANTO DOMINGO			CAPTACIÓN DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO	
							Municipal										
SER-FP-009-2016	No Informado		TERMINACIÓN REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DUARTIANO Y CASA NATAL JUAN PABLO DUARTE			61,007,429.52	SANTO DOMINGO	69.32%	42,290,158.05	FONDO GENERAL	19,471,662.68				DISTRITO NACIONAL	TERMINADO	

							<b>Provincial</b>									
		0	CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO O MODELO TIPO II, POLICÍA NACIONAL DE HACIENDA ESTRELLA, SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	2016		7,418,330.36	SANTO DOMINGO			CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	PARALIZADO
							<b>Provincial</b>									
		0	IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, DISTRITO NACIONAL			11,001,414.40	BARAHONA			CAPTACION DIRECTA	0.00				DISTRITO NACIONAL	EJECUCIÓN
							<b>Provincial</b>									
CONT.LS-110-2012	No Informado		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, LA CIÉNAGA PROVINCIA BARAHONA, Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO PARAÍSO, PROVINCIA BARAHONA	2012		15,967,550.27	BARAHONA	64.12%	10,238,460.45	FONDO GENERAL	1,399,299.08				BARAHONA	EJECUCIÓN

							<b>Provincial</b>									
	0	0	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	2007		8,195,670.11	<b>BARAHONA</b>	88.32%	12,669,143.19	CAPTACIÓN DIRECTA	2,768,151.58				<b>MUNICIPIO DE CABRAL</b>	EJECUCIÓN
							<b>Municipio</b>									
	15.00.57.0051	13254	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO	05/07/1905	2017	71,487,921.22	<b>BARAHONA</b>	94.47%	67,537,489.94	FONDO GENERAL	17,555,766.25				<b>MUNICIPIO ENRIQUILLO</b>	INAUGURADO
							<b>Provincial</b>									
	0	0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ	2013	2017	47,734,473.64	<b>BARAHONA</b>	80.03%	38,200,013.77	FONDO GENERAL	0.00				<b>BARAHONA</b>	INAUGURADO
							<b>Municipio</b>									
	15.00.75.0053	13520	HOSPITAL MUNICIPAL DE POLO	2016		146,886,442.47	<b>BARAHONA</b>	82.05%	120,522,298.77	FONDO GENERAL	65,976,705.89				<b>BARAHONA</b>	PARALIZADO
							<b>Provincial</b>									
	15.00.75.0052	13520	HOSPITAL DR. JAIME MOTA	2016		231,071,640.89	<b>BARAHONA</b>	12.49%	28,861,106.98	FONDO GENERAL	56,486,778.15				<b>BARAHONA</b>	EJECUCIÓN
							<b>Provincial</b>									
	15.00.75.0051	13520	HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL	2016		139,447,977.06	<b>BARAHONA</b>	46.48%	64,821,653.02	FONDO GENERAL	22,188,094.60				<b>BARAHONA</b>	EJECUCIÓN
							<b>Provincial</b>									

	CONT-MP-022-2012	No Informado	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN - LA DESCUBIERTA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA BAHORUCO	2012		561,931,710.67	BAHORUCO	99.87%	561,183,512.42	FONDO GENERAL	100,000,000.00				BAHORUCO	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	0	0	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA	2013		62,328,845.78	BAHORUCO	93.08%	58,014,641.83	FONDO GENERAL	0.00				BAHORUCO	EJECUCIÓN	
							Municipio										
	15.00.59.0053	13257	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO	20.13	2017	63,012,087.72	MONTECRISTI	96.26%	60,654,775.86	FONDO GENERAL	8,617,883.70				MONTECRISTI	INAUGURADO	
							Provincial										
	15.00.97.0052	13842	HOSPITAL DE MANZANILLO	2016	2017	148,144,383.86	MONTECRISTI	89.02%	131,878,110.29	FONDO GENERAL	121,537,459.39				MONTECRISTI	INAUGURADO	
							Provincial										
	15.00.99.0051	13516	HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO	2016		97,790,443.83	MONTECRISTI	93.08%	91,020,454.13	FONDO GENERAL	84,421,648.06				MONTECRISTI	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	0	0	TERMINACIÓN VÍAS DE ACCESO Y ÁREAS EXTERIORES HOSPITAL DE MANZANILLO		2017	19,907,508.16	MONTECRISTI	87.97%	17,512,507.56	CAPTACION DIRECTA	0.00				MONTECRISTI	INAUGURADO	
							Municipio										

15.00.73.005 1	13518	HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	08/07/1 905		294,294,380. 07	SAN PEDRO	51.45%	151,404,212.2 8	FONDO GENERAL	70,773, 939.77				SAN PEDRO	EJECUCIÓ N
						Provincial									
CONT-FP- 146-2016	13518	EMERGENCIA MÓVIL HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA	2016		23,382,269. 81	SAN PEDRO	98.66%	23,069,974.11	FONDO GENERAL	19,631, 730.46				SAN PEDRO	TERMINAD O
						Municipal									
CONT-MP- 119-2013	No Inform ado	RECONSTRUCCI ON CAMINO VECINAL HATO DAMA II	2013	2017	61,333,613. 31	SAN CRISTÓBAL	59.80%	36,677,719.13	FONDO GENERAL	2,978,4 76.59				SAN CRISTÓBA L	TERMINAD O
						Provincial									
15.00.20.005 2	13241	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA			47,734,473. 64	SAN CRISTÓBAL	0.00%	0.00	FONDO GENERAL	18,311, 905.54				SAN CRISTÓBA L	EJECUCIÓ N
						Provincial									
15.00.28.005 2	13261	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA	2013	2017	58,946,614. 85	SAN CRISTÓBAL	94.38%	55,632,726.35	FONDO GENERAL	6,771,7 93.40				SAN CRISTÓBA L	INAUGURA DO
						Municipal									
15.00.24.005 1	13243	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN	2013	2017	56,079,123. 92	SAN CRISTÓBAL	97.04%	54,421,386.38	FONDO GENERAL	2,137,8 78.44				SAN CRISTÓBA L	INAUGURA DO
						Provincial									
15.00.25.005 1	13258	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA	2013		51,322,600. 96	SAN CRISTÓBAL	87.35%	44,827,877.78	FONDO GENERAL	386,10 1.93				SAN CRISTÓBA L	PARALIZA DO
						Provincial									

15.00.89.005 2	13533	HOSPITAL DE BARSEQUILLO	2016	2017	119,873,897. .45	SAN CRISTÓBAL	65.32%	78,300,506.88	FONDO GENERAL	46,392, 023.09				SAN CRISTÓBAL	INAUGURA DO
						Provincial									
0	0	EMERGENCIA 911, HOSPITAL JACINTO MAÑON	2016	2017	40,389,576. 70	SAN CRISTÓBAL	85.94%	34,708,984.00	FONDO GENERAL	0.00				SAN CRISTÓBAL	TERMINAD O
						Provincial									
15.00.89.005 1	13533	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	2016		353,382,594 .32	SAN CRISTÓBAL	76.28%	269,550,789.7 4	FONDO GENERAL	128,75 3,420.5 4				SAN CRISTÓBAL	EJECUCIÓ N
						Provincial									
CONT- FP- 076-2016	13533	UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA	2016		165,924,356 .51	SAN CRISTÓBAL	70.16%	116,406,026.2 7	FONDO GENERAL	75,783, 100.90				SAN CRISTÓBAL	EJECUCIÓ N
						Provincial									
SAN MIGUEL	No Inform ado	HABITACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA	2015		244,211,647 .95	LA VEGA	41.45%	101,450,497.4 5	FONDO GENERAL	42,785, 843.96				LA VEGA	EJECUCIÓ N
						Provincial									
0	0	CTC YERBA BUENA, JARABACOA	2013		10,691,867. 59	LA VEGA	42.63%	4,557,685.39	CAPTACIÓ N DIRECTA	0.00				LA VEGA	EJECUCIÓ N
						Provincial									
15.00.19.005 1	13252	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO	2013		72,143,127. 38	LA VEGA	55.25%	39,860,925.49	FONDO GENERAL	10,501, 153.99				LA VEGA	EJECUCIÓ N
						Provincial									
15.00.58.005 3	13280	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN	2013		59,031,613. 42	LA VEGA	87.54%	51,678,927.88	FONDO GENERAL	16,572, 826.78				JARABAC OA	PARALIZA DO



			PRIMARIA JARABACOA																																	
																		Provincial																		
15.00.88.005 1	13530	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	2016			280,439,238.03	LA VEGA	42.72%	119,811,572.60	FONDO GENERAL	358,393,153.84						LA VEGA	EJECUCIÓN																		
																		Provincial																		
15.00.88.005 4	13530	HOSPITAL PEDRO ANTONIO CÉSPEDES				232,716,597.74	LA VEGA	70.17%	163,299,252.50	FONDO GENERAL	117,995,530.42						LA VEGA	EJECUCIÓN																		
																		Provincial																		
15.00.88.005 3	13530	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA	2016			51,431,409.96	LA VEGA	0.00%	0.00	FONDO GENERAL	731,954.62						JARABACOA	PARALIZADO																		
																		Provincial																		
15.00.50.005 1	13275	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO	2013	2017		61,191,999.08	SÁNCHEZ RAMÍREZ	97.22%	59,489,421.04	FONDO GENERAL	5,850,255.72						MUNICIPIO FANTINO	INAUGURADO																		
																		Provincial																		
15.00.87.005 1	13534	HOSPITAL SIGFREDO ALBA DOMINGUEZ, FANTINO, COTUI	2016			297,186,802.93	SÁNCHEZ RAMÍREZ	60.06%	178,479,270.79	FONDO GENERAL	101,367,626.34						SÁNCHEZ RAMÍREZ	EJECUCIÓN																		
																		Provincial																		
15.00.87.005 2	13534	HOSPITAL VILLA LA MATA	2016			209,105,394.36	SÁNCHEZ RAMÍREZ	71.38%	149,258,617.30	FONDO GENERAL	90,139,755.80						SÁNCHEZ RAMÍREZ	EJECUCIÓN																		
																		Municipal																		
15.00.87.005 3	13534	HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUI	2016			276,787,046.86	SÁNCHEZ RAMÍREZ	45.03%	124,628,929.98	FONDO GENERAL	93,992,054.79						SÁNCHEZ RAMÍREZ	EJECUCIÓN																		
																		Provincial																		

	0	0	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) COTUI, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ	2007		11,746,104.56	SÁNCHEZ RAMÍREZ	77.81%	9,140,139.01	CAPTACIÓ N DIRECTA	0.00				SÁNCHEZ RAMÍREZ	EJECUCIÓ N	
							Municipal										
	0	0	RECONSTRUCCI ON CARRETERA CRUCE MAGUACA - EL LIMON-LOMA GALLINA, LA CUEVA-ZAMBRANA-EL COROZO, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, R.D.	2016		368,315,785.09	SÁNCHEZ RAMÍREZ	90.09%	331,833,849.36	CAPTACIÓ N DIRECTA	0.00				SÁNCHEZ RAMÍREZ	EJECUCIÓ N	
							Provincial										
	15.00.76.005 2	13521	HOSPITAL DR. JOSÉ PÉREZ DE DUVERGÉ			241,633,004.72	INDEPENDENCIA	45.43%	109,775,308.81	FONDO GENERAL	99,344,851.72				DUVERGÉ	PARALIZADO	
							Provincial										
	15.00.76.005 1	13521	HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA	2016		61,111,222.29	INDEPENDENCIA	93.76%	57,299,711.55	FONDO GENERAL	88,785,748.40				JIMANÍ	INAUGURADO	
							Provincial										
	15.00.29.005 1	13237	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS	2013		50,386,528.38	DUARTE	95.83%	48,287,830.05	FONDO GENERAL	7,946,007.63				SAN FRANCISCO	EJECUCIÓ N	
							Provincial										
	15.00.72.005 2	13517	HOSPITAL DE CASTILLO	2016		124,075,299.43	DUARTE	31.09%	13,501,587.03	FONDO GENERAL	78,431,541.39				SAN FRANCISCO	INAUGURADO	
							Provincial										

	LS-168-2011	No Informado	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE	2011		12,295,892.03	DUARTE	73.27%	9,009,472.00	FONDO GENERAL	914,655.40				SAN FRANCISCO	PARALIZADO	
							Provincial										
	FB-060-2007	No Informado	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	2007		10,813,113.87	DUARTE	99.15%	10,720,897.19	FONDO GENERAL	140,589.81				SAN FRANCISCO	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.53.0051	13250	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA TENARES	2013		66,025,712.47	HERMANAS MIRABAL	92.67%	61,188,212.93	FONDO GENERAL	16,503,973.81				HERMANAS MIRABAL	EJECUCIÓN	
							Provincial										
	15.00.45.0051	13249	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA	2013		47,734,473.64	AZUA	96.44%	46,036,401.79	FONDO GENERAL	1,601,342.00				AZUA	EJECUCIÓN	
							Municipal										
	FB-072-2009	No Informado	TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	2009		12,867,114.80	SAN JUAN DE LA MAGUANA	83.38%	10,728,127.01	FONDO GENERAL	1,305,323.58				SAN JUAN	EJECUCIÓN	

## **8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN**

<b>FUENTES</b>	<b>MONTOS</b>
Tesorería Nacional De La República Dominicana	12,381,727,194.00
Propios-Supervisión de Escuela	328,440,158.20
Propios-Supervisión. Estudios, Diseño y Publicidad	1,472,767,707.82
Otros	35,482,738.11
<b>Total Ingresos al 31-12-2017</b>	<b>14,218,417,798.13</b>
<b>Cuentas por Pagar al 31-12-2017</b>	<b>68,966,670.73</b>

## **9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO**

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad.

En nuestro país estamos trabajando arduamente para lograr éxitos notables en materia de reducción de la pobreza, empoderamiento de las mujeres y un mayor acceso a los servicios esenciales como educación, salud y agua potable. A medida que avanzamos y trabajamos en un gobierno inclusivo, vamos acumulando esfuerzos y una experiencia que puede ser utilizada con mayor énfasis para acelerar el progreso.

Los ODM proporcionan un marco a toda la comunidad nacional e internacional para trabajar juntos hacia un objetivo común, asegurándose de que el desarrollo humano llegue a todos en todas partes. República Dominicana junto a otros países pobres se han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con sistemas de salud y educación óptimos. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo.

La OISOE trabaja con la intención principal de realizar proyectos que contribuyan al cambio, a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, nacional y regional, medir el progreso hacia su logro y ayudar a nuestro gobierno a establecer la capacidad informática, las políticas y los programas necesarios para alcanzarlos y crear así calidad de vida digna para todos.

Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.

- **Objetivo 1:** Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- **Objetivo 2:** Lograr la enseñanza primaria universal.
- **Objetivo 3:** Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
- **Objetivo 4:** Reducir la mortalidad infantil.
- **Objetivo 5:** Mejorar la salud materna.
- **Objetivo 6:** Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- **Objetivo 7:** Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
- **Objetivo 8:** Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.



## **B. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES**

CP-002-2017	Adquisición de Computadora la Dirección de Fiscalización de esta Informática	RD\$912,549.40	CECONSA	ADJUDICADA
CP-004-2017	Contratación del Suministro de Almuerzo para las Áreas de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería de la OISOE	RD\$3,296,164.80	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ADJUDICADA
UR-002-2017	Construcción Hospital Regional San Vicente de Paul, San Francisco de Macorís. Prov. Duarte	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
OISOE-PEEX-001-2017	Adquisición de Bonos Navideños para los Empleados de la OISOE	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO

### 1. RESUMEN DE PROCESOS DE LICIT

**2. RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS,  
PROVEEDORES Y RUBROS-COMPRAS MENORES**

<b>Caratula</b>	<b>Contrato</b>	<b>Fecha Registro</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Rubros</b>	<b>Total</b>
Adquisición de Archivos de Metal para Sub Dirección Región Norte	OC-244-2017	07/08/2017	Suplidora Empresarial Martínez Suemma, SRL	Muebles y equipos de oficina	29,783.20
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD	OC-303-2017	05/10/2017	Pepe Duran, SRL	Telefonía y comunicaciones	15,769.99
Adquisición de Bonos por motivo al Día de las Madres.	OC-160-2017	29/05/2017	GRUPO RAMOS, SA	Alimentos y bebidas	1,500,000.00
Adquisición de Discos Duros y Alambre Telefónico Espirales	OC-236-2017	01/08/2017	Cecomsa, SRL	Informática	35,799.78
Adquisición de equipos fotográficos	OC-108-2017	30/03/2017	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	Ferretería	48,266.84
Adquisición de Impresora Multi Funcional a Color	OC-230-2017	31/07/2017	Cecomsa, SRL	Informática	21,170.29
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	OC-222-2017	24/07/2017	Clickteck, SRL	Informática	12,640.83
Adquisición de materiales de plomería para uso de esta institución.	OC-306-2017	09/10/2017	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	Ferretería	16,719.91
Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta Institución.	OC-228-2017	31/07/2017	ILC Office Supplies, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	34,912.35

Adquisición de Scanner para uso de la Dirección Financiera y Administra	OC-217-2017	18/07/2017	Cecomsa, SRL	Informática	17,589.65
Adquisición de tóner para uso de la Dirección de Licitación.	OC-314-2017	11/10/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	52,864.00
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INFORMÁTICA.	OC-304-2017	06/10/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Informática	59,472.00
Adquisición de Toners para uso de esta Institución.	OC-274-2017	12/09/2017	Multiservicios Nivar, SRL	Suministros de oficina	78,201.91
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES BALASTROS	OC-309-2017	10/10/2017	Perseus Comercial, SRL	Ferretería	16,941.57
Adquisición de uniformes para uso del personal de la Recepción	OC-317-2017	17/10/2017	Suplidora Leopeña, SRL	Textil, indumentaria, art.pers	82,246.00
Adquisición de UPS para uso de esta institución.	OC-308-2017	10/10/2017	Clickteck, SRL	Suministros de oficina	63,692.15
Adquisición Muebles de Oficina para uso de esta Institución.	OC-242-2017	04/08/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	23,418.26
Adquisición Muebles de Oficina para uso de esta Institución.	OC-243-2017	07/08/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	4,477.39
Almuerzo para 1ra quincena correspondiente al mes de Abril/17	OC-184-2017	23/06/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	418,003.20
Almuerzo para 1ra quincena correspondiente al mes de Marzo/17	OC-99-2017	23/03/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	517,878.40
Almuerzo para 2da quincena correspondiente al mes de Abril/17	OC-211-2017	13/07/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	504,284.80
Almuerzo para la 1ra quincena del mes de Enero/17.	OC-30-2017	23/01/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	446,323.20

Almuerzo para la 1ra quincena del mes de Feb/17.	OC-60-2017	22/02/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	541,478.40
Almuerzo para la segunda quincena del mes de Dic/16.	OC-9-2017	10/01/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	526,940.80
Almuerzo para la segunda quincena del mes de Enero/17.	OC-47-2017	03/02/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	558,659.20
Almuerzo para la segunda quincena del mes de Feb/17.	OC-81-2017	09/03/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	409,696.00
Almuerzo para la segunda quincena del mes de Marzo/17.	OC-127-2017	25/04/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	567,344.00
Almuerzo para los primeros días del mes de Mayo/17.	OC-199-2017	06/07/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	347,769.60
Almuerzos 2da Quincena Mayo/17 y 1era Quincena Junio/17	OC-213-2017	14/07/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	587,168.00
ALQUILER DE LUMINARIAS PARA EL MES CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	OC-331-2017	30/10/2017	LIGHTS MUSIC SERVICES, SRL	Alquileres	230,003.71
Boleto Aéreo y estadía en San José Costa Rica para la Arq. Fatima Ortiz	OC-172-2017	08/06/2017	GESTIONES TURÍSTICAS, SRL	Transporte de pasajeros	44,486.31
Cable de Red para uso de esta institución	OC-59-2017	20/02/2017	Cecomsa, SRL	Equipo informático y accesorios	9,799.99
Chequeo del minibúsHyundai asignado a la Dirección de Licitaciones.	OC-142-2017	12/05/2017	Magna Motors, SA		36,577.10
Combustible Diesel para Proyecto: San Francisco de MACORÍS, Nagua	OC-279-2017	18/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,585,000.00
Combustible para caminos vecinales San Francisco, Nagua.	OC-256-2017	22/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,490,000.00

Combustible para el proyecto San Francisco, Nagua.	OC-276-2017	14/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,545,000.00
Combustible para el proyecto San Francisco, Nagua.	OC-324-2017	23/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	777,500.00
Combustible para ser utilizado en la planta del capa, San Juan de la M	OC-301-2017	02/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	1,595,000.00
Combustible para ser utilizado en la planta del capa, San Juan de la M	OC-56-2017	17/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	1,530,000.00
Combustible para ser utilizado en la Planta Sánchez Ramírez.	OC-325-2017	23/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,555,000.00
Combustible para ser utilizados en la rehabilitación de los caminos V.	OC-12-2017	12/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	1,540,000.00
Combustible para ser utilizados en la rehabilitación de los caminos V.	OC-14-2017	12/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	770,000.00
Combustible para ser utilizados en la rehabilitación de los caminos V.	OC-255-2017	22/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	2,980,000.00
Compra compresor para los Dpto. de Activo fijo y Financiero	OC-22-2017	18/01/2017	Refricentro Internacional, SRL	Ferretería y pintura	48,450.00
Compra de Aires Acondicionado y Compresor de Aire para uso de esta Institución	OC-83-2017	10/03/2017	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	Ferretería	75,400.03
Compra de Alfombra y aceitera para el ascensor de esta institución.	OC-25-2017	19/01/2017	Electra Elevators And Escalators, EIRL	Ferretería	12,744.00
Compra de Ambientadores y Desinfectantes.	OC-147-2017	17/05/2017	Centro Cuesta Nacional, SAS	Art. limpieza, higiene, cocina	16,843.32
Compra de Archivo y Sillón Ejecutivo para uso de esta Institución.	OC-113-2017	31/03/2017	B&H MOBILIARIO, SRL	Muebles y equipos de oficina	60,984.30
Compra de Archivos para uso de esta Institución.	OC-273-2017	12/09/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	25,558.09

Compra de artículos de cocina	OC-33-2017	24/01/2017	La Innovación, SRL	Art. limpieza, higiene, cocina	23,481.00
Compra de Artículos para Mantenimiento de Planta Eléctrica.	OC-50-2017	07/02/2017	ARGICO, SAS	Maquinarias	20,935.56
Compra de batería para la Nissan n. asignada a la sub-dirección norte	OC-153-2017	17/05/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	5,785.54
Compra de Batería para Vehículo de esta Institución.	OC-263-2017	28/08/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	11,927.44
Compra de Batería para Vehículo de esta Institución.	OC-310-2017	10/10/2017	Ohtsu del Caribe, SRL	Componentes de vehículos	15,255.01
Compra de baterías para los vehículos de esta Institución.	OC-4-2017	06/01/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	11,720.94
Compra de Baterías y Gomas para Vehículos de esta Institución.	OC-289-2017	27/09/2017	Ohtsu del Caribe, SRL	Componentes de vehículos	87,402.66
Compra de Calculadoras para ser utilizadas por esta Institución	OC-18-2017	17/01/2017	Cecomsa, SRL	Suministro de oficina	13,800.02
Compra de cámaras digitales para uso del Dpto. de Fiscalización.	OC-105-2017	28/03/2017	Cecomsa, SRL		42,750.04
Compra de Carpetas para uso de esta Institución.	OC-157-2017	25/05/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	62,009.00
Compra de Carpetas y Tornillos para uso de esta Institución.	OC-182-2017	14/06/2017	IMPRESOS DINÁMICOS, SRL	Suministro de oficina	171,572.00
Compra de Cartuchos de Tinta Para Proyecto Ciudad Sanitaria	OC-241-2017	03/08/2017	Clickteck, SRL	Suministro de oficina	24,278.64
Compra de Combustible para Acondicionamiento y Rehabilitación de Caminos	OC-54-2017	13/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,530,000.00

Vecinales Zona Noroeste					
Compra de Combustible para el Instituto Duartiano	OC-53-2017	10/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	76,500.00
Compra de Combustible para la Autopista San Isidro	OC-85-2017	14/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,530,000.00
Compra de Combustible para la Planta El Capa, San Juan de la Maguana	OC-86-2017	14/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,530,000.00
Compra de Componentes de Vehículos para uso de esta Institución.	OC-77-2017	03/03/2017	HYL, SA	Combustibles	59,816.01
Compra de Componentes para Reparación de Aires Acondicionados	OC-118-2017	31/03/2017	Romaca Industrial, SA	Ferretería	40,879.95
Compra de Componentes para Reparación de Aires Acondicionados	OC-149-2017	17/05/2017	Romaca Industrial, SA	Ferretería	16,999.99
Compra de Compresor para ser instalado en el Edificio III	OC-281-2017	19/09/2017	REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA	Ferretería	5,795.00
Compra de Escalera y Escobilla para uso de esta Institución.	OC-141-2017	11/05/2017	ALMACENES UNIDOS, SAS	Ferretería	9,573.98
Compra de Galones de Gasoil para Reparación en Carreteras de San José	OC-154-2017	19/05/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,410,000.00
Compra de Gomas para Vehículo de esta Informática.	OC-109-2017	30/03/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Componentes de vehículos	74,005.50
Compra de Gomas para Vehículo de esta Informática.	OC-151-2017	17/05/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	23,510.32
Compra de Gomas para Vehículo de esta Informática.	OC-240-2017	03/08/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	60,321.60
Compra de Gomas para Vehículo de esta Informática.	OC-258-2017	22/08/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	54,062.88



Compra de Gomas para Vehículo de esta Informática.	OC-40-2017	01/02/2017	HYL, SA	Componentes de vehículos	79,950.00
Compra de Gomas y Batería para Vehículo de esta Informática.	OC-170-2017	02/06/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	31,231.06
Compra de Gomas y Batería para Vehículo de esta Informática.	OC-206-2017	11/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	38,602.52
Compra de Gomas y Batería para Vehículo de esta Informática.	OC-214-2017	14/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	69,361.58
Compra de Gomas y Batería para Vehículo de esta Informática.	OC-226-2017	27/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	59,848.42
Compra de gomas y baterías para los vehículos de esta Institución.	OC-180-2017	14/06/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Componentes de vehículos	32,816.98
Compra de Gomas y Baterías para Vehículos de esta Informática.	OC-78-2017	03/03/2017	Ohtsu del Caribe, SRL	Componentes de vehículos	31,193.70
Compra de llavines, Rep. de muebles y tapizado.	OC-104-2017	28/03/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	90,211.00
Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta Informática.	OC-318-2017	17/10/2017	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	Art. limpieza, higiene, cocina	53,736.02
Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.	OC-23-2017	19/01/2017	GRUPO RAMOS, SA	Art. limpieza, higiene, cocina	26,629.68
Compra de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.	OC-88-2017	16/03/2017	Plaza Lama, SA	Art. limpieza, higiene, cocina	13,990.44
Compra de Materiales de Oficina para uso de Fiscalización de Obras	OC-248-2017	14/08/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	16,312.32

Compra de Materiales para Reparación Compresor de Aire del Edif. III	OC-264-2017	30/08/2017	REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA	Ferretería	33,966.30
Compra de mobiliarios de oficina para uso del personal del CODIA	OC-188-2017	27/06/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	34,638.19
Compra de Monitor para la Sub-Dirección de Cubicaciones.	OC-201-2017	06/07/2017	Clickteck, SRL	Informática	7,232.08
Compra de Monitores para uso de esta Informática.	OC-254-2017	21/08/2017	Clickteck, SRL	Informática	53,959.45
Compra de Nevera Ejecutiva para uso del Depto. de Transportación.	OC-55-2017	16/02/2017	ALMACENES UNIDOS, SAS	Artículos del hogar	8,945.00
Compra de Papel Higiénico Jumbo	OC-171-2017	06/06/2017	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	Art. limpieza, higiene, cocina	76,700.00
Compra de papel para plotter y tinta para uso del Dpto. de Diseño.	OC-260-2017	23/08/2017	Clickteck, SRL	Suministro de oficina	60,380.88
Compra de Picaderos y Jugos para Taller Ley 340-06 de Compras	OC-48-2017	03/02/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	11,210.00
Compra de Plotter y Tinta para el Dpto. de diseño	OC-27-2017	20/01/2017	Cecomsa, SRL	Informática	300,532.65
Compra de Puerta en Caoba para Salón de Conferencia	OC-210-2017	12/07/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Puertas y ventanas y vidrio	19,824.00
Compra de Reflectores LED para Iluminación de esta Institución.	OC-112-2017	31/03/2017	Tecnoelite, SRL	Iluminación, artefactos y accesorios	240,720.00
Compra de resmas para uso de esta informática	OC-249-2017	14/08/2017	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	Suministros de oficina	76,346.00
Compra de sillón y silla secretarial	OC-95-2017	21/03/2017	Mobiliario Premium de Oficina RGCM, SRL	Muebles y equipos de oficina	16,760.34
Compra de Sillones Ejecutivos para Unidad Revisa y Libre Acceso	OC-257-2017	22/08/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	35,872.00

Compra de Sillones para uso de la Dirección de Planificación.	OC-285-2017	25/09/2017	Actualidades VD, SRL	Muebles y equipos de oficina	71,897.40
Compra de Sillones Secretariales para esta Institución.	OC-312-2017	10/10/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Muebles y equipos de oficina	22,420.00
Compra de Suministros de Oficina para uso de esta Institución.	OC-333-2017	30/10/2017	ILC Office Supplies, SRL	Suministro de oficina	51,807.64
Compra de Suministros de Oficina para uso de esta Institución.	OC-62-2017	22/02/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	38,350.00
COMPRA DE TALONARIOS DE GASTOS PARA USO DE ESTA INFORMÁTICA.	OC-271-2017	08/09/2017	Quirico Neón, SRL	Suministros de oficina	18,172.00
Compra de Tóner para ser utilizado por esta Informática.	OC-262-2017	25/08/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	21,476.00
Compra de Tóner para ser utilizado por esta Informática.	OC-287-2017	26/09/2017	ILC Office Supplies, SRL	Suministro de oficina	35,667.01
Compra de Tóner para ser utilizado por la Dirección de Licitaciones.	OC-237-2017	02/08/2017	Multiservicios Nivar, SRL	Suministros de oficina	12,021.25
Compra de tóner para ser utilizado por la Dirección General.	OC-159-2017	29/05/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministro de oficina	37,760.00
Compra de Tóner para ser utilizados por la Sub. Dirección Región Sur.	OC-246-2017	08/08/2017	Multiservicios Nivar, SRL	Suministro de oficina	21,900.80
Compra de Tóner para uso de la Dirección Financiera.	OC-284-2017	25/09/2017	ILC Office Supplies, SRL	Suministros de oficina	6,844.00
Compra de Tóner para uso de la Dirección General	OC-247-2017	14/08/2017	Clickteck, SRL	Suministros de oficina	19,731.73
Compra de Toners para el uso de esta Institución.	OC-329-2017	27/10/2017	Multiservicios Nivar, SRL	Alquileres	383,056.32
Compra de Toners para el	OC-332-2017	30/10/2017	Multiservicios Nivar, SRL	Suministros de oficina	21,726.16

uso de esta Institución.					
Compra de toners para ser utilizados por esta Institución.	OC-49-2017	07/02/2017	Distosa, SRL	Informática	21,916.47
Compra de toners para varios Dpto de la informática	OC-116-2017	31/03/2017	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	Informática	24,479.95
Compra de toners para varios Dpto de la informática	OC-41-2017	01/02/2017	OMEGA TECH, SA	Suministros de oficina	101,623.93
COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INFORMÁTICA.	OC-143-2017	12/05/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	424,725.66
Compra de UPS para ser utilizados en diferentes áreas de esta inst.	OC-202-2017	10/07/2017	Clickteck, SRL	Informática	30,615.93
Compra de UPS para ser utilizados en diferentes áreas de esta inst.	OC-90-2017	16/03/2017	OMEGA TECH, SA	Informática	65,574.96
Compra e instalación de Tarja para el Centro Tecnológico de JIMANÍ	OC-21-2017	18/01/2017	METALGRAF, SRL	Construcción y edificación	28,320.00
Compra Mapa de División Política República Dominicana	OC-150-2017	17/05/2017	FUNDACIÓN DOMINICANA MUSEO DEL MAPA, INC	Imprenta y publicaciones	18,000.00
Compresor, varilla y gas para el aire de la Dirección General	OC-183-2017	14/06/2017	Refricentro Internacional, SRL	Ferretería	47,550.00
Confeción de Letrero con Logo y Letras para la Recepción de Edif. IV	OC-24-2017	19/01/2017	Investigación y Públicos INPUBLICOS, SRL	Publicidad	37,760.00
Equipos de oficina para ser utilizados en el Dpto. de Diseño.	OC-178-2017	14/06/2017	Mobiliario Premium de Oficina RGCM, SRL	Suministro de oficina	39,895.54
Equipos de oficina para ser utilizados en la Dirección de Edificación	OC-152-2017	17/05/2017	B&H MOBILIARIO, SRL	Suministros de oficina	56,274.37

Equipos para las tasaciones que realiza la informática	OC-16-2017	13/01/2017	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	Ferretería y pintura	44,540.86
Equipos para trabajo de modernización Área de Archivo de consultoría	OC-97-2017	23/03/2017	Cecomsa, SRL	Informática	83,164.93
Replacements lamp para el proyector del auditorio de esta Institución	OC-29-2017	20/01/2017	Cecomsa, SRL	Informática	26,534.21
Escáner para el trabajo de modernización del área de archivo	OC-96-2017	22/03/2017	Simpapel, SRL	Informática	73,128.85
Estudio Geotécnico-Geológico en la Ciudad de Juan Bosch, Santiago	OC-120-2017	03/04/2017	SONNIA MERCEDES FRANCO CASTILLO	Servicios profesionales de ingeniería	618,461.60
Fardos de papel Jumbo para uso de la informática.	OC-323-2017	23/10/2017	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	Art. limpieza, higiene, cocina	61,360.00
Gasoil para el proyecto San Francisco de Macorís, Nagua.	OC-316-2017	13/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,555,000.00
Gasoil para la planta del Capas, San Juan de la Maguana.	OC-239-2017	03/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	1,764,000.00
Gasoil para ser utilizado en la Planta Eléctrica de Emergencia	OC-218-2017	20/07/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	213,000.00
Gasoil para ser utilizado en la planta eléctrica de la sede principal	OC-36-2017	27/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	135,900.00
Herramientas para ser utilizada en la Rep. de equipos de esta inst.	OC-84-2017	10/03/2017	La Innovación, SRL	Ferretería	9,246.99
Impresión y Empastado para las memorias de Rendición de Cuenta 2016	OC-17-2017	13/01/2017	GRUPO ASTRO, SRL	Imprenta y publicaciones	23,526.00
Kerosén para ser utilizado en la planta del capas San Juan de la M	OC-57-2017	17/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	705,000.00

Laminado Frosty para las puertas de Fiscalización, Edif IV	OC-79-2017	08/03/2017	INTERDECO, SRL	Puertas y ventanas y vidrio	30,641.65
Lavado, engrase y sopeteo de los vehiculos de esta informática.	OC-191-2017	27/06/2017	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLÍMPICA, SRL	Lanzadores	12,722.29
Limpieza y desinsectación para la cisterna del Hosp. Ney Arias Lora.	OC-265-2017	30/08/2017	AQUA MASTER CORPORATION, SRL		541,395.80
Llenado de los botellones de agua de esta informática	OC-144-2017	16/05/2017	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bebidas	33,600.00
Llenado de los botellones de agua de esta informática	OC-38-2017	01/02/2017	AGUA PLANETA AZUL, SA	Bebidas	33,600.00
Mant. de la Nissan Frontier asignada a Sub. Dirección Edif. Salud	OC-275-2017	13/09/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	15,372.28
Mant. y Reparación de los Vehículos de esta informática.	OC-225-2017	25/07/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	95,580.00
Mant. y Reparación de los Vehículos de esta informática.	OC-250-2017	21/08/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	89,031.00
Mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier asignada a transportación	OC-106-2017	29/03/2017	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	45,430.00
Mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier de la Sub. Dirección R.	OC-266-2017	30/08/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	4,019.67
Mantenimiento de la Nissan Frontier asignada a Edificaciones de Salud.	OC-158-2017	26/05/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	4,486.01
Mantenimiento de la Nissan Frontier asignada al Dpto de Diseño	OC-251-2017	21/08/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	13,723.08
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-128-2017	26/04/2017	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	32,485.40
Mantenimiento de los vehículos	OC-137-2017	02/05/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	15,332.20

de esta institución.					
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-145-2017	17/05/2017	OM Car Dominicana, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	41,005.00
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-161-2017	31/05/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	6,770.76
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-177-2017	14/06/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	2,890.07
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-187-2017	27/06/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	10,395.78
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-189-2017	27/06/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	97,497.50
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-203-2017	10/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	11,219.55
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-231-2017	31/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	11,294.83
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-277-2017	14/09/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	18,540.52
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-282-2017	19/09/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	17,932.99
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-320-2017	18/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	11,129.76
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-321-2017	19/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	10,488.90
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-327-2017	25/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	12,559.92
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-34-2017	25/01/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	16,075.14
Mantenimiento de los vehículos de esta institución.	OC-63-2017	23/02/2017	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	128,555.10
Mantenimiento de los vehículos	OC-64-2017	23/02/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Maletas, bolsos de	27,928.24

de esta institución.				mano, mochilas y estuches	
Mantenimiento de Planta Eléctrica de esta Institución.	OC-181-2017	14/06/2017	SERVICIOS ELECTROMECAÁNICOSA LCÁNTARA, SRL	Maquinarias	81,684.32
Mantenimiento de un vehículo de esta institución.	OC-197-2017	04/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	13,088.54
Mantenimiento del vehículo asignado a Sub. Dirección R. Norte	OC-305-2017	06/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	11,802.24
Mantenimiento del vehículo de esta institución.	OC-162-2017	01/06/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	13,797.06
Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	OC-111-2017	30/03/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	14,757.39
Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	OC-119-2017	03/04/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	30,983.95
Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	OC-126-2017	05/04/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	12,915.41
Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	OC-156-2017	25/05/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	90,447.00
Mantenimiento General de Vehículos de esta Institución.	OC-52-2017	09/02/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	41,085.60
Mantenimiento para el vehículo asignado a la Arq. Victoria.	OC-307-2017	09/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	4,126.35
Mantenimiento para el vehículo asignado al Arq. Tony Cruz	OC-315-2017	12/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	14,913.36
Mantenimiento y Rep. de Sillones ubicado en la Dirección Técnica.	OC-259-2017	22/08/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Serv. mantenimiento y limpieza	47,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS	OC-302-2017	04/10/2017	Distosa, SRL	Informática	25,121.16
Mantenimiento y Reparación de Muebles de	OC-253-2017	21/08/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Servicios de mantenimiento y	56,935.00



Oficia de esta Institución.				reparaciones de construcciones e instalaciones	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INFORMÁTICA	OC-313-2017	10/10/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	48,144.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INFORMÁTICA	OC-326-2017	24/10/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	7,901.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA INFORMÁTICA	OC-330-2017	27/10/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	29,682.51
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-129-2017	26/04/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	54,057.61
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-130-2017	28/04/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	78,218.51
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-131-2017	28/04/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	80,594.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-167-2017	01/06/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	13,396.54
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-173-2017	09/06/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	22,075.92
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-174-2017	13/06/2017	Sergio Augusto Nova Méndez	Mant. y Rep. Vehículos	90,683.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-215-2017	17/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	26,129.21
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-219-2017	20/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	5,945.56
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-220-2017	24/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	13,460.26

Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-221-2017	24/07/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	23,128.47
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-223-2017	25/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	5,676.51
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-227-2017	28/07/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	15,232.68
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-252-2017	21/08/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	23,798.01
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-278-2017	15/09/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	21,984.58
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-288-2017	27/09/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	20,047.57
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-39-2017	01/02/2017	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	Mant. y Rep. Vehículos	86,305.20
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-93-2017	17/03/2017	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	Mant. y Rep. Vehículos	53,666.41
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.	OC-94-2017	20/03/2017	Manuel Arsenio Ureña, SA	Mant. y Rep. Vehículos	20,219.77
Materiales de aires acondicionados para uso de esta informática.	OC-283-2017	25/09/2017	REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA	Suministros de oficina	71,715.64
Materiales de Limpieza para uso de esta institución	OC-216-2017	17/07/2017	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	Art. limpieza, higiene, cocina	53,736.02
Materiales de oficina para el Dpto. de Salud.	OC-229-2017	31/07/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministro de oficina	61,194.80
materiales de oficina para la preparación de expedientes.	OC-80-2017	08/03/2017	Ghanem, SRL	Suministros de oficina	8,750.01
Materiales de oficina para uso del Dpto. de Fiscalización	OC-42-2017	02/02/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	20,060.00
Materiales eléctricos para uso de esta institución	OC-70-2017	02/03/2017	Ferretería Popular, SRL	Ferretería	36,875.47

Materiales eléctricos para uso de esta institución	OC-71-2017	02/03/2017	La Innovación, SRL	Ferretería	84,700.14
Materiales gastables para el CODIA, para realizar los trabajos	OC-15-2017	13/01/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministro de oficina	40,281.60
Materiales gastables para uso de esta informática.	OC-132-2017	02/05/2017	Dies Trading, SRL	Suministro de oficina	57,790.50
Mouse, teclado y cables para uso de esta institución	OC-35-2017	27/01/2017	Cecomsa, SRL	Informática	38,750.02
Nevera ejecutiva para el Dpto. Tecnología y Sistema	OC-204-2017	10/07/2017	ALMACENES UNIDOS, SAS	Artículos del hogar	8,945.00
Papel Bond 81/2x11 para ser utilizado en esta institución.	OC-92-2017	16/03/2017	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	Suministro de oficina	73,750.00
Pastelitos para brindar en la Informática por el día del Servidor pu.	OC-32-2017	24/01/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	38,232.00
Pintura de Muebles de oficinas de la Dirección de RRHH	OC-28-2017	20/01/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Muebles y equipos de oficina	37,170.00
Pizarra rotulable para uso del Dpto de planificación	OC-140-2017	05/05/2017	Eventos y Servicios Veralee, SRL	Suministros de oficina	14,520.00
Publicación en medio nacional de la inauguración de la Nueva Barquita.	OC-207-2017	11/07/2017	Editora Hoy, SAS	Imprenta y publicaciones	391,665.60
Publicación en medio nacional de la inauguración de la Nueva Barquita.	OC-208-2017	11/07/2017	PUBLICACIONES AHORA, SAS	Imprenta y publicaciones	170,486.40
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-290-2017	29/09/2017	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Imprenta y publicaciones	74,552.40
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN	OC-291-2017	29/09/2017	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Imprenta y publicaciones	74,552.40

MEDIO IMPRESO NACIONAL					
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-292-2017	29/09/2017	Editora Hoy, SAS	Imprenta y publicaciones	67,260.00
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-293-2017	29/09/2017	Editora Hoy, SAS	Imprenta y publicaciones	67,260.00
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-294-2017	29/09/2017	EDITORA EL CARIBE, SA	Imprenta y publicaciones	78,536.08
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-295-2017	29/09/2017	Editora Listín Diario, SA	Imprenta y publicaciones	55,436.40
PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL	OC-296-2017	29/09/2017	Editora Listín Diario, SA	Imprenta y publicaciones	55,436.40
Reparación de compresor de 25 toneladas ubicado en el edificio III	OC-198-2017	05/07/2017	REFRI-DARWIN, SRL	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	17,700.00
Reparación de Fotocopiadora asignada a la Dirección Técnica	OC-102-2017	24/03/2017	Distosa, SRL	Informática	30,729.56
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	OC-319-2017	17/10/2017	Distosa, SRL	Informática	17,329.20

Reparación de fotocopiadora multifuncional asignada a la Dirección G.	OC-224-2017	25/07/2017	Distosa, SRL	Informática	6,633.87
Reparación de Fotocopiadoras	OC-168-2017	01/06/2017	Distosa, SRL	Informática	57,158.87
Reparación de Impresoras Asignadas a Varios Departamentos.	OC-11-2017	11/01/2017	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	Informática	13,358.78
Reparación de las fotocopiadoras asignadas a licitación y Dpto. Tesorería	OC-65-2017	28/02/2017	Distosa, SRL	Informática	14,903.40
Reparación de los sillones de la recepción y el Dpto de Acceso	OC-68-2017	02/03/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Inmuebles	9,204.00
Reparación de los sillones de la recepción y el Dpto de Acceso	OC-69-2017	02/03/2017	NELCASA, SRL	Inmuebles	63,720.00
Reparación de sillas semi ejecutivas pertenecientes a la sub-dirección	OC-107-2017	29/03/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	34,574.00
Reparación Interconexión Eléctrica del Multiuso de Jánico	OC-82-2017	10/03/2017	SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ALCÁNTARA, SRL	Ferretería	767,991.71
REPARACIÓN MUEBLES DE OFICINA DE ESTA INFORMÁTICA.	OC-280-2017	19/09/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Muebles y equipos de oficina	87,084.00
Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadoras Multifuncionales	OC-19-2017	17/01/2017	Distosa, SRL	Informática	63,117.74
Reparación y pintado de una credenza y dos escritorios de esta inst.	OC-114-2017	31/03/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	20,060.00

Resma de papel, para uso de esta institución.	OC-169-2017	02/06/2017	Industria de Sobres Dominicanos, SRL	Suministro de oficina	99,267.50
Resma de papel, para uso de esta institución.	OC-322-2017	19/10/2017	ILC Office Supplies, SRL	Suministros de oficina	94,105.00
Scanner y UPS para ser utilizado por el Dpto de auditoría de esta inst.	OC-121-2017	04/04/2017	Simpapel, SRL	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	88,563.89
Servicio de catering para curso de educación vial en esta informática.	OC-91-2017	16/03/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	26,550.00
Servicio de catering para la cobertura del gobierno de la mañana en la	OC-67-2017	02/03/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	60,770.00
Servicio de Catering para taller de ética pública.	OC-100-2017	23/03/2017	Cultura Culinaria by Lourdes Zarzuela, SRL	Alimentos y bebidas	31,860.00
Servicio de Catering Programa Especial Z101 Maternidad Los Minas	OC-261-2017	25/08/2017	Varga' S Servicios de Catering, SRL	Protocolo	38,314.60
Servicio de correo informática para cumplir necesidades.	OC-334-2017	31/10/2017	RUBYCOM, SRL	Equipo informático y accesorios	99,250.27
Servicio de Ebanistería Para Trabajos en esta Institución.	OC-175-2017	14/06/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Serv. mantenimiento y limpieza	37,701.00
Servicio de Ebanistería Para Trabajos en esta Institución.	OC-245-2017	08/08/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Serv. mantenimiento y limpieza	48,380.00
Servicio de fumigación contra comején de los Edificios I, II y III	OC-87-2017	16/03/2017	GRUPO DISLA CABRERA, SRL	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	98,766.00
Servicio de mantenimiento del ups datacenter asignado a Tecnología.	OC-37-2017	27/01/2017	Unidad Tecnológica Dominicana, SRL	Informática	12,216.54

Servicios de Lavado para Vehículos de esta Institución.	OC-311-2017	10/10/2017	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLÍMPICA, SRL	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	4,661.00
Servicios de limpieza y desinfección de cisternas de esta Informática	OC-209-2017	12/07/2017	El Relámpago Limpieza de Cisternas y Plomería en General, SRL	Serv. mantenimiento y limpieza	9,912.00
Servilletas y papel toalla para ser utilizado en las Direcciones	OC-26-2017	19/01/2017	CASA EVELYN, SRL	Art. limpieza, higiene, cocina	21,200.00
Sillas para ser utilizadas en la celebración de misas.	OC-205-2017	10/07/2017	Pricesmart Dominicana, SRL	Muebles y mobiliario	44,998.71
Sillón y Sillas secretariales para uso de diferentes Dpto de esta inst	OC-61-2017	22/02/2017	Mobiliario Premium de Oficina RGCM, SRL	Muebles y equipos de oficina	25,755.93
Solicitud de compra de sellos para los Dpto de Unidad Revisora y Compr	OC-3-2017	06/01/2017	Importadora Doppel, SRL	Suministros de oficina	14,160.00
Solicitud de Reparación de Plotter Asignado a la Dirección de Salud	OC-2-2017	06/01/2017	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	Informática	49,374.74
Solicitud Llenado de Botellones de Agua de esta Informática.	OC-101-2017	24/03/2017	AGUA PLANETA AZUL, SA	Alimentos y bebidas	33,600.00
Solicitud Mantenimiento de Ascensor y Puertas de Sótano	OC-110-2017	30/03/2017	PG Comercial, SRL	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	134,874.00
Solicitud Servicio de Correo Informática para Cumplir Necesidades.	OC-51-2017	08/02/2017	RUBYCOM, SRL	Informática	98,250.26
Tapizado y reparación de sillones asignados a varios Dpto. de esta ins	OC-89-2017	16/03/2017	CRISTINO RODRÍGUEZ PEREZ	Muebles y equipos de oficina	81,420.00

Teléfonos IP para el proceso de cambio de la central telefónica.	OC-155-2017	23/05/2017	Cecomsa, SRL	Suministros de oficina	13,036.51
Ticket de Combustible Prepagado Camionetas Agosto/17	OC-232-2017	01/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Ticket de Combustible Prepagado Dirección General Agosto/17	OC-235-2017	01/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Ticket de Combustible Prepagado Edificaciones Escolares Agosto/17	OC-233-2017	01/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Ticket de Combustible Prepagado Informática Agosto/17	OC-234-2017	01/08/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets para uso de la camioneta Octubre/17	OC-298-2017	02/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Abril/17	OC-125-2017	04/04/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Enero/17	OC-8-2017	06/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Febrero/17	OC-43-2017	02/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Junio/17	OC-165-2017	01/06/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Marzo/17	OC-74-2017	02/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00
Tickets Prepagados Combustible Camionetas Mayo/17	OC-134-2017	02/05/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00



Tickets Prepagados Combustible Dir. General Abril/17	OC-123-2017	04/04/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Dir. General Enero/17	OC-6-2017	06/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Dir. General Febrero/17	OC-44-2017	02/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Dir. General Junio/17	OC-164-2017	01/06/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Dir. General Marzo/17	OC-76-2017	02/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Dir. General Mayo/17	OC-136-2017	02/05/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Abril/17	OC-122-2017	04/04/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Enero/17	OC-5-2017	06/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Febrero/17	OC-45-2017	02/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Junio/17	OC-166-2017	01/06/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Marzo/17	OC-73-2017	02/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Edif. Escolares Mayo/17	OC-135-2017	02/05/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets Prepagados Combustible Informática Abril/17	OC-124-2017	04/04/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00

Tickets Prepagados Combustible Informática Enero/17	OC-7-2017	06/01/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets Prepagados Combustible Informática Febrero/17	OC-46-2017	02/02/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets Prepagados Combustible Informática Junio/17	OC-163-2017	01/06/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets Prepagados Combustible Informática Marzo/17	OC-75-2017	02/03/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets Prepagados Combustible Informática Mayo/17	OC-133-2017	02/05/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets de combustible para el Dpto. de Edificaciones Esc. julio/17	OC-196-2017	03/07/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	520,000.00
Tickets de combustible para el Dpto. de Edificaciones Esc. Octubre/17	OC-299-2017	02/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets de combustible para el Dpto. de Edificaciones Esc. Sept/17	OC-270-2017	01/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	520,000.00
Tickets de combustible para la Dirección General julio/17	OC-195-2017	03/07/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	204,000.00
Tickets de combustible para la Dirección General Octubre/17	OC-300-2017	02/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets de combustible para la Dirección General Sept/17	OC-269-2017	01/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	204,000.00
Tickets de combustible para las camionetas julio/17	OC-193-2017	03/07/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	100,000.00
Tickets de combustible para las camionetas Sept/17	OC-268-2017	01/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	100,000.00

Tickets de combustible para uso de la informática julio/17	OC-194-2017	03/07/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles y lubricantes	889,000.00
Tickets de combustible para uso de la informática Octubre/17	OC-297-2017	02/10/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tickets de combustible para uso de la informática Sept/17	OC-267-2017	01/09/2017	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	Combustibles	889,000.00
Tóner para ser utilizados en Diferentes Dpto. de esta Informática.	OC-58-2017	20/02/2017	Cecomsa, SRL	Informática	39,555.00
Trabajo de limpieza de séptico y filtrante del Hospital de Constanza.	OC-200-2017	06/07/2017	AQUA MASTER CORPORATION, SRL	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	325,042.80
UC-CD-2017-0009, Materiales para medición de campo.	OC-138-2017	04/05/2017	LA CASA DEL AGRIMENSOR, SRL	Ferretería y pintura	62,995.47
UC-CD-2017-0011 Maquina para encuadernar para uso del Dpto. de Diseño.	OC-139-2017	05/05/2017	Compañía Comercial Caribe, SAS	Suministros de oficina	9,850.00
Uniformes para el equipo de softball de esta informática.	OC-179-2017	14/06/2017	FLORIANO, SRL	Textil, indumentaria, art.pers	36,875.00
Uniformes para los camareros de la Dirección General	OC-190-2017	27/06/2017	Suplidora Leopeña, SRL	Textil, indumentaria, art.pers	40,540.79
Visita técnica para el chequeo de la cámara de seguridad de esta inst.	OC-286-2017	25/09/2017	Security Development Corporation, S.S., SRL	Vigilancia y seguridad	14,750.00
Yoyo portacarnet para uso de esta institución	OC-31-2017	24/01/2017	MULTIGRABADO, SRL	Imprenta y publicaciones	97,350.00

**IV. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE  
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**ENERO-DICIEMBRE 2017**

### **3. Informe de la Oficina de Acceso a la Información**

La Oficina de Acceso a la información ha sido creada para dar cumplimiento a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de aplicación No. 130-05 , teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes de información que son planteadas por los ciudadanos a través de los diversos medios disponibles (comunicación, correo electrónico, formulario físico, electrónico y el Sistema Único de Acceso a la Información Pública) como una forma de validar la transparencia facilitando un servicio permanente actualizado de las ejecutorias llevadas a cabo.

Respuesta a las solicitudes de información durante el periodo enero – noviembre 2017


Durante este periodo, hemos recibimos un total de setenta y siete (77) solicitudes de información y 16 solicitudes a través del sistema del 311 siendo estas atendidas dentro de los plazos establecidos en la Ley 200-04 y el Decreto No. 694-09 de septiembre del 2009.

#### 4. Logros de la Oficina de Acceso a la Información

- Agilización de los procesos internos de las solicitudes de informaciones plateadas a la OAI, estableciendo los plazos oportunos a lo interno de la institución.
  
- Calificación 99 puntos, en el sub portal de transparencia.
  
- Implementación del Sistema Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), el cual entro en vigencia el 1 de noviembre del 2017, este sistema constituye una plataforma informática de libre acceso a la información que permite que cualquier usuario solicitar en tiempo real información pública de las Instituciones del Estado, cumpliendo cabalmente con el mandato de la Ley, al centralizar en un solo portal de internet todas las información pública que se realice, formando parte del proyecto gubernamental República Digital


**SOLICITUDES ATENDIDAS POR MODO DE RECEPCIÓN 2017**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
<b>FORMULARIOS</b>	3	4	1	0	5	1	2	0	0	1	0	<b>17</b>
<b>COMUNICACIÓN</b>	4	6	6	1	1	4	0	4	3	3	2	<b>34</b>
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	2	2	2	4	2	1	3	3	2	2	1	<b>24</b>
<b>SISTEMA ÚNICO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (SAIP)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	<b>2</b>
												<b>77</b>



**SOLICITUDES ATENDIDAS POR CONDICIÓN 2017**


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ABOGADOS	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	2	7
PERIODISTAS	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2	2	12
COMPAÑÍAS	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
INGENIERO	1	2	1	0	2	1	1	0	2	2	1	13
ESTUDIANTES	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7
OTROS	3	7	5	4	4	3	3	3	1	1	0	34
												77






**SOLICITUDES ATENDIDAS POR GÉNERO 2017**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
FEMENINO	5	1	1	2	1	4	0	1	2	2	1	20
MASCULINO	4	11	8	3	7	2	5	6	3	4	4	57
												<b>77</b>



**INFORME FINAL DE SOLICITUDES 2017**

	ENERO	FEBRERO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNI O	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTU BRE	NOVIEM BRE	TOTAL
RESPONDIDAS	9	12	9	5	7	6	5	7	4	6	5	75
PENDIENTES DE RETIRAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ENVIADAS A OTRA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
												77



## **C. PROYECTOS TERMINADOS E INAUGURADOS**

**Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita  
al Poder Ejecutivo**



**LISTADO DE PROYECTOS OISOE**

**OBRAS TERMINADAS E INAUGURADAS**

<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO CONTRATADO</b>
<b>PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO	RD\$ 91,026,658.03
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA	RD\$ 90,829,268.00
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND	RD\$ 81,151,460.99
<b>REGIÓN NORTE</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL DE JÁNICO	RD\$ 88,167,234.12
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO	RD\$ 91,272,670.45
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA	RD\$ 84,162,508.25
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO	RD\$ 88,142,259.62
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN IGNACIO DE SABANETA	RD\$ 91,937,428.13
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO	RD\$ 89,962,348.26

<b>VIALES</b>	
REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO JUNCALITO	RD\$ 571,919,182.91
<b>REGIÓN NORDESTE</b>	
<b>SALUD</b>	
HOSPITAL DE CASTILLO	RD\$ 124,075,299.43
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANA	RD\$ 91,329,505.34
<b>REGIÓN ESTE</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGUEY	RD\$ 81,741,653.57
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HATO MAYOR	RD\$ 92,407,921.44
<b>REGIÓN SUR</b>	
<b>SALUD</b>	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CARRIL DE HAINA	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA	RD\$ 91,329,505.34
HOSPITAL DE BARSEQUILLO	RD\$ 91,329,505.34

HOSPITAL DE LA DESCUBIERTA	RD\$ 91,329,505.34
HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO	RD\$ 91,329,505.34
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ	RD\$ 91,329,505.34
<b>TOTALES</b>	<b>RD\$ 2,671,420,451.94</b>

## **VII. PROYECCIONES HACIA EL AÑO 2018**

La OISOE está comprometida con la construcción de 5 nuevas estructuras hospitalarias, la reparación de 37 de las ya existentes y la remodelación de 12 importantes hospitales a nivel nacional.



Continuando con el fortalecimiento del sistema nacional de salud en todo el país, con lo cual se ha desarrollado un modelo más eficiente, completo y accesible a los ciudadanos, con la modernización de infraestructuras.

<b>PLAN OPERATIVO 2018</b>
RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BOCA CHICA
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CIUDAD SANITARIA, LUIS E. AYBAR
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAUX, MUNICIPIO SÁNCHEZ.
REPARACIÓN DEL HOSPITAL PADRE FANTINO, MONTECRISTI
REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS.
REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO ARTURO GRULLÓN
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE JÁNICO
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. JAIME MOTA, BARAHONA
REPARACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD DE POLO, BARAHONA



REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DR. JOSÉ PEREZ, INDEPENDENCIA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, BAHORUCO
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO E. MARCHENA, MONSEÑOR NOUEL
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DE RESTAURACIÓN, PROVINCIA DAJABÓN
REPARACIÓN HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL
REPARACIÓN MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ROSA DUARTE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA, PROVINCIA ELÍAS PIÑA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROVINCIA ELÍAS PIÑA
REPARACIÓN HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT
REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMA O AL NORTE, ESPAILLAT
REPARACIÓN DEL HOSPITAL LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DE. PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, LA VEGA
REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOURT HEDED, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ
REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LA ISABELA, PUERTO PLATA

REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA
REMODELACIÓN HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA
REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PUERTO PLATA
REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, MUNICIPIO LUPERÓN, PUERTO PLATA
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA
REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTÓBAL
REPARACIÓN DEL HOSPITAL BARSEQUILLO, HAINA, SAN CRISTÓBAL
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. SIGFREDO ALBA, FANTINO, SÁNCHEZ RAMÍREZ
REPARACIÓN DEL HOSPITAL VILLA LA MATA, SÁNCHEZ RAMÍREZ
REPARACIÓN DEL HOSPITAL INMACULADA CONCEPCIÓN, COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ.
REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL SANTIAGO RODRÍGUEZ
REPARACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DR. VINICIO CALVENTI, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REPARACIÓN HOSPITAL MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.
REPARACIÓN SUBCENTRO ENGOMBE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REPARACIÓN HOSPITAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REPARACIÓN DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, VALVERDE MAO
REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO
CONSTRUCCIÓN SUBCENTRO HOSPITALARIO DE MANZANILLO, PROVINCIA MONTE CRISTI
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL JUAN PABLO PINA

## VIII. ANEXOS

**VISITAS DE INSPECCIÓN- SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS – ACONTECIMIENTOS  
IMPORTANTES**

## VISITAS DE INSPECCIÓN



Visita al Hospital Ricardo Limardo, de Puerto Plata, viendo toques finales de su remodelación.



Supervisión trabajos remozamiento hospital municipal de Polo



Supervisión avance general de trabajos en la moderna Ciudad Sanitaria.




Supervisión trabajos finales reconstrucción hospital Moscoso Puello.



Supervisión avances construcción de carretera Los Montancitos-Los Fríos, en San Juan de la Maguana.



Supervisión Hospital Luis Morillo King, de La Vega, ya terminado y listo para inauguración.

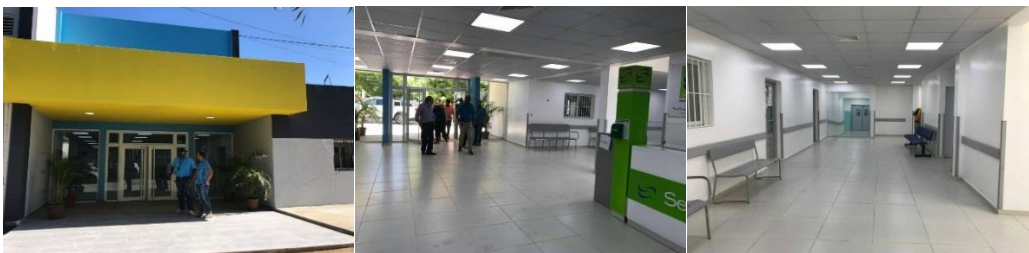

Supervisión de las instalaciones terminadas del Hospital Padre Fantino, de Monte Cristi.



Supervisión trabajos finales remodelación del Hospital General Dr. Luis L. Bogaert, de Mao, para su inauguración.



Supervisión hospital de El Mamey, Los Hidalgos, Puerto Plata, a punto de concluir su intervención.




El Ing. Francisco Pagán comparte con médicos residentes Maternidad La Altigracia detalles sobre ritmo trabajos remodelación de ese centro.



Supervisión de la ejecución de trabajos en Hospital Moscoso Puello.



Supervisión trabajos construcción puente sobre río Arroyo Lebrón, de Los Alcarizos.

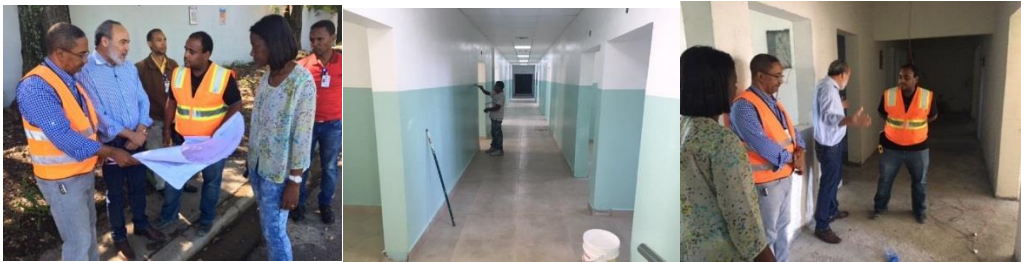

Supervisión avance de reconstrucción Hospital Rosa Duarte, Elías Piña.



Supervisión construcción del Hospital de Hondo Valle, de la provincia Elías Piña.





Supervisión ejecución proyecto Ciudad Sanitaria, de acuerdo al programa de terminación



Supervisión avance ejecución trabajos reconstrucción Hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal.



Supervisión Hospital Dra. Evangelina Rodríguez, en San Rafael del Yuma



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



Supervisión del hospital Luis E Aybar

## ACONTECIMIENTOS



Curso básico para comisiones de ética pública, encabezado por el Lic. Lidio Cadet



Caminata por la transparencia y la ética pública.



Equipo Regional Norte de la OISOE en operativo limpieza, en el río Yaque del Norte.

**IMÁGENES DE LOS PROYECTOS INAUGURADOS  
2017**

# **PROYECTOS VIALES**

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA, SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA



CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTÓBAL, PERAVIA, SAN JOSÉ DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ.



REHABILITACIÓN CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN-LA DESCUBIERTA (DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTA SANDY), PROV. BAHORUCO





REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN CARRETERA JÁNICO JUNCALITO





RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL BARRIO JUAN BOSCH, LA HERRADURA

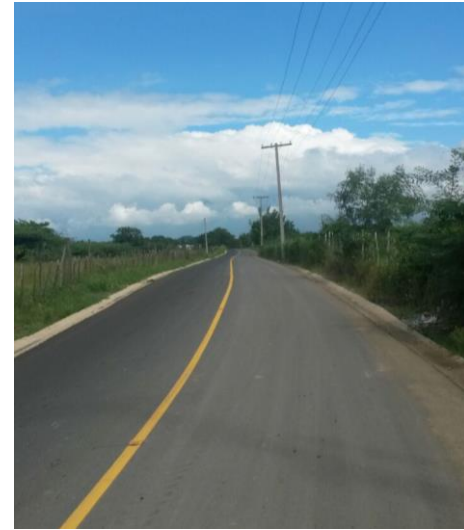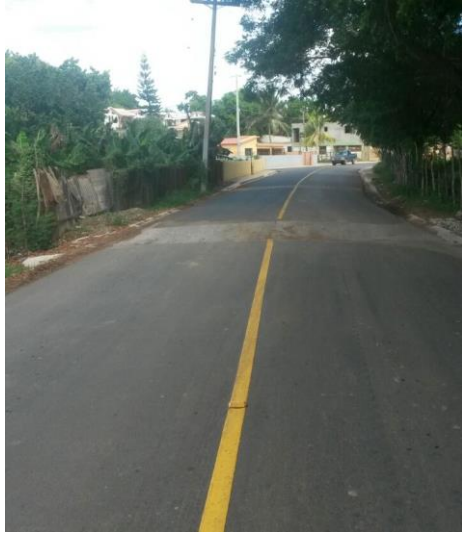

CAMINO VECINALES EN AMACEYES Y CARLOS DÍAZ (GUAYABILLO, CRUCE DE JOSÉ GARCÍA)





REHABILITACIÓN CARRETERA EN BAITOA, VARIANTE BOCA DE CACHÓN-LA DESCUBIERTA (DAÑOS OCASIONADOS POR TORMENTA SANDY), PROV. BAHORUCO



RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN VÍCTOR-AMACEYES



RECONSTRUCCIÓN CARRETERA AMACEYES-CARLOS DÍAZ

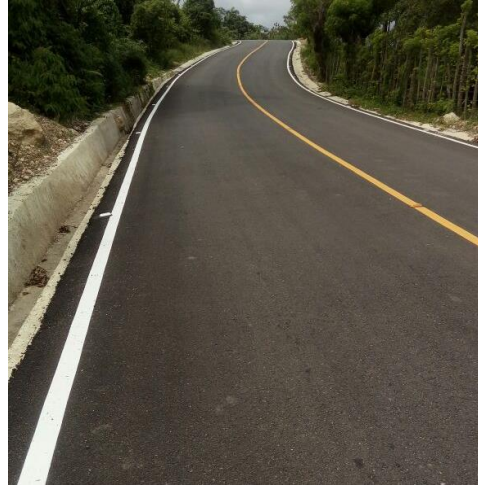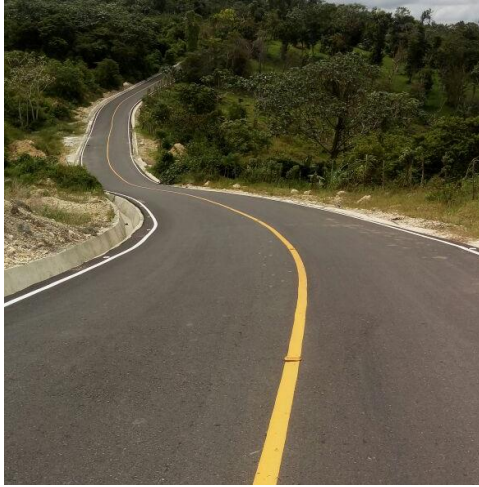

CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VUELTA AL LAGO (BARAHONA-CABRAL-DUVERGÉ-JIMANÍ-LA DESCUBIERTA-PORTER RIO-VILLA JARAGUA, NEYBA, HASTA CRUCE DEL ABANICO)



# **PROYECTOS DE ACCIÓN COMUNITARIA**

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE, CASETA Y CÁNCAMO DE BOMBEO PARA ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DEL MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA, R.D



# **PROYECTOS DE TERMINACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS**

TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.



RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, D.N.



IMPERMEABILIZACIÓN TECHO RESIDENCIA PARROQUIAL, TECHO DE ESCALERA Y CÚPULA DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA EN LA ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL



IMPERMEABILIZACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ARCHIVO DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, D.N.



# **PROYECTOS DE SALUD**



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GURABO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN ISIDRO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CORALES DE LA CAÑA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE



HOSPITAL MUNICIPAL DE JÁNICO











HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ, PROV. SANTIAGO

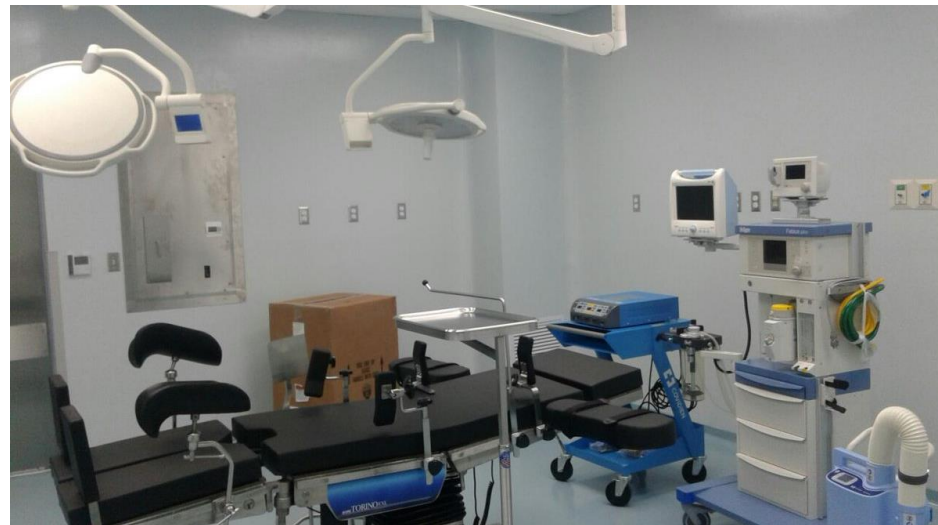

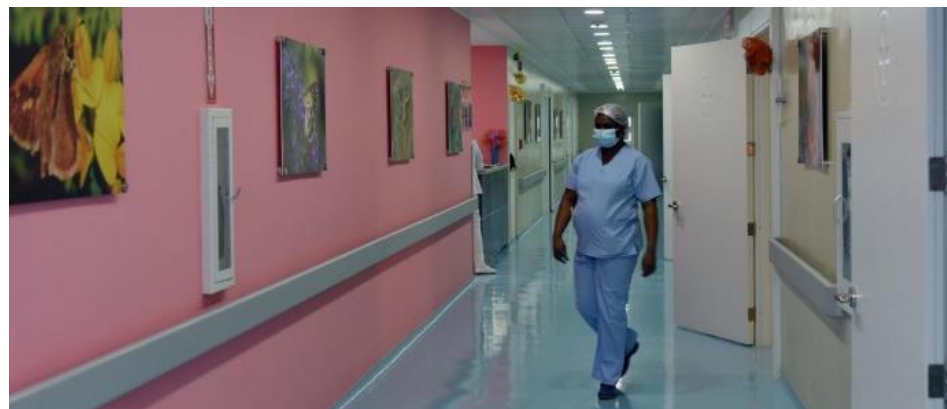



HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA LIBERACIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA GUERRA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PEDRO BRAND



HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA





HOSPITAL MUNICIPAL DEL ALMIRANTE






HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS



LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRÓN) EN EL INSTITUTO ONCOLÓGICO ROSA EMILIA TAVÁREZ, DISTRITO NACIONAL, R.D.

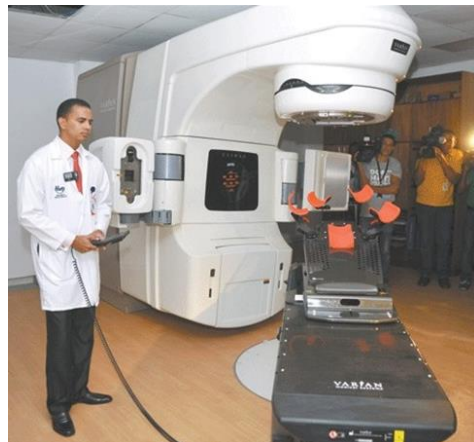




CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA ENRIQUILLO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ

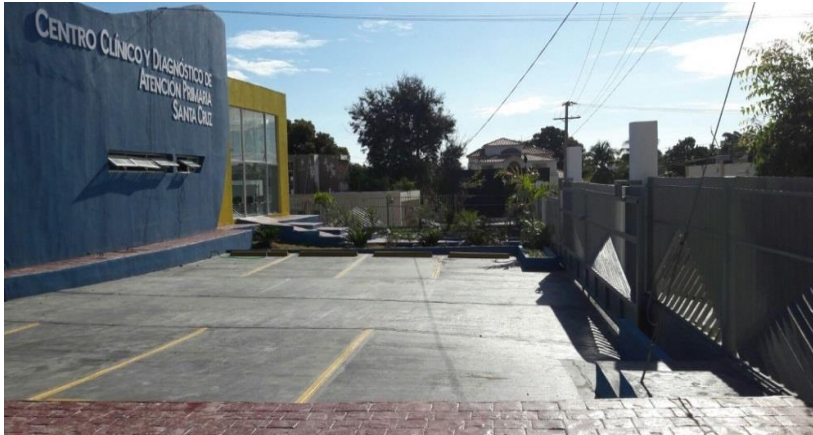

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NEIBA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FERNANDO




HOSPITAL MUNICIPAL DE MANZANILLO





HOSPITAL PROVINCIAL PADRE FANTINO

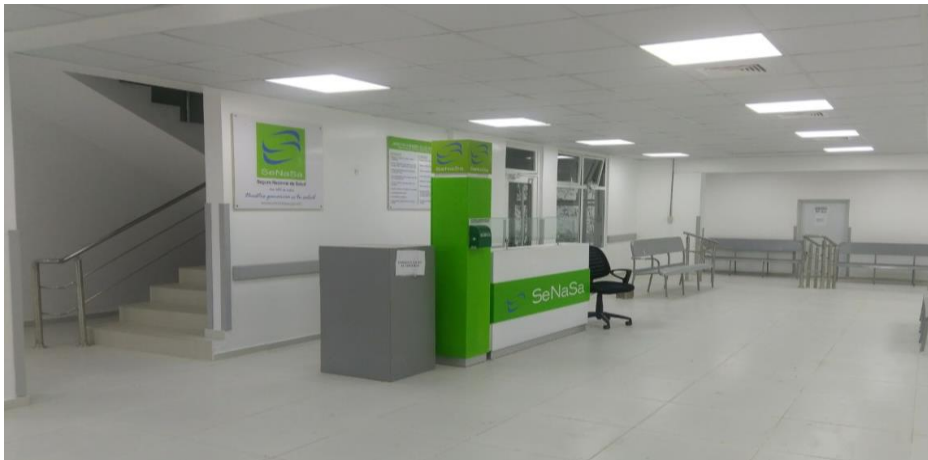

TERMINACIÓN VÍAS DE ACCESO Y ÁREAS EXTERIORES HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MADRE VIEJA





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA VILLA FUNDACIÓN





HOSPITAL MUNICIPAL DE BARSEQUILLO







HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. LUIS MANUEL MORILLO KING





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA FANTINO



HOSPITAL MUNICIPAL SIGIFREDO ANTONIO ALBA DOMÍNGUEZ, FANTINO, SÁNCHEZ RAMÍREZ



HOSPITAL MUNICIPAL LA DESCUBIERTA





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS



HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLO, PROV. DUARTE







CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA AZUA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LAS MATAS DE FARFÁN



HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO





HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DR. ALEJANDRO CABRAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MOCA









CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SAMANÁ





HOSPITAL DR. ALBERTO GAUTREUX, SÁNCHEZ





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HATO MAYOR





.CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA HIGÜEY





HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DE YUMA





HOSPITAL PROVINCIAL DR. RICARDO LIMARDO





HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS, LOS HIDALGOS



HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT, VALVERDE



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTIAGO RODRÍGUEZ





HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, ELÍAS PIÑA





# **PROYECTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES**





**BÁSICA CENTRO PARA LA NIÑEZ, VALVERDE, REGIÓN NORTE.**  
(RD \$62,357,986.54)



Manos a la Obra





BÁSICA ZONA SUR 4, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, REGIÓN NORDESTE.  
(RD \$65,033,796.04)



Manos a la Obra





BÁSICA CAÑO BLANCO, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, REGIÓN NORDESTE.  
(RD \$39,349,087.90)



Manos a la Obra





BÁSICA MATANCITAS, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, REGIÓN NORDESTE.  
(RD \$47,306,459.71)



Manos a la Obra





ESCUELA BÁSICA ZONA NORTE 1, HATO MAYOR, REGIÓN ESTE.  
(RD \$36,349,067.75)



Manos a la Obra





ESCUELA BÁSICA LAS CAÑITAS, HATO MAYOR , REGIÓN ESTE.  
(RD \$42,586,711.79)



Manos a la Obra





ESCUELA BÁSICA MONTE PLATA, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE.  
(RD \$36,349,067.75)



Manos a la Obra





LICEO MONTE PLATA, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE.  
(RD \$49,901,214.03)



Manos a la Obra







BÁSICA JOSÉ VÁSQUEZ JIMÉNEZ, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE.  
(RD \$ 24,292,585.52)



Manos a la Obra





LICEO JOSÉ REYES, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE.  
(RD\$ 51,208,351.56)



Manos a la Obra





BÁSICA GREGORIO AYBAR CONTRERAS - LOS GUINEOS, MONTE PLATA,  
REGIÓN ESTE. (RD\$ 39,139,731.29)



Manos a la Obra





BÁSICA JUANA AMINTA SORIANO - SIERRA DE AGUA, MONTE PLATA, REGIÓN ESTE.  
(RD\$ 39,230,601.37)



Manos a la Obra





LICEO GUAYACANES, SAN PEDRO DE MACORIS, REGIÓN ESTE.  
(RD\$ 36,349,067.75)



Manos a la Obra





BÁSICA ZONA EL ARTÍSTICO, LA ROMANA, REGIÓN ESTE.  
(RD \$70,144,556.46)



Manos a la Obra





ESTANCIA INFANTIL PIEDRA LINDA - VILLA HERMOSA, LA ROMANA, REGIÓN ESTE.  
(RD \$32,825,944.49)



Manos a la Obra






BÁSICA MARTHA, SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO.  
(RD\$ 68,226,293.87)



Manos a la Obra

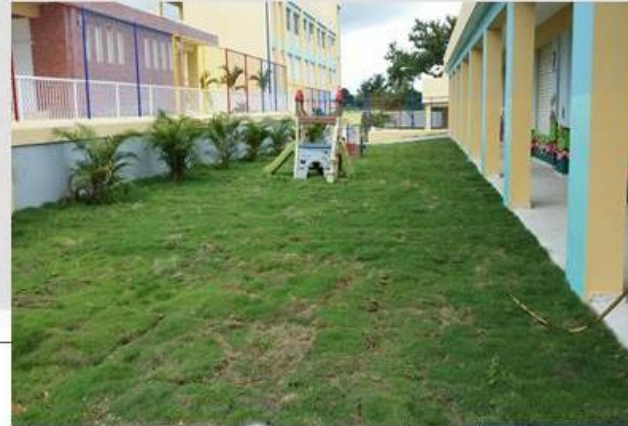





LICEO LAS MERCEDES, SANTO DOMINGO OESTE, SANTO DOMINGO.  
(RD\$ 46,959,388.14)



Manos a la Obra





BÁSICA FORMERIO RODRÍGUEZ, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO.  
(RD\$ 23,053,346.93)



Manos a la Obra





BÁSICA AMALIA, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO.  
(RD\$ 68,104,298.52)



Manos a la Obra





BÁSICA EL ALMIRANTE (REP. DE NICARAGUA), SANTO DOMINGO ESTE,  
SANTO DOMINGO. (RD\$ 68,278,203.25)



Manos a la Obra





BÁSICA ARUBA (LOS ALIFONSOS), SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO.  
(RD\$ 17,108,230.22)



Manos a la Obra





*Presidencia de la República Dominicana*

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)  
ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

**MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017**
