

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras						abril 20
							17	20	23	26	29	01
1		<b>MODULO B-1</b>	<b>16 días</b>	<b>vie 24/05/19</b>	<b>mar 11/06/19</b>							
2		PINTURA EN GENERAL	10 días	vie 24/05/19	mar 04/06/19							
3		MASILLADO DE JUNTAS	3 días	mié 29/05/19	vie 31/05/19	2CC+4 días						
4		BRILLADO DE PISOS	5 días	mié 05/06/19	lun 10/06/19	2						
5		MURAL ALEGORICO AL PLANTEL	4 días	vie 31/05/19	mar 04/06/19	2CC+6 días						
6		PINTURA MANTENIMIENTO EN BARANDAS EN GENERAL	2 días	sáb 01/06/19	lun 03/06/19	7CC						
7		PINTURA MANTENIMIENTO EN PROTECTORES EN HIERRO	3 días	sáb 01/06/19	mar 04/06/19	2CC+7 días						
8		LIMPIEZA FINAL	1 día	mar 11/06/19	mar 11/06/19	4						
9		<b>MODULO B-2</b>	<b>15 días?</b>	<b>vie 24/05/19</b>	<b>lun 10/06/19</b>							
10		PINTURA EN GENERAL	10 días?	vie 24/05/19	mar 04/06/19	2CC						
11		MASILLADO DE JUNTAS (NORMA R-001)	3 días	lun 27/05/19	mié 29/05/19	10CC+2 días						
12		BRILLADO DE PISOS	4 días	mié 05/06/19	sáb 08/06/19	10						
13		MURAL ALEGORICO AL PLANTEL	4 días	mié 29/05/19	sáb 01/06/19	10CC+4 días						
14		PINTURA MANTENIMIENTO EN PROTECTORES EN HIERRO	3 días	vie 24/05/19	lun 27/05/19	10CC						
15		PINTURA MANTENIMIENTO EN BARANDAS EN GENERAL	2 días	vie 24/05/19	sáb 25/05/19	14CC						
16		LIMPIEZA FINAL	1 día	lun 10/06/19	lun 10/06/19	12						
17		<b>MODULO B-3</b>	<b>15 días</b>	<b>vie 24/05/19</b>	<b>lun 10/06/19</b>							
18		PINTURA EN GENERAL	10 días	vie 24/05/19	mar 04/06/19	2CC						
19		MASILLADO DE JUNTAS (NORMA R-001)	3 días	lun 27/05/19	mié 29/05/19	18CC+2 días						

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras						abril 20
							17	20	23	26	29	01
20		BRILLADO DE PISOS	4 días	mié 05/06/19	sáb 08/06/19	18						
21		MURAL ALEGORICO AL PLANTEL	4 días	mié 29/05/19	sáb 01/06/19	18CC+4 días						
22		PINTURA MANTENIMIENTO EN BARANDAS EN GENERAL	3 días	vie 24/05/19	lun 27/05/19	18CC						
23		PINTURA MANTENIMIENTO EN PROTECTORES EN HIERRO	2 días	vie 24/05/19	sáb 25/05/19	22CC						
24		LIMPIEZA FINAL	1 día	lun 10/06/19	lun 10/06/19	20						
25		<b>COMEDOR TIPO III</b>	<b>67,94 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>jue 06/06/19</b>							
26		ABERTURA DE HUECOS PARA EXTRADORES DE HUMO SEGUN PLANOS ACTUALIZADOS	3 días	mié 20/03/19	sáb 23/03/19							
27		ABERTURA PARA DISPENSADORES DE PLATOS SEGUN PLANOS ACTUALIZADOS	3 días	mié 20/03/19	sáb 23/03/19	26CC						
28		CORREGIR ALUZINC CON PROBLEMAS EN EL AISLANTE TERMICO (DESPEGADO)	1 día	mié 20/03/19	jue 21/03/19							
29		CORREGIR CAÑO Y COLOCAR BAJANTES	2 días	mié 20/03/19	vie 22/03/19	28CC						
30		PINTURA EN GENERAL	4 días	sáb 01/06/19	mié 05/06/19	10CC+7 días						
31		BRILLADO DE PISOS	1 día	jue 06/06/19	jue 06/06/19	30						
32		PINTURA MANTENIMIENTO EN PUERTAS EN HIERRO	1 día	sáb 01/06/19	sáb 01/06/19	30CC						
33		<b>BAÑO EXTERIOR</b>	<b>2 días</b>	<b>sáb 01/06/19</b>	<b>lun 03/06/19</b>							
34		PINTURA EN GENERAL	2 días	sáb 01/06/19	lun 03/06/19	30CC						
35		PINTURA MANTENIMIENTO EN PROTECTORES EN HIERRO	1 día	sáb 01/06/19	sáb 01/06/19	34CC						
36		<b>CANCHA MIXTA</b>	<b>6 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>mié 27/03/19</b>							

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
Fecha: mié 10/07/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Fecha					
							17	20	23	26	29	abril 2001
37		CONSTRUCCION DE CAJUELAS PARA POSTE DE VOLEYBALL	1 día	mié 20/03/19	jue 21/03/19							
38		PINTURA BASE PRIMER	1 día	jue 21/03/19	vie 22/03/19	37						
39		PINTURA Y SEÑALIZACION EN CANCHA	3 días	vie 22/03/19	mar 26/03/19	38						
40		INSTALACION POSTES Y MALLA VOLEYBALL	1 día	mar 26/03/19	mié 27/03/19	39						
41		PINTURA EN COLUMNAS EN GENERAL	1 día	mar 26/03/19	mié 27/03/19	39						
42		<b>GRADAS DE CANCHA</b>	<b>3 días</b>	<b>jue 21/03/19</b>	<b>lun 25/03/19</b>							
43		PINTURA EN GENERAL	3 días	jue 21/03/19	lun 25/03/19	38CC						
44		<b>CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA</b>	<b>2 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>vie 22/03/19</b>							
45		PINTURA EN GENERAL	2 días	mié 20/03/19	vie 22/03/19							
46		<b>AREAS EXTERIORES EN GENERAL</b>	<b>57,94 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>sáb 25/05/19</b>							
47		JARDINERIA EN GENERAL	12 días	mié 20/03/19	mié 03/04/19							
48		TERMINACION INTERCONEXION ELECTRICA CON EDENORTE	2 días	vie 24/05/19	sáb 25/05/19							
49		PINTURA EN JARDINERAS EN GENERAL	2 días	mié 20/03/19	vie 22/03/19							
50		<b>MISCELANEOS</b>	<b>68,94 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>vie 07/06/19</b>							
51		ROTULOS Y SEÑALIZACIONES EN SINTRA Y BRONCE EN GENERAL	2 días	jue 06/06/19	vie 07/06/19	2;10;18;30						
52		COLOCACION PLACA EN BRONCE	1 día	mié 20/03/19	jue 21/03/19							
53		<b>VERJA PERIMETRAL</b>	<b>60,94 días</b>	<b>mié 20/03/19</b>	<b>mié 29/05/19</b>							
54		RELLENO EN TALUD TIERRA NEGRA	3 días	mié 20/03/19	sáb 23/03/19							
55		PINTURA EN GENERAL	4 días	vie 24/05/19	mar 28/05/19							
56		COLOCACION ALAMBRE TRINCHERA	3 días	lun 27/05/19	mié 29/05/19	55CC+2 días						

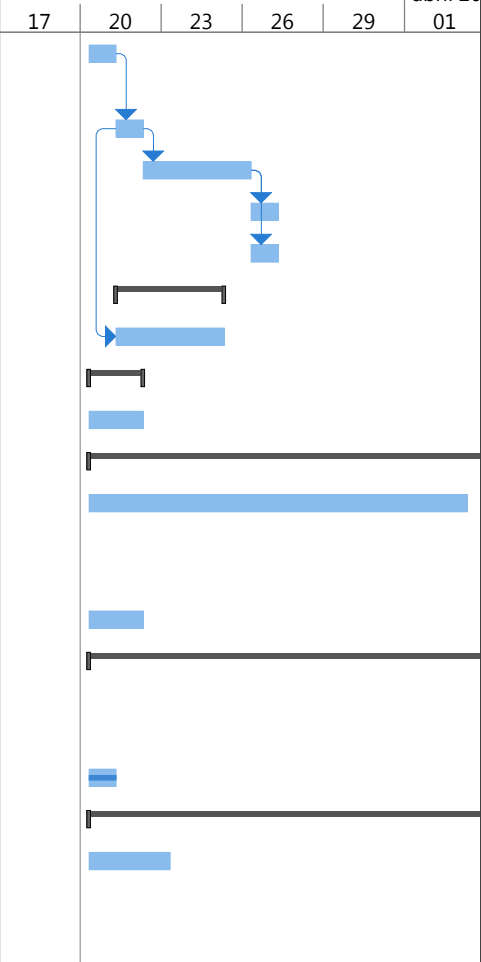


Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

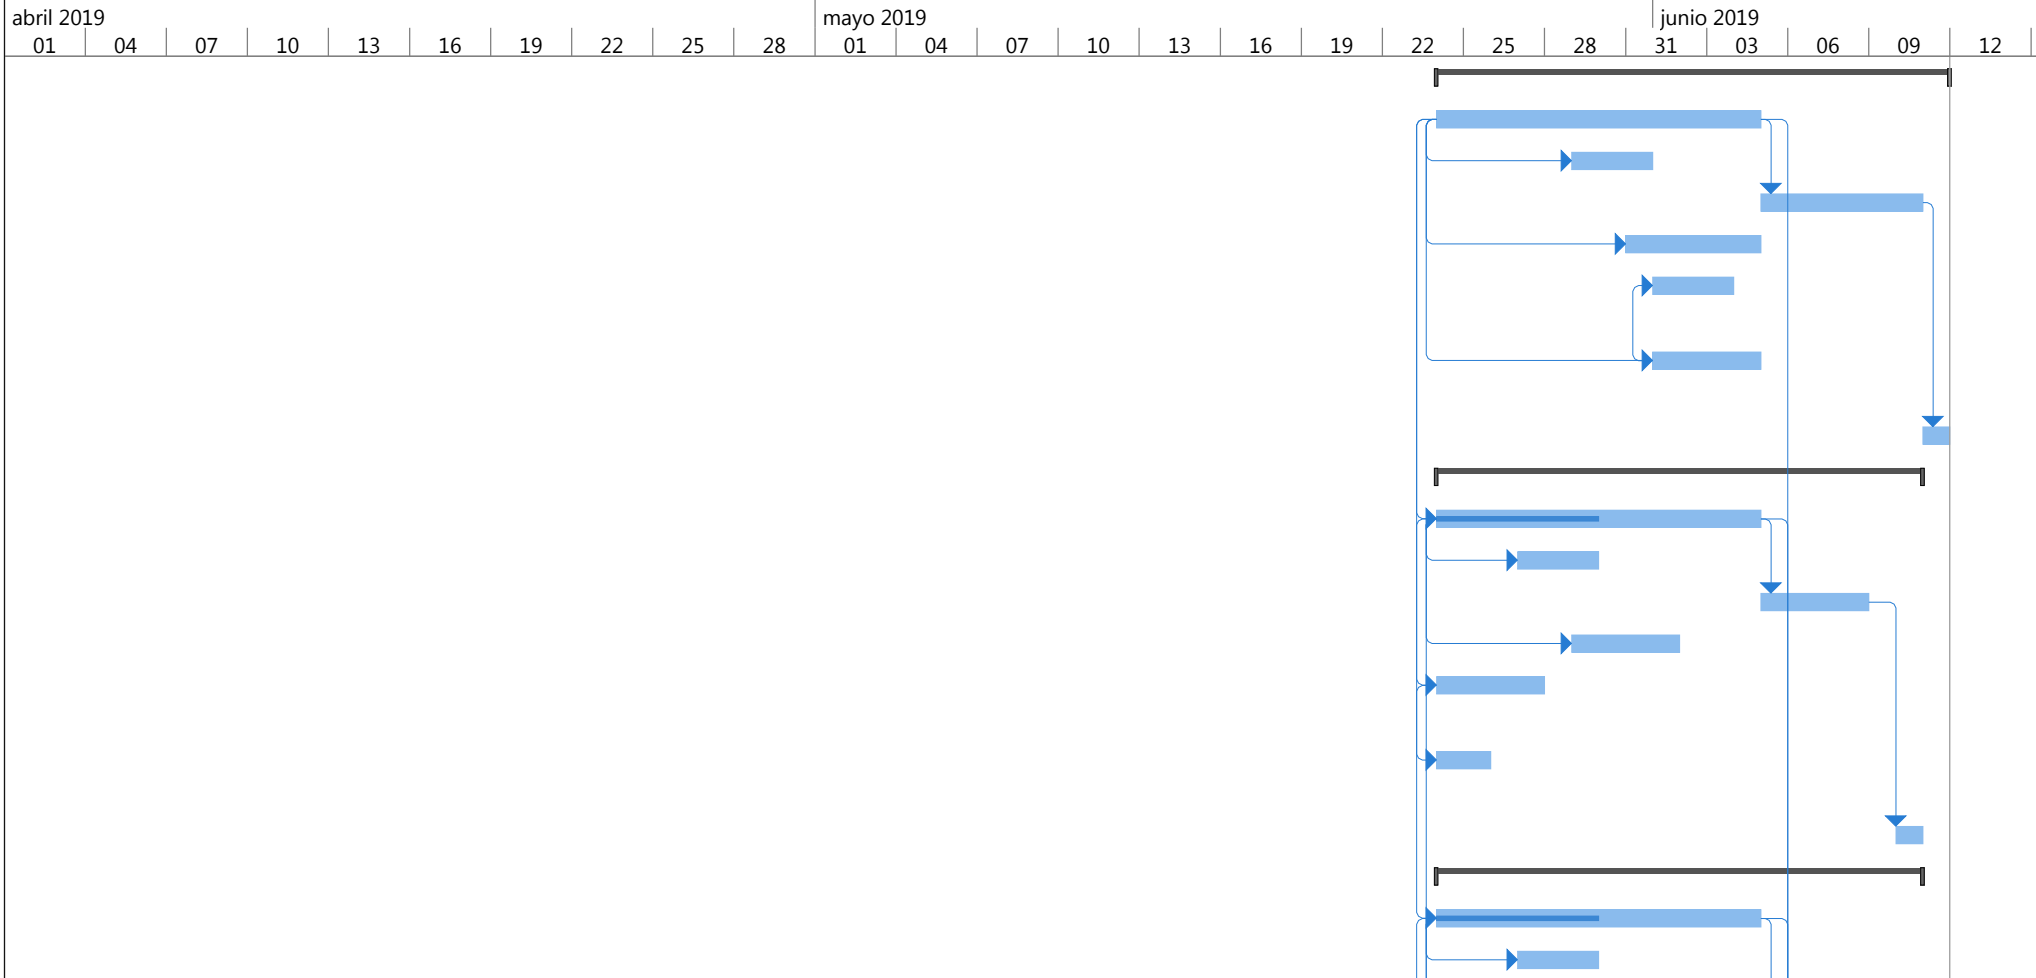


Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

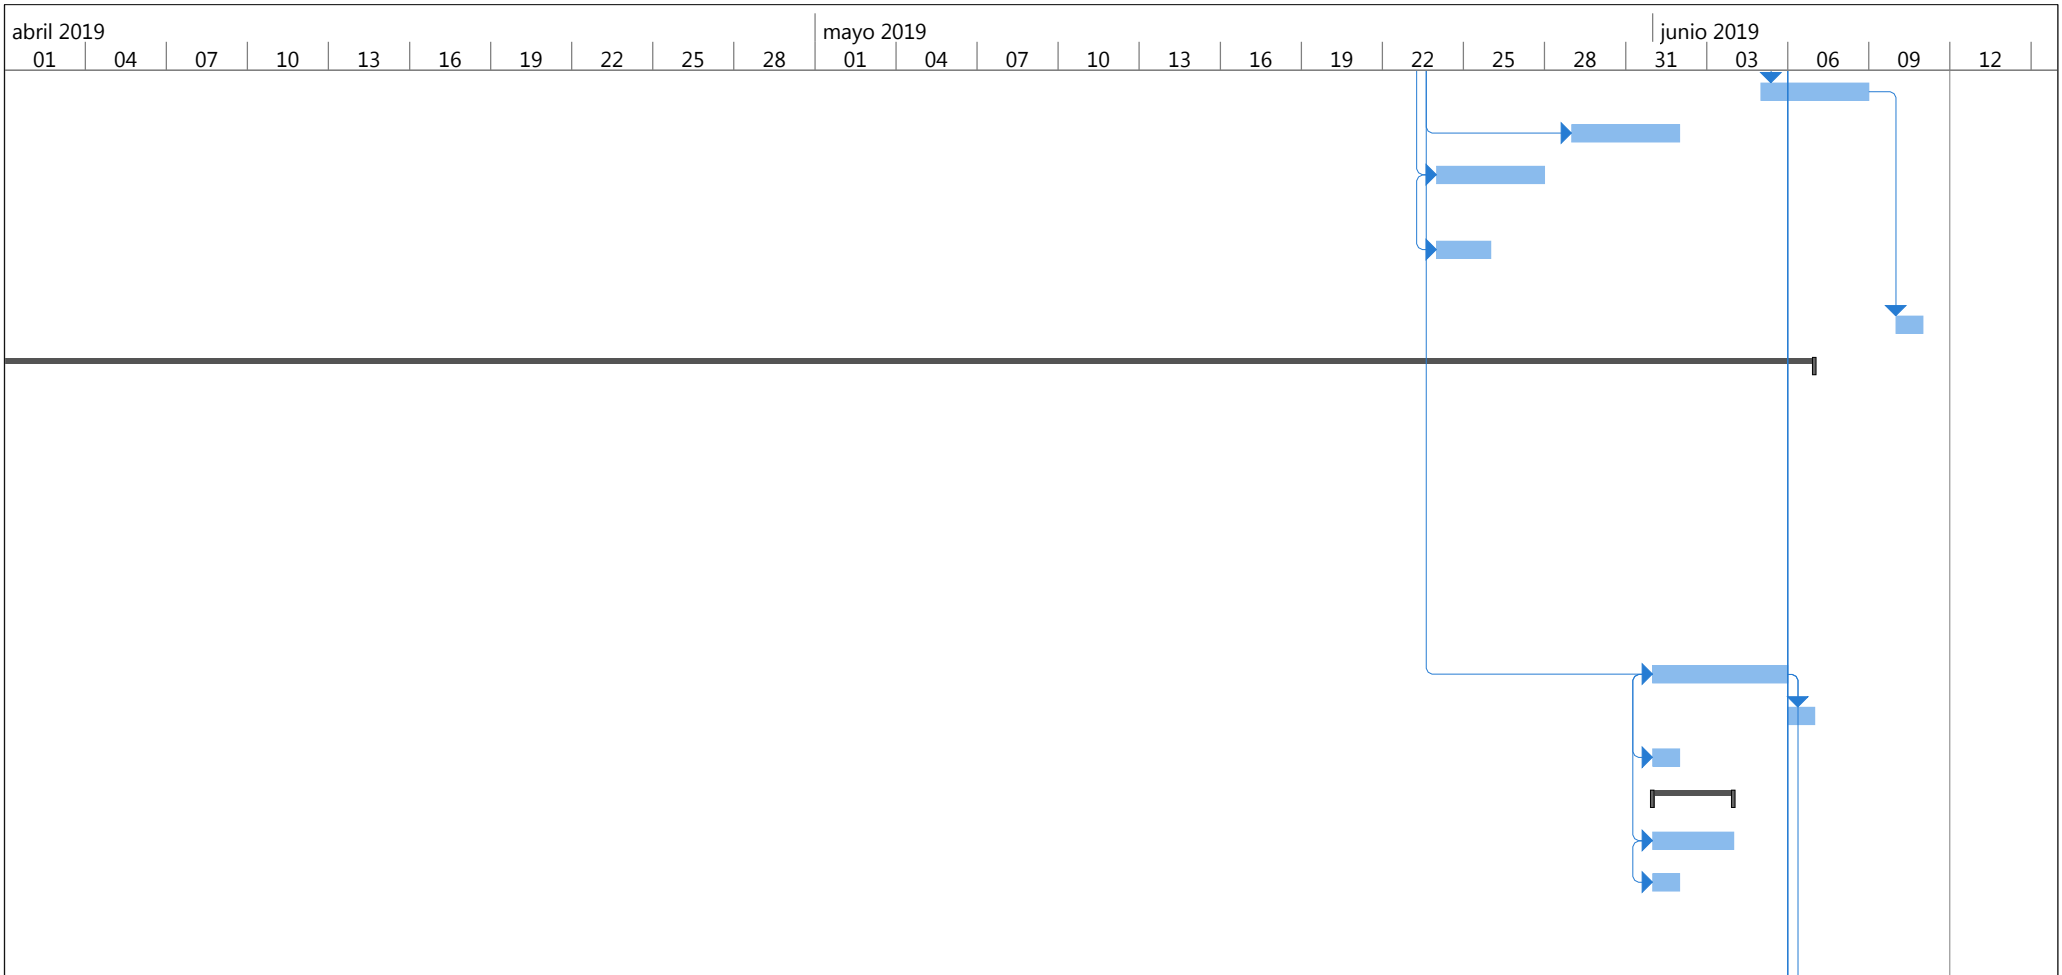

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

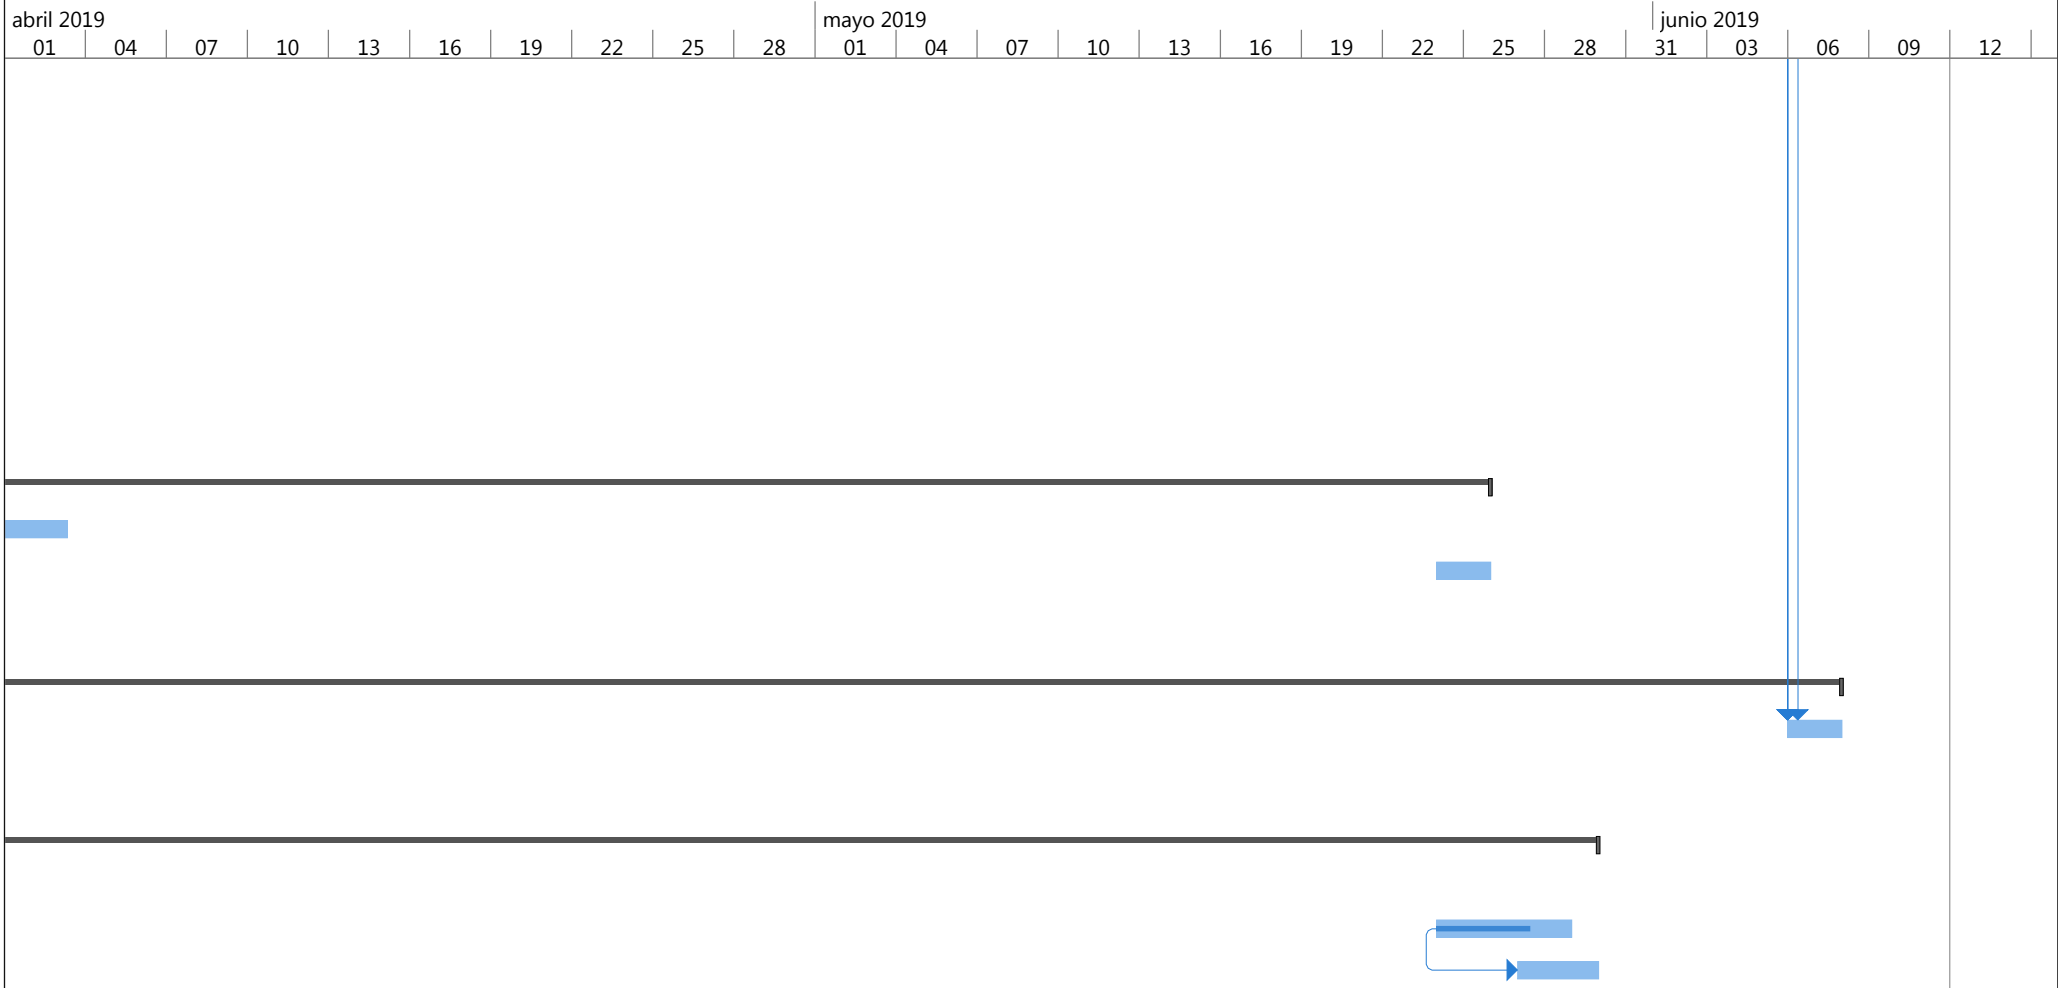

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19




















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


julio 2019

agosto 2019

15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

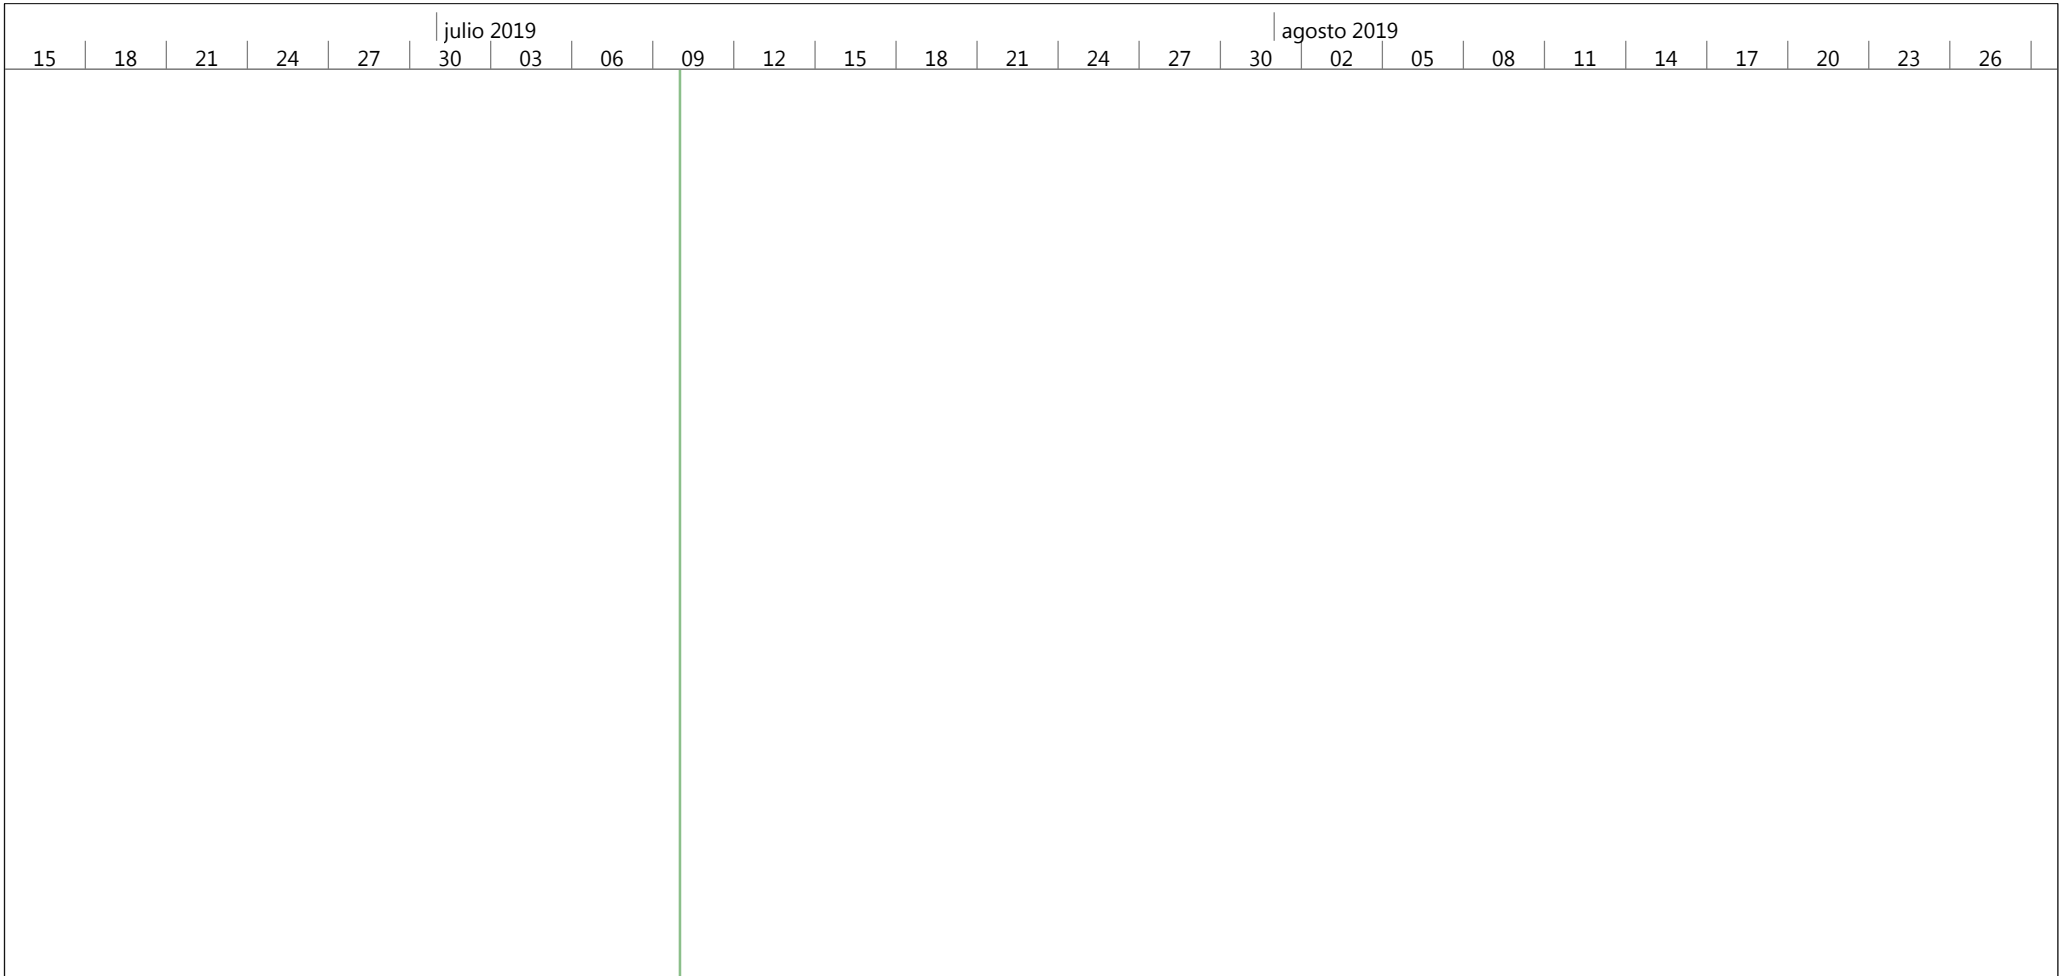

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
 Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





















julio 2019

agosto 2019

15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26

Proyecto: CALENDARIO DE TRA  
Fecha: mié 10/07/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	
