

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '19							01 sep '19							
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X					
0		ESCUELA LA BASICA HIGUERA	85.17 días	mié 28/08/19	sáb 16/11/19															
1																				
2		COMEDOR	85.17 días	mié 28/08/19	sáb 16/11/19															
3		TERMINACION DE SUPERFICES	55.17 días	mié 28/08/19	vie 18/10/19															
4		Pañete en Muros Exterior	14 días	jue 26/09/19	mié 09/10/19															
5		Pañete en Muros Interior	14 días	jue 12/09/19	mié 25/09/19															
6		Pañete en (Losa , Vigas y Cols.)	10.67 días	mar 03/09/19	jue 12/09/19															
7		Fraguache en Losa, vigas y cvolumnas	5.83 días	mié 28/08/19	lun 02/09/19															
8		Cantos en General	10.67 días	mié 09/10/19	vie 18/10/19															
9																				
10		TERMINACION DE PISOS	30 días	sáb 19/10/19	sáb 16/11/19															
11		Techo metalico	30 días	sáb 19/10/19	sáb 16/11/19															
12																				
13		TERMINACION DE TECHO	22 días	mar 03/09/19	lun 23/09/19															
14		Fino en Techo Plano	4 días	lun 09/09/19	mié 11/09/19															
15		Zabaleta En Techo	7 días	jue 12/09/19	mié 18/09/19															
16		Impermeabilizante polyglasLona(e=3 mm)	5 días	mié 18/09/19	lun 23/09/19															
17		Bajante pluvial de 3"	3 días	jue 12/09/19	sáb 14/09/19															
18		Antepecho incl. Bloques, pañete, pintura, cantos. con H=0.40mts.	6 días	mar 03/09/19	sáb 07/09/19															

Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '19							01 sep '19				
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
19																	
20		BLOQUE B2	85 días	mié 28/08/19	sáb 16/11/19												
21		PRIMER NIVEL	85 días	mié 28/08/19	sáb 16/11/19												
22		TERMINACION DE PISOS	85 días	mié 28/08/19	sáb 16/11/19												
23		H.A.B/Piso (chap.) e=0.08 (W2.3*150*150)	10 días	mié 28/08/19	vie 06/09/19												
24		Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	17.5 días	jue 24/10/19	lun 11/11/19												
25		Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	6.67 días	lun 11/11/19	sáb 16/11/19												
26		SEGUNDO NIVEL	24.17 días	mié 02/10/19	jue 24/10/19												
27		TERMINACION DE PISOS	24.17 días	mié 02/10/19	jue 24/10/19												
28		Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	17.5 días	mié 02/10/19	vie 18/10/19												
29		Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0	6.67 días	vie 18/10/19	jue 24/10/19												
30		TERCER NIVEL NIVEL	26.67 días	vie 06/09/19	mié 02/10/19												
31		TERMINACION DE PISOS	26.67 días	vie 06/09/19	mié 02/10/19												
32		Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	20 días	vie 06/09/19	mié 25/09/19												
33		Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0	6.67 días	mié 25/09/19	mié 02/10/19												
34		CANCHA	4.67 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19												
35		TERMINACION DE PISOS	4.67 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19												

Proyecto: ESCUELA LA BASICA
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '19							01 sep '19						
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				
36		De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10) m con horm. Industrial 180k/cm2.	4.67 días	sáb 19/10/19	mié 23/10/19														
37																			
38		ENTRADA GENERAL :	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
39		Acometida de entrada e interconexión con	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
40		compañía eléctrica.(Estructura de interconexión).	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
41		Soporte para cut-out y pararrayo.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
42		Pararrayo de 9 Kv.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
43		Cut Out de 200 amperes con lamina de 7.0 amp.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
44		Condulet de 2"φ	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
45		Tuberias imc de 2"φ.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
46		Barra channel unistrau de 11/2" x 10 pies	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
47		abrazadera unistrau de 2'φ	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
48		Transformador de 37.5 Kva. Tipo poste. 12470/7200-120/240V.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
49		Base de contador con breaker de 200 amperes-240V- 5 clips-Nema 3R.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														
50		Panelboard General (PGP) en barras de 200 amperios-60Hz-	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19														

Proyecto: ESCUELA LA BASICA
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '19							01 sep '19							
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X					
51		120/240V -1F- Nema 1R.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
52		compuesto por:	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
53		1- MB 200/2	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
54		1-80/2+5 de 40/2+1 de 50/2	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
55		1- disponibilidad hasta 50/2	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
56		Alimentador desde el transformador (TX) hasta base de contador.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
57		compuesto por:	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
58		2C thw No. 4/0 fases.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
59		1C thw No. 2/0 neutro	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
60		1C thw No. 2 tierra.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
61		1T- pvc sdr- 26- 2"ø.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
62		Alimentador desde base de contador hasta panelboard general.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
63		compuesto por:	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
64		2C thw No. 4/0 fases.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
65		1C thw No. 2/0 neutro	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
66		1C thw No. 2 tierra.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
67		1T- pvc sdr- 26- 2"ø.	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															
68		Sistema de tierra.(Inc. red de aterrizaje y conexión en malla electrosoldada).	20 días	mié 28/08/19	lun 16/09/19															


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ago '19							01 sep '19				
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
69																	
70		Relleno exterior	6 días	lun 11/11/19	vie 15/11/19												
71		Relleno compactado	6 días	lun 11/11/19	vie 15/11/19												


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

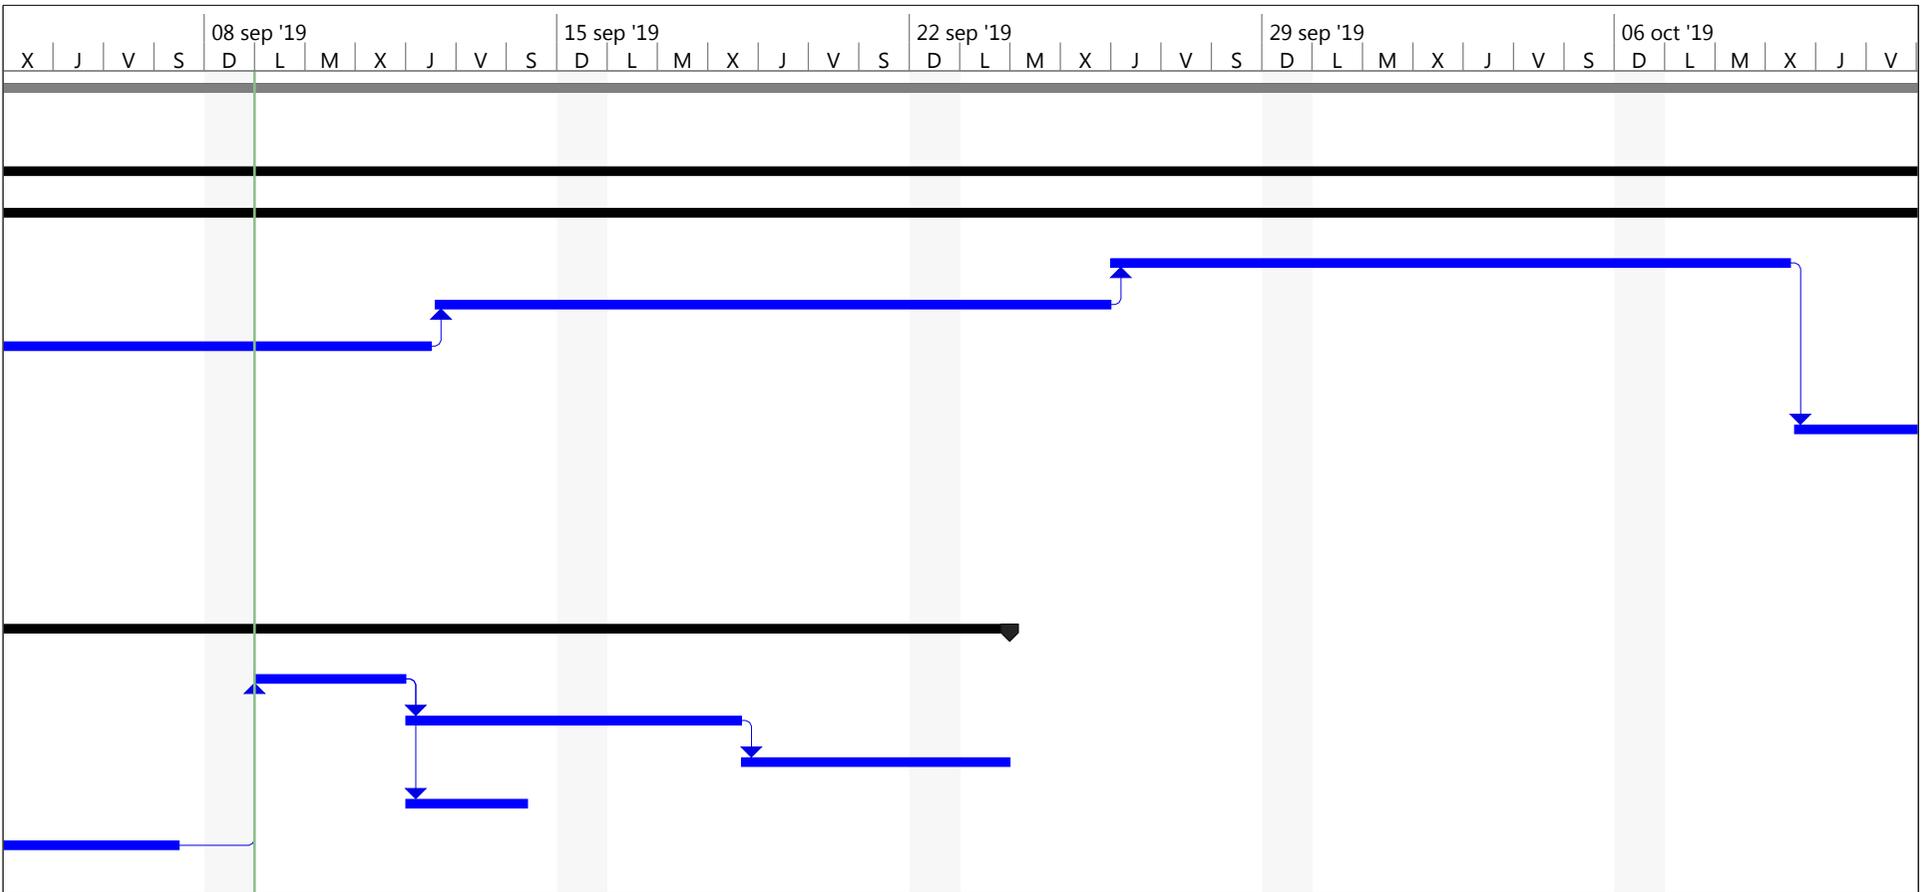


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

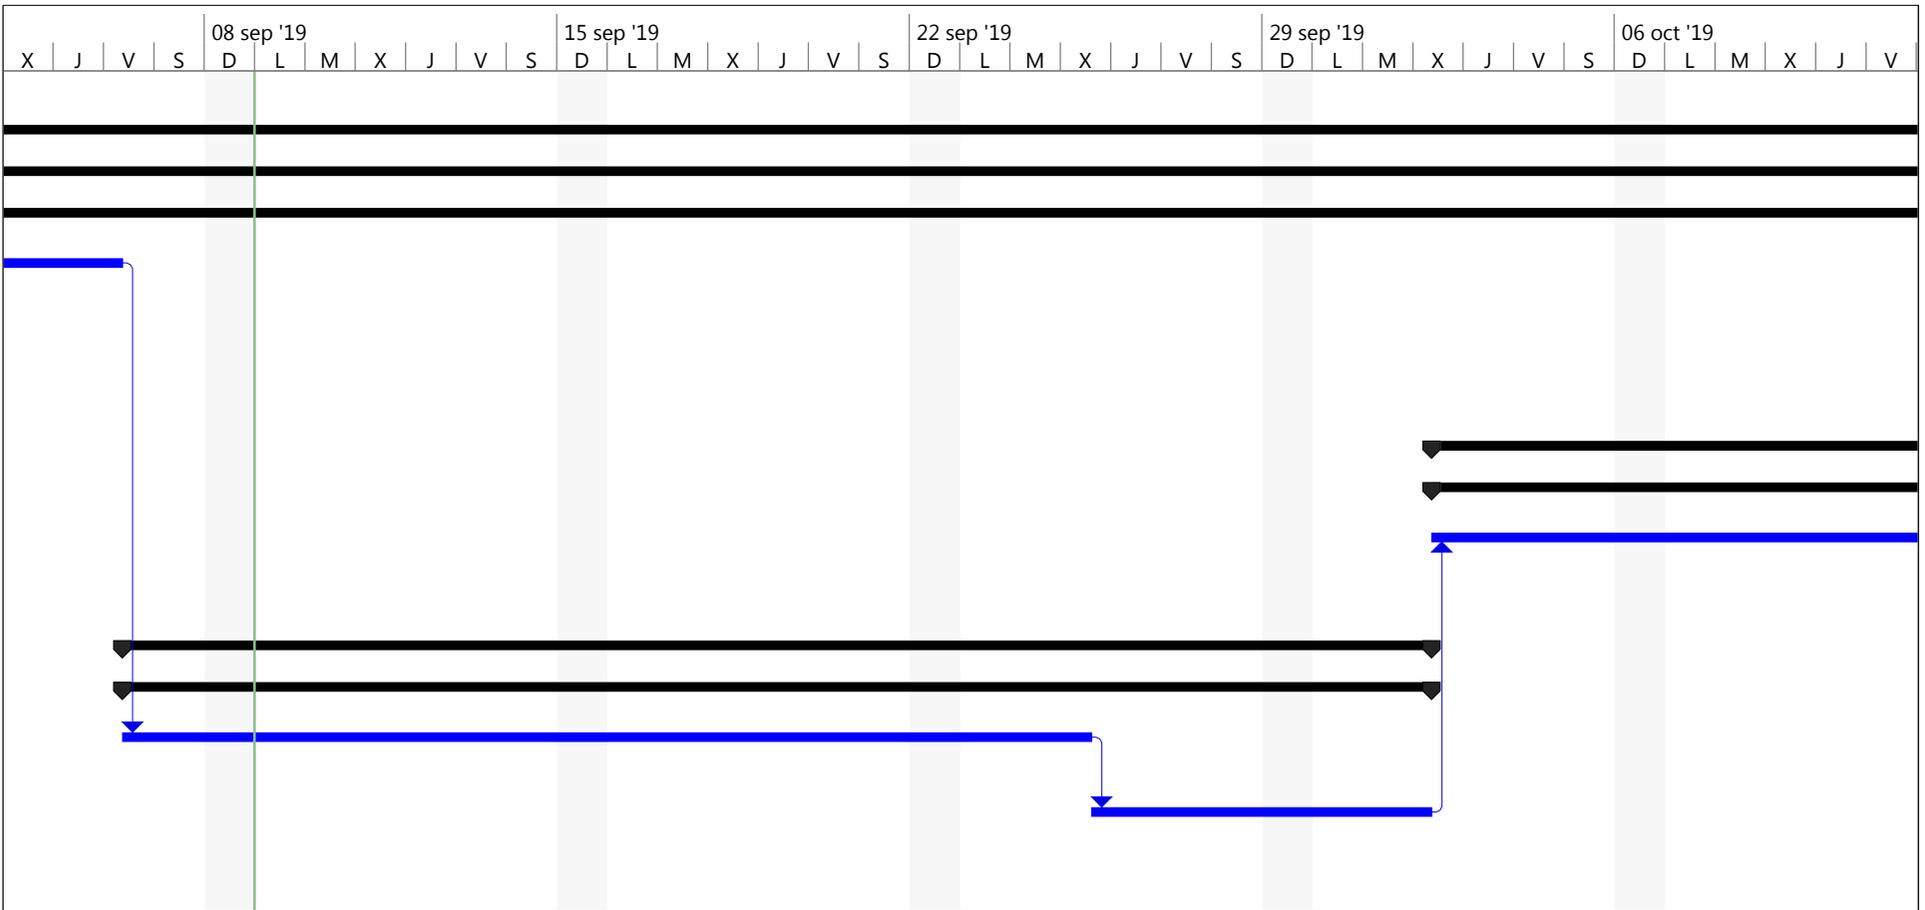


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

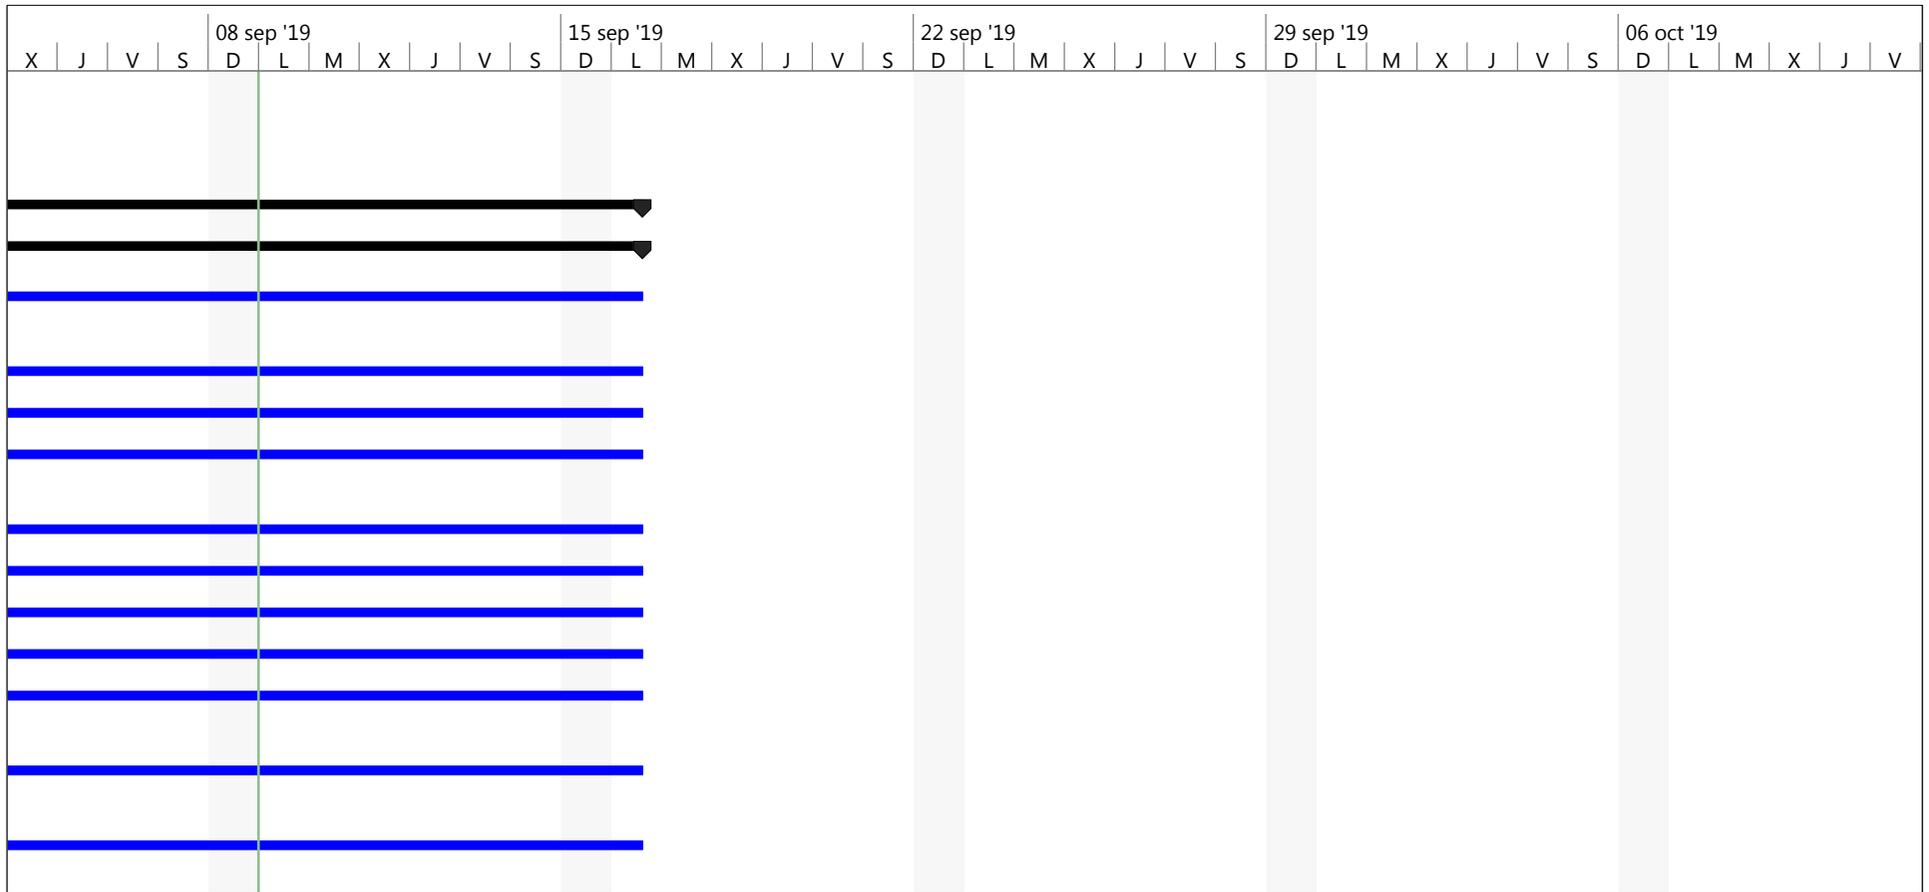

Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

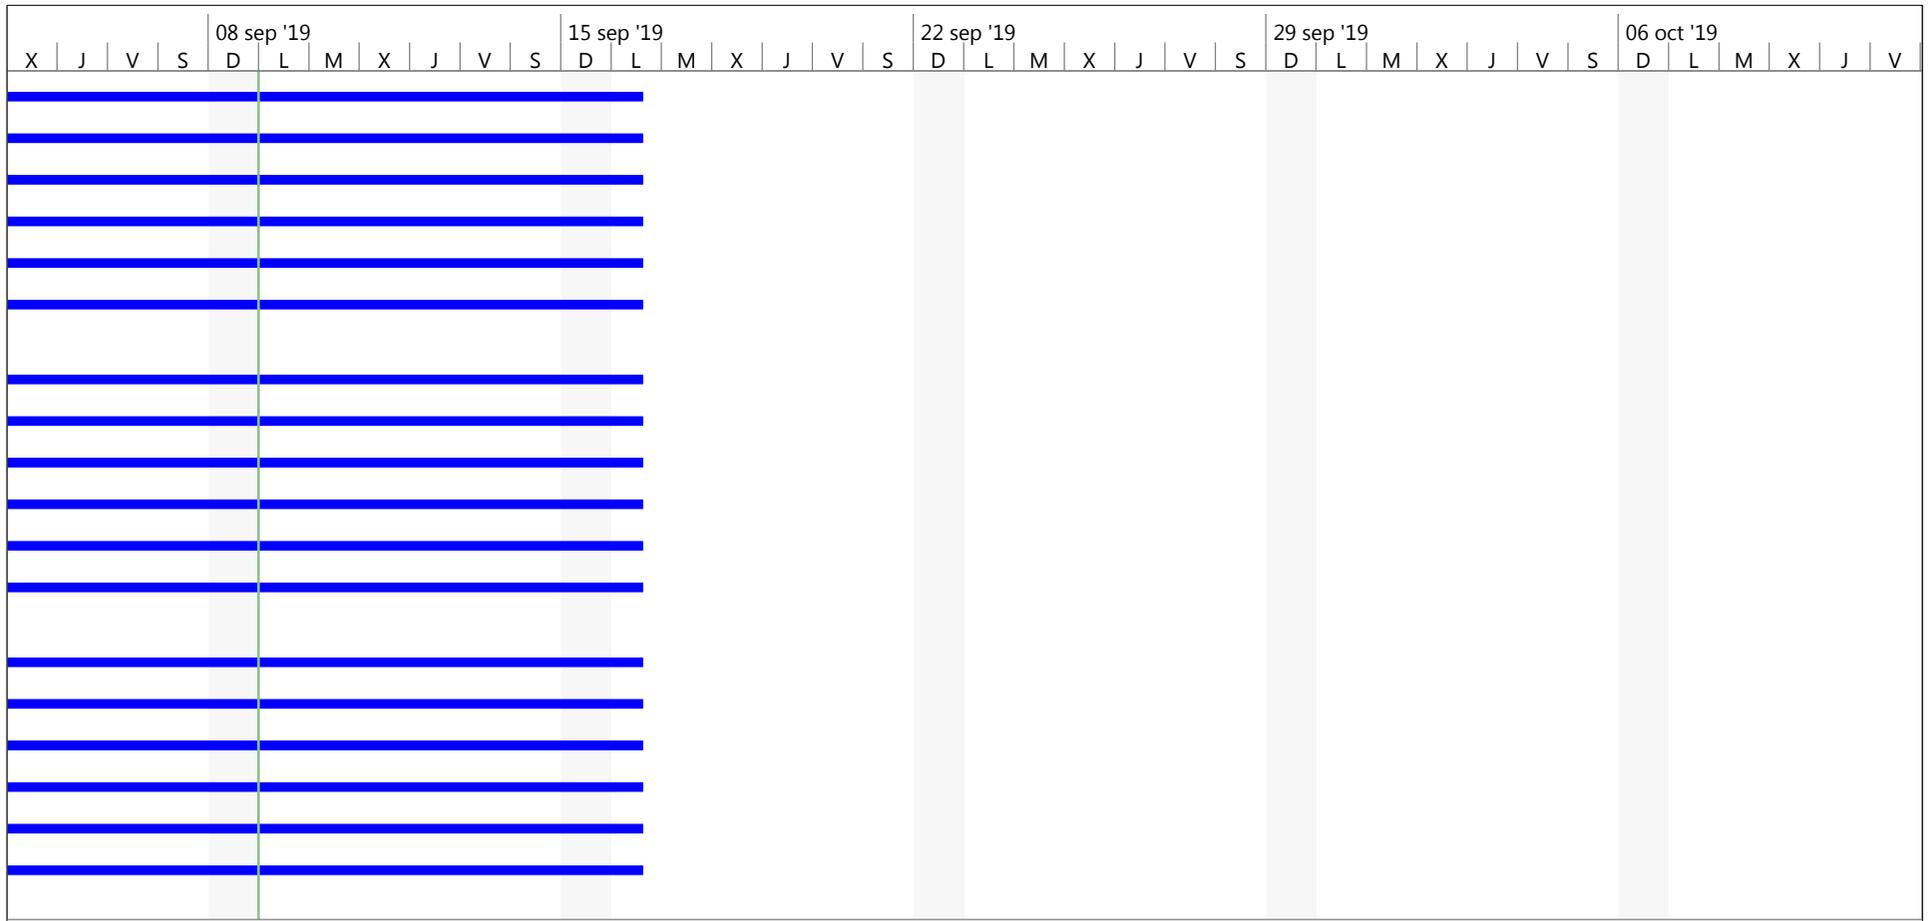


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

X	J	V	S	08 sep '19				15 sep '19				22 sep '19				29 sep '19				06 oct '19										
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V




Proyecto: ESCUELA LA BASICA Fecha: lun 09/09/19	Tarea		Línea base resumida		solo duración	
	División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
	Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
	Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
	Resumen		Tareas externas		solo fin	
	Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
	Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
	Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
	Hito resumido		Resumen inactivo			
	Resumen de línea base		Tarea manual			

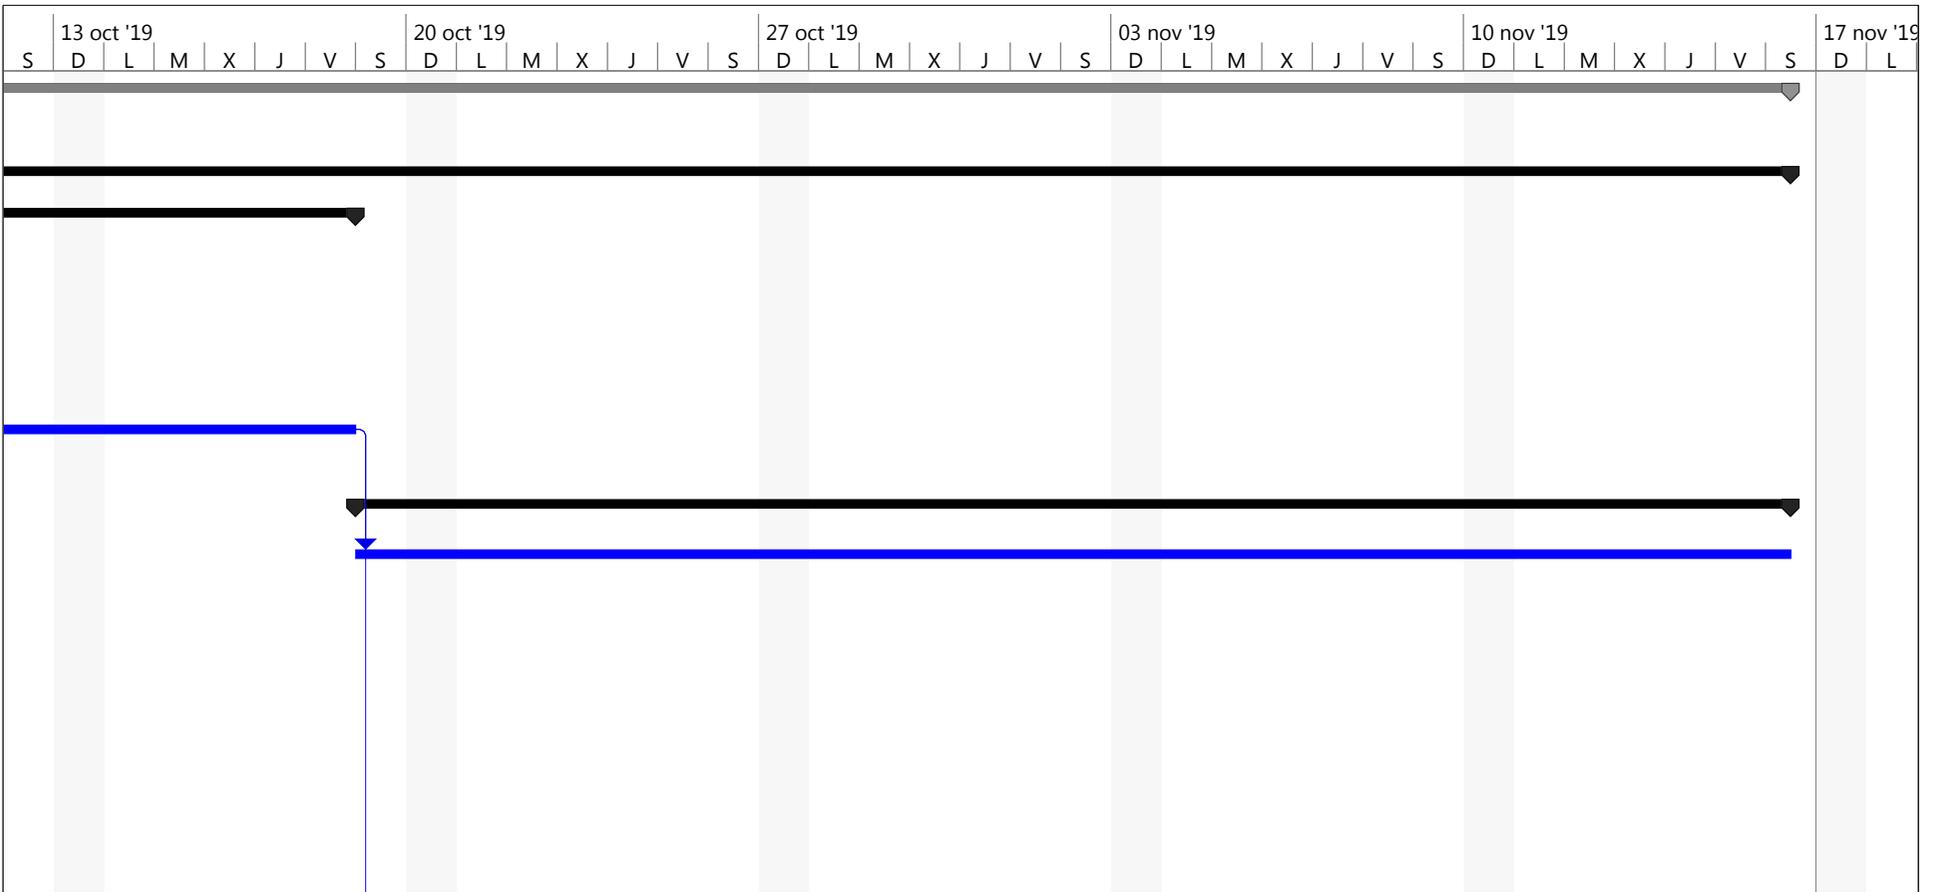


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

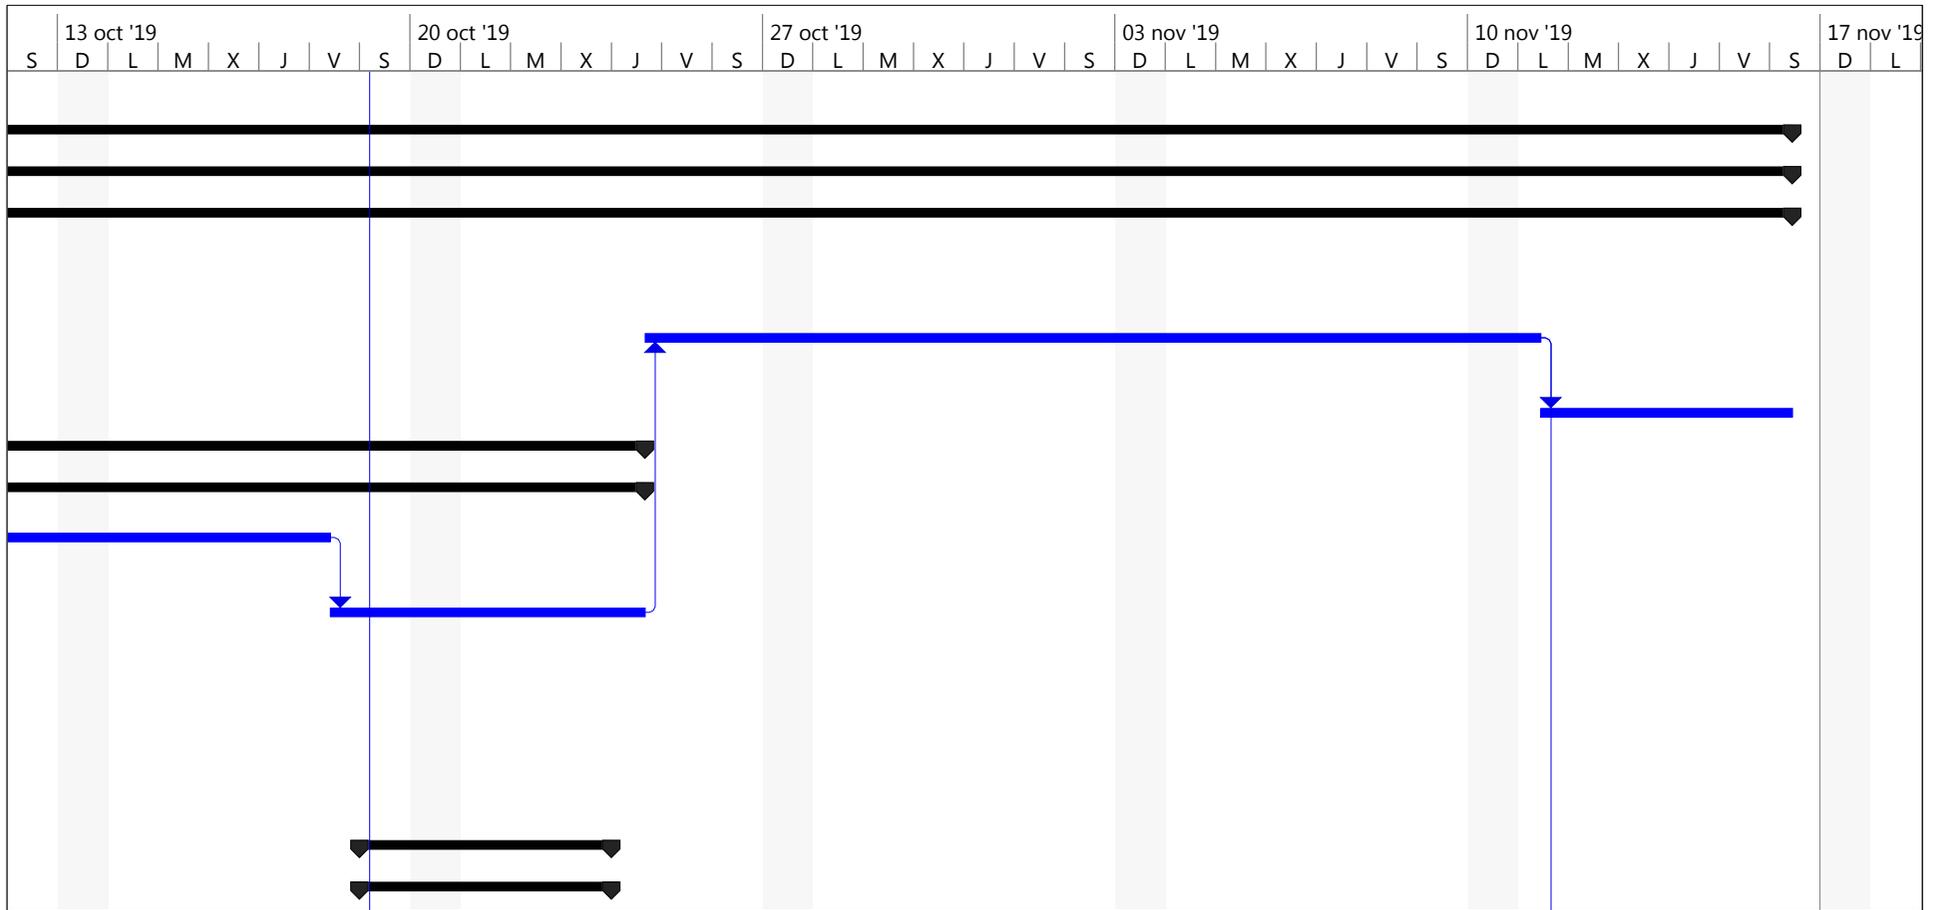

Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			

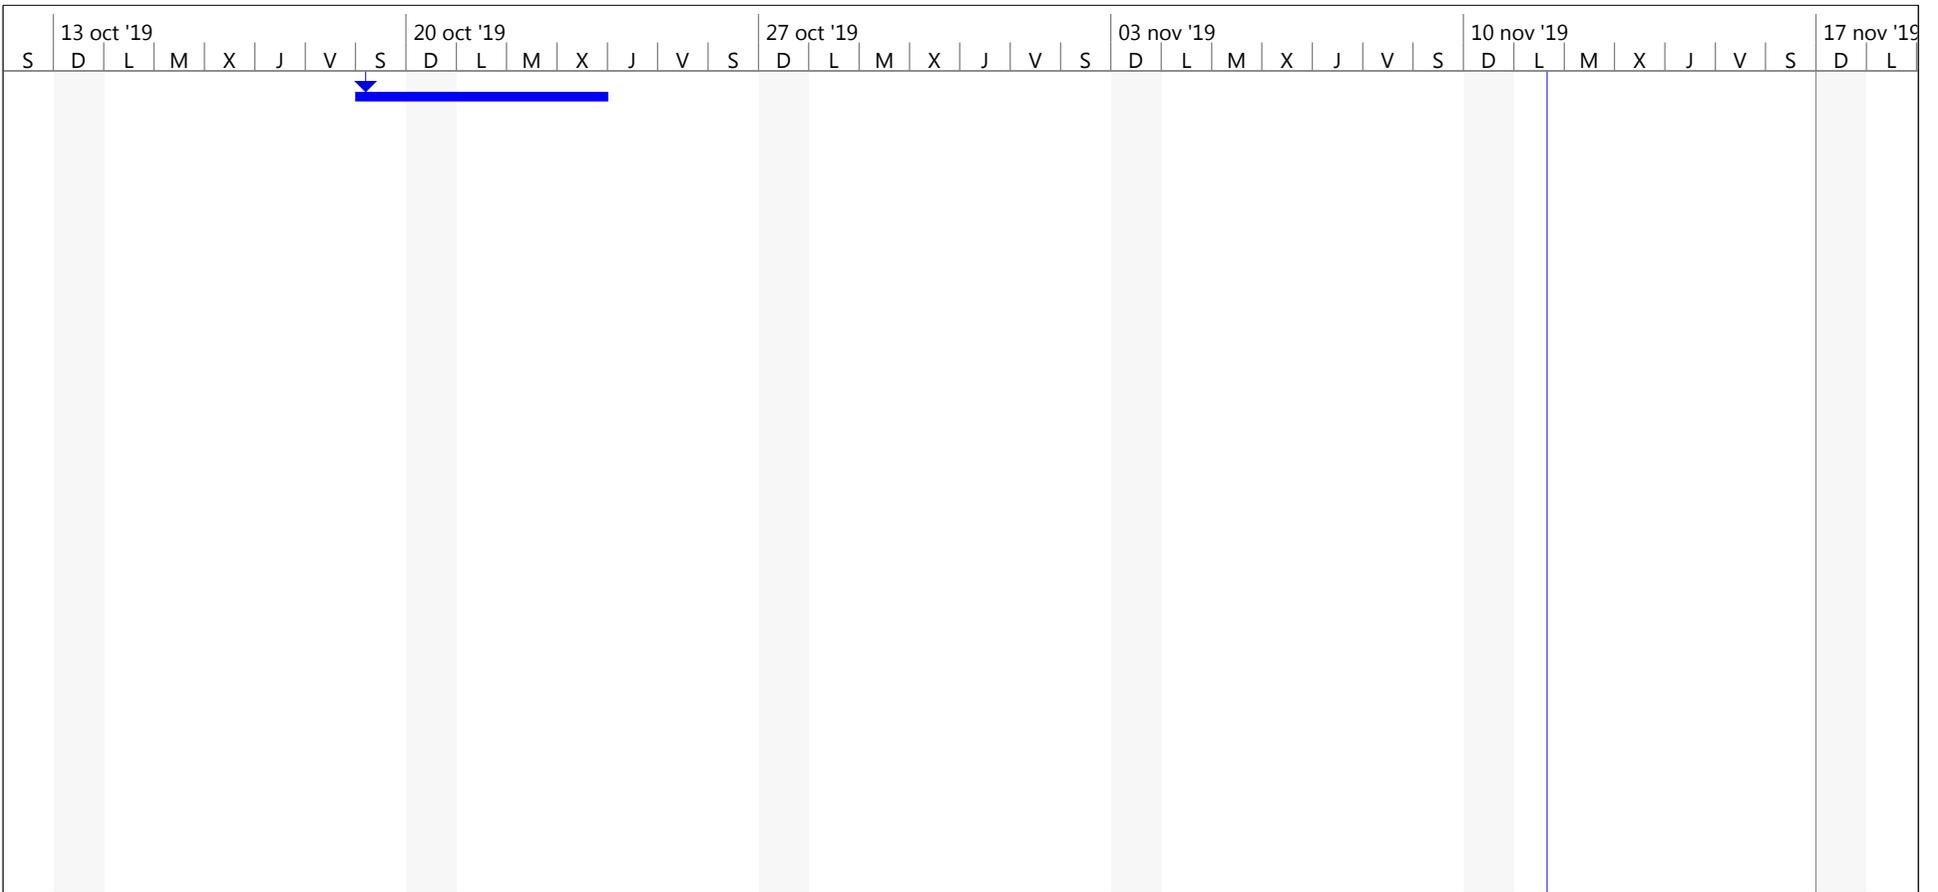


Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			



Proyecto: ESCUELA LA BASICA
Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			



Proyecto: ESCUELA LA BASICA
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Línea base resumida		solo duración	
División		Hito de línea base resumida		Informe de resumen manual	
Hito		Progreso resumido		Resumen manual	
Hito de línea base		División de la línea base		solo el comienzo	
Resumen		Tareas externas		solo fin	
Resumen del proyecto		Hito externo		Fecha límite	
Agrupar por síntesis		Tarea inactiva		Línea base	
Tarea resumida		Hito inactivo		Progreso	
Hito resumido		Resumen inactivo			
Resumen de línea base		Tarea manual			
